


কর্ম পরিকল্পনা (প্রকল্প এলাকা বরিশাল)



SHEIKH KAMAL IT TRAINING AND INCUBATION CENTER PROJECT Bangladesh Hi-Tech Park Authority Works Program as Bar Chart (Barishal)



Main Building :

S.L	Item of work	July,21				August,21				September, 21				October, 21				November, 21				December,21			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Partition brick wall plaster	█	█	█	█																				
2	Sanitary work	█	█	█		█	█	█	█	█	█														
3	Tiles work	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█												
4	Door shutter work													█	█	█	█								
5	L.C.C work	█	█	█	█																				
6	Granite work	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█												
7	Counter top work	█	█	█	█	█	█	█	█																
8	Marble work																					█	█	█	█
9	Paint work	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█												
10	Glass work	█	█	█	█	█	█	█	█	█															
11	ACP work			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█												
12	False ceiling work																					█	█	█	█
13	Dom work																					█	█	█	█
14	Wooden texture Tiles																					█	█	█	█
15	Electric work	█	█	█	█	█	█	█	█																
16	Fire system work	█	█	█	█	█	█	█	█																
17	Solar work																	█	█	█	█	█	█	█	█
18	CCTV work																	█	█	█	█	█	█	█	█
19	AC Work	█	█	█	█	█	█	█	█																
20	Cleaning Work																					█	█	█	█



শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন প্রকল্প

কর্ম পরিকল্পনা (প্রকল্প এলাকা সিলেটে, মেইন বিল্ডিং)

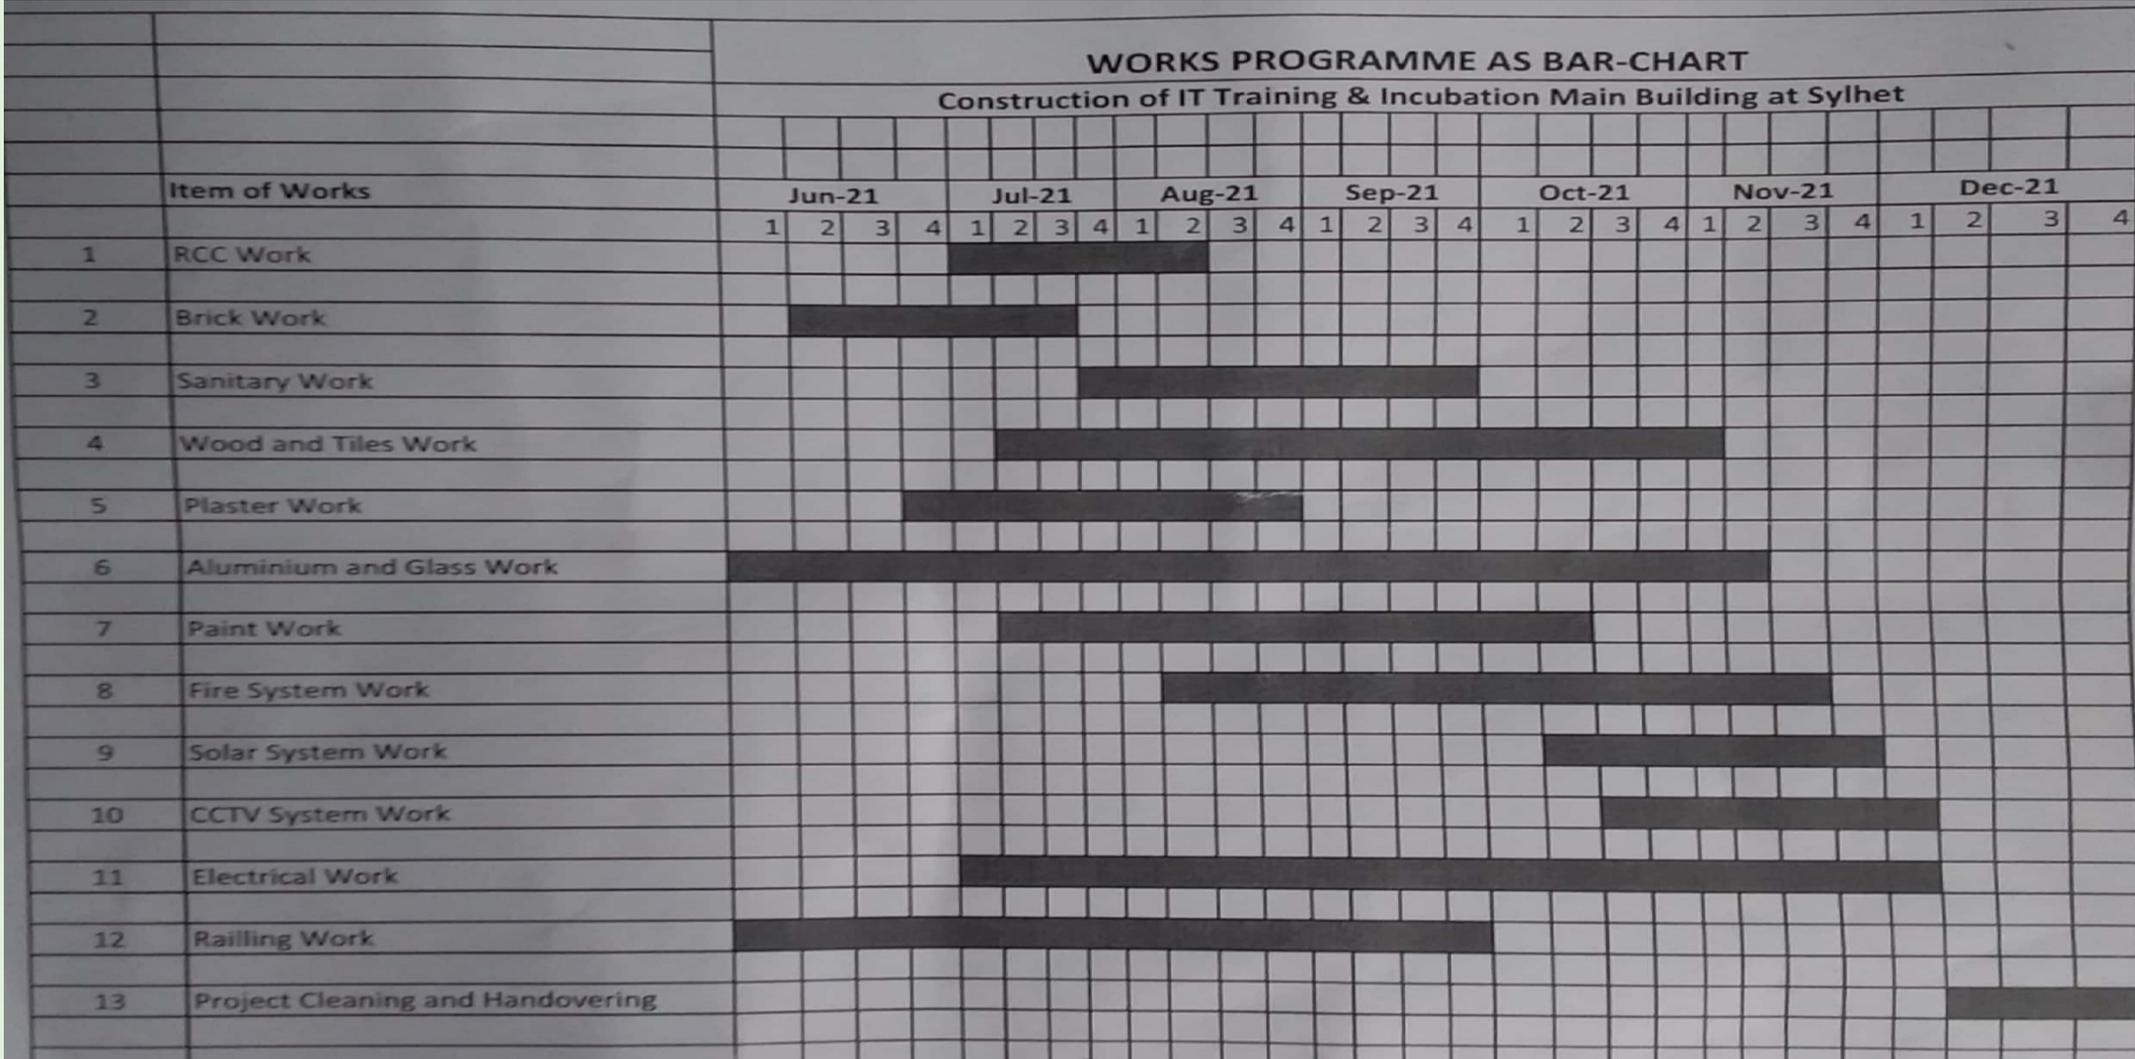

শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন প্রকল্প

কর্ম পরিকল্পনা (প্রকল্প এলাকা কুমিল্লা)



REVISED WORK SCHEDULE-SKIT-CUMILLA

Tender ID- 351189, Inv. Ref.: 56.02.0000.009.14.029.19-141, Package No.: BHTPA-WD-14.
 Package Name: Construction of Canteen Building, RCC Compound Drain, Boundary Wall Gate, Sub-Station Building, Car Parking Water Body and Deck, Underground and Overhead water tank and internal road at Cumilla for Establishment of Sheikh Kamal IT Training & Incubation Center Project

Date: 21/06/2021

SL	REMAINING ACTIVITIES/WORK			Required Duration in Month	Date: 21/06/2021						
					Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21
1	Canteen Building	1.1	Brick work & Drop wall	1.5	█	█					
		1.2	Electrical & Sanitary works	1		█	█				
		1.3	Plaster Work	1		█	█				
		1.4	Tiles Work	1.5		█	█	█			
		1.5	ACP & Glass work	2			█	█	█		
		1.6	Fire Protection & Detection	1.5				█	█	█	
		1.7	False ceiling & MS SS Works	1						█	█
		1.8	CC TV	0.5							█
		1.9	Paint Works	1							█
2	Sub-Station Building	2.1	Louver & Shutter Door Fixing	1		█	█				
		2.2	Paint Works	1			█	█			
3	Boundary Wall	3.1	Grill fixing & Coving Works	2				█	█		
		3.2	Paint Works	1						█	
4	Deck	4.1	Brick Foundarion	1	█						
		4.2	Deck Slab	1		█	█				
		4.3	Tiles Work	1			█	█			
5	Gate	5.1	Foundation Works	1	█						
		5.2	Super-Structure RCC works	1		█	█				
		5.3	MS Gate Fixing	0.5			█	█			
		5.4	Plaster Work	0.5			█	█			
		5.5	Paint Works	0.5				█	█		
6	Road & Parking	6.1	Ground Preparation	1	█						
		6.2	Brick Works	0.5		█	█				
		6.3	RCC Works	1.5			█	█	█		
7	Handover			0.5						█	



শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন প্রকল্প

Works Programme as Bar-Chart

"Construction of IT Training & Incubation Building" at Netrokona


Item of Work	জুন-21				জুলাই-21				আগস্ট-21				সেপ্টেম্বর-21				অক্টোবর-21				নভেম্বর-21				ডিসেম্বর-21			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1 Roof Floor Shuttering, Re-bar work and Casting-(Column,Shear wall & Slab)	█																											
2 Brick work	█				█				█				█				█											
3 Sanitary work									█				█				█											
4 Wood & Tiles works					█				█				█				█											
5 Plaster work	█				█				█				█				█											
6 Aluminium and Glass work													█				█											
7 Paint work					█				█				█				█											
8 Fire System work													█				█											
9 Solar System work																	█				█							
10 CCTV System work																					█							
11 Electric work													█				█				█							
12 Project Cleaning and Handing over																									█			



Works Programme as Bar-Chart

"Construction of Canteen , Sub-Station Building & Boundry wall " at Netrokona

SL NO	Item of Work	জুন-21				জুলাই-21				আগস্ট-21				সেপ্টেম্বর-21				অক্টোবর-21				নভেম্বর-21				ডিসেম্বর-21			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Canteen building & Sub-station building																												
1	Roof Floor Shuttering, Re-bar work and Casting- (Column,Shear wall & Slab) (Canteen)																												
2	Ground Floor Shuttering, Re-bar work and Casting- (Beam & Slab) (Sub-Station)																												
3	Roof Floor Shuttering, Re-bar work and Casting- (Beam & Slab) (Sub-Station)																												
4	Brick work																												
5	Sanitary work																												
6	Wood & Tiles works																												
7	Plaster work																												
8	Aluminium and Glass work																												
9	Paint work																												
10	Fire System work																												
11	CCTV System work																												
12	Electric work																												
13	Internal Road																												
14	Entrance Gate																												
15	Boundary wall																												
16	Project Cleaning and Handing over																												



কর্ম পরিকল্পনা (প্রকল্প এলাকা রংপুর)



সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নাম : **M/S RAHMAN TRADERS**

কার্যক্রমের নাম : শেখ কামাল আই টি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার নির্মাণ প্রকল্প, পীরগঞ্জ, রংপুর

চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ: ২৮ জুন ২০২০ কার্যক্রম সমাপ্তির তারিখ: ৩০ জুন ২০২২

ইতোপূর্বে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ জুন/২০২১ পর্যন্ত হতে	কার্যক্রম	জুলাই-২১	আগস্ট-২১	সেপ্টেম্বর-২১	অক্টোবর-২১	নভেম্বর-২১	ডিসেম্বর-২১	জানুয়ারী-২২	ফেব্রুয়ারী-২২	মার্চ-২২	এপ্রিল-২২	মে-২২	জুন-২২	সম্পাদিত কাজের পরিমাণ
কাজের অগ্রগতি (%)	Site Preparation , Layout & Mobilization Of Work, Earth Work, Earth/Sand Filling In Foundation	১০০%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%
কাজের অগ্রগতি (%)	(Building Foundation) Cast In Situ Pile, Pre-Cast Pile ,RCC Pile Cap And Grade Beam	১০০%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%
কাজের অগ্রগতি (%)	Boundary Wall, Substation, Canteen building Foundation	৯০%	১০%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%
কাজের অগ্রগতি (%)	COL. BEAM AND ROOF SLAB Up to 1 st floor	১০০%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%
কাজের অগ্রগতি (%)	Col. Beam And Roof Slab Up to 2 nd Floor, Canteen building Col. Beam And Roof	-	১০০%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%
কাজের অগ্রগতি (%)	COL. BEAM AND ROOF SLAB Upto 3 rd floor,	-	-	১০০%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%
কাজের অগ্রগতি (%)	COL. BEAM AND ROOF SLAB Upto 4 th floor	-	-	-	১০০%	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%
কাজের অগ্রগতি %	COL. BEAM AND ROOF SLAB Upto 5 th floor	-	-	-	-	১০০%	-	-	-	-	-	-	-	১০০%
কাজের অগ্রগতি %	COL. BEAM AND ROOF SLAB Upto 6 th floor,	-	-	-	-	-	১০০%	-	-	-	-	-	-	১০০%
কাজের অগ্রগতি (%)	Finishing Work 1 Upto 6 th floor & Canteen building : Brick Work Incl. Lintel, False Slab, Internal/External plaster, Door, Tiles, Aluminum work, Window panel, Internal Electric, Sub-Station Water, Sanitary Work & Internal Road, Fire Fighting, Solar, CCTV, Gate, Mural	-	-	-	-	-	-	২০%	২০%	২০%	২০%	২০%	-	১০০%
কাজের অগ্রগতি (%)	Finishing Work 2 Upto 6 th floor: Decoration & Painting, Sewage & Sewerage Disposal Incl Drain ,Septic Tank, Plinth Protection, Parking Area, Deck, Waterbody, Dome	-	-	-	-	-	-	১০%	২০%	২০%	২০%	২০%	১০%	১০০%
কাজের অগ্রগতি (%)	SITE CLEANING & HANDOVER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৯০%	১০%	১০০%
	আর্থিক অগ্রগতি (%)	১০%	১০%	১০%	১০%	১০%	১০%	১০%	১০%	০৫%	০৫%	০৫%	০৫%	১০০%



শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন প্রকল্প

