

ভাষা আন্দোলনে প্রাণোৎসর্গকারী সকল শহীদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা

১

# স্বাগত



মনিটরিং বিভাগ  
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

১

বিএডিসি কর্তৃক ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও  
কার্যক্রমসমূহের জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার  
কার্যপত্র

#### সভার আলোচ্যসূচি

১. গত ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;
২. গত ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৩. কৃষি মন্ত্রণালয়ে গত ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৪. বিএডিসি'র প্রকল্পসমূহের চলতি ও বিগত বছরের তুলনামূলক আর্থিক অগ্রগতি;
৫. প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র, আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৬. কার্যক্রমসমূহের জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র, আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৭. বিবিধ।

আলোচ্যসূচি-১: গত ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

বিগত সভার কার্যবিবরণী মনিটরিং বিভাগের ২৮ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের ২৮ নং স্মারকে সংশ্লিষ্ট দপ্তর, বিভাগ, প্রকল্প ও কার্যক্রম দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া কার্যবিবরণী সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। জারিকৃত কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। গত সভার কার্যবিবরণী অদ্য সভায় নিশ্চিতকরণ করা যেতে পারে।

২০২৫-২৬ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

ক্র.নং	সাব সেক্টরের নাম	সংখ্যা	মন্তব্য
০১.	সেচ সাব-সেক্টর	০৮ ...	PARTNER প্রকল্পটিতে ফসল এবং সেচ উভয় কার্যক্রম রয়েছে।
০২.	ফসল সাব-সেক্টর	১২ ...	
০৩.	সম্প্রতি অনুমোদিত	০২ ...	
	মোট =	২২	

সবুজ পাতাভুক্ত প্রকল্পসমূহ				
ক্র. নং	নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	সর্বশেষ অবস্থা	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
০১.	বৃহত্তর যশোর জেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০২৫- জুন, ২০২৮)	২৯৯.৮৬	PEC সভা সম্পন্ন হয়েছে। ECNEC-এ অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমাণ রয়েছে।	মো. আবদুল্লাহ আল রশিদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওকা)
০২.	বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (জুলাই, ২০২৫- জুন, ২০২৯)	৮৪৯.৭৮	অর্থের সংস্থানের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গেছে। জনবল নির্ধারণের প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিবেচনামত রয়েছে।	মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম নির্বাহী প্রকৌশলী (নির্মাণ)
০৩.	বৃহত্তর বগুড়া ও গাইবান্ধা জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই, ২০২৫- জুন, ২০২৯)	৬৪৮.৫৫	অর্থের সংস্থানের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গেছে। জনবল নির্ধারণের প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিবেচনামত রয়েছে।	মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম নির্বাহী প্রকৌশলী (সওকা)
০৪.	বগুড়া জেলায় আনুবীজ উৎপাদন খামার স্থাপন প্রকল্প (জুলাই, ২০২৫- জুন, ২০২৯)	৪৪৯.৯৯	যাচাই কমিটির সভা সম্পন্ন হয়েছে। পুনর্গঠিত DPP কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	মো. আলতাফ হোসেন ব্যবস্থাপক (আনুবীজ)
০৫.	পাহাড়ী অঞ্চলে মাইক্রো লেভেল সেচ ব্যবস্থা জোরদারকরণ প্রকল্প। (জুলাই, ২০২৫- জুন, ২০৩০)	৮০১.৯২	যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক DPP কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	মোহাম্মদ সাহেদ নির্বাহী প্রকৌশলী (সেচ)
০৬.	বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের পুষ্টি উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও কর্ম সৃষ্ণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ফলের চারা ও কলম উৎপাদন এবং বিতরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২৫- জুন, ২০২৮)	২০৩.৭৫	যাচাই কমিটির সভা সম্পন্ন হয়েছে। DPP পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে।	মো. দুলাপুর রহমান ব্যবস্থাপক (এএসসি), বিভাগ

আলোচ্যসূচি-২: গত ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
ক্র.নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৩.১	ক. চট্টগ্রাম সিটি-১ ও ২ সার গুদামের নির্মাণ কাজ শেষ করে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখের মধ্যে সার সংরক্ষণের উপযোগী করতে হবে। ... খ. খুলনা সিটি, রংপুর সিটি, মেহেরপুর সদর, বান্দরবান সদর, সাতক্ষীরা সদর, রাজশাহী ও নওগাঁ, ঢাকার গাবতলীসহ অন্যান্য সকল সার গুদামের নির্মাণ কাজ এপ্রিল '২৬ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। ...	ক. চট্টগ্রাম সিটি- ১ ও ২ সার গুদামের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি প্রকল্প পরিচালক সভায় জানাবেন। খ. খুলনা সিটি, রংপুর সিটি, মেহেরপুর সদর, বান্দরবান সদর, সাতক্ষীরা সদর, রাজশাহী ও নওগাঁ, ঢাকার গাবতলীসহ অন্যান্য সকল সার গুদামের নির্মাণ কাজ এপ্রিল '২৬ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	১. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, ২. মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা), ৩. প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ), বিএডিসি।
৩.২	অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের ন্যূনতম ৬০% অর্থ প্রথম তিন কোয়ার্টারের মধ্যে (মার্চ, ২০২৬) ব্যয় নিশ্চিত করার জন্য সকল প্রকল্প ও কার্যক্রম পরিচালককে যথাযথ কৌশল গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্প ও কার্যক্রম-সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানগণ এ বিষয়টি নিয়মিত তদারক করবেন। সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ও কার্যক্রম পরিচালক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন।	এ বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন তথা মার্চ মাসের মধ্যে বরাদ্দে ৬০% ব্যয় নিশ্চিত করার জন্য সকল প্রকল্প ও কার্যক্রম পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	১. মহাব্যবস্থাপক (বীজ/সার), ২. প্রধান প্রকৌ. (ক্ষুদ্রসেচ/নির্মাণ), ৩. সকল প্রকল্প/কার্যক্রম পরিচালক, বিএডিসি।

গত ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৩.৩	বিএডিসি কর্তৃক ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের পরিচালক-কে স্ব স্ব প্রকল্পের কার্যক্রমের ওপর ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করে ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উইং-এ প্রেরণ করতে হবে। উইং থেকে অন্য কোন তথ্য থাকলে তা সংযোজনপূর্বক জনসংযোগ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক বিএডিসি'র সকল কার্যক্রমের ওপর কেন্দ্রীয়ভাবে একটি ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করতে হবে।	বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের কাজের ওপর ছোট আকারের ডকুমেন্টারি প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালক-কে জনসংযোগ বিভাগ হতে পত্র দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিষয়টি মৌখিকভাবেও তাঁদেরকে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয়ভাবে ডকুমেন্টারি প্রস্তুতের বিষয়ে কমিটির সদস্যগণ তিন দফায় সভায় মিলিত হয়েছেন। স্ব স্ব উইং হতে তথ্য-উপাত্ত পাওয়া গেলে ডকুমেন্টারি প্রণয়নের বিষয়টি ত্বরান্বিত হবে।	১. জনসংযোগ কর্মকর্তা, বিএডিসি ২. সকল প্রকল্প/কার্যক্রম পরিচালক, ৩. মহাব্যবস্থাপক (বীজ/সার), ৪. প্রধান প্রকৌ. (সেচ) বিএডিসি।
৩.৪	বিএডিসি'র কার্যক্রমের সফলতার চিত্র এবং বিভিন্ন সেবার তথ্য প্রচারের জন্য বিএডিসি'র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তথ্য ফেসবুক গ্রুপ, পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল আরও সক্রিয় করতে হবে। বিএডিসি'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্টেটক হোস্টারকে এগুলোতে সম্পৃক্ত করতে হবে।	বিএডিসি'র কার্যক্রমের সফলতার চিত্র জনসংযোগ বিভাগ এবং স্ব স্ব প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক বিভিন্ন দৈনিক জাতীয় পত্রিকায় এবং প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার করা হয়ে থাকে। এছাড়া সফলতার তথ্য বিএডিসি'র ফেসবুক গ্রুপ (বিএডিসি ডাবনা) এবং ফেসবুক পেজে (বিএডিসি) পোস্ট/ প্রচার করা হয়ে থাকে।	১. জনসংযোগ কর্মকর্তা, ২. আইসিটি সেল, মনিটরিং বিভাগ, বিএডিসি।

গত ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
ক্র.	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৩.৫	স্মলহোস্টার এগ্রিকালচারাল কম্পিউটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঞ্চ) এর মেয়াদ আগামী ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে শেষ হবে বিধায় এ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য ডোনার এজেন্সি IFAD এর অর্থায়নে বিএডিসি'র অনুকূলে আলাদা একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে। উক্ত প্রকল্পের বিএডিসি অঞ্চের কম্পোনেন্ট ডিরেক্টর প্রকৌশলী মো. রেজাউর রহমান ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।	সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এ বিষয়ে সভায় অগ্রগতি জানাবেন।	১. প্রধান (পরিচালনা), বিএডিসি। ২. প্রধান প্রকৌশলী (কুদ্রসেচ), ৩. কম্পোনেন্ট ডিরেক্টর, এসএসিপি, (বিএডিসি অঞ্চ)।
৩.৬	ক. কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে মুন্সীগঞ্জ জেলায় ৫০০ মে. টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন বীজ সংরক্ষণাগারসহ ২৪৫ বর্গ মিটার অফিস ভবন নির্মাণের কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে। জায়গাটি নদীর নিকটবর্তী হওয়ায় কাজ শুরুর পূর্বে ভূমি উন্নয়ন ও Retaining wall নির্মাণসহ পরিত্যক্ত ভবন অপসারণ করতে হবে। স্থান সংকুলানজনিত কারণে বীজ সংরক্ষণাগারের আয়তন ছোট করতে হলে যথাযথ বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে। খ. জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জের আওতাধীন ১১ একর খাস জমি বিএডিসি'র অনুকূলে বন্দোবস্ত নেয়া যেতে পারে। বিষয়টির সম্ভাব্যতা যাচাই করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)-কে আহ্বায়ক করে একটি তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা যেতে পারে।	ক. উক্ত বীজসংরক্ষণাগার ও অফিস ভবন নির্মাণের কাজ শুরুর পূর্বে ভূমি উন্নয়ন ও Retaining wall নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং পরিত্যক্ত ভবন অপসারণ করা হয়েছে। স্থান সংকুলানজনিত কারণে বীজ সংরক্ষণাগারের আয়তন ছোট করার বিষয়ে যথাযথ বিধি-বিধান অনুসরণ করা হয়েছে। খ. কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান।	১. মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান), ২. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।


গত ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৩.৭	বিএডিসি কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে স্থাপিত ভিয়েতনামী নারিকেলের মাতৃ বাগানগুলো থেকে কোন আউটগুট না পাওয়ায় এ বিষয়ে সংস্থার করণীয় নির্ধারণের জন্য সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)-কে আহবায়ক করে একটি চার সদস্যের টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করতে হবে। এতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	এ বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করে চার সদস্যবিশিষ্ট একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়েছে। ...	মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান), বিএডিসি।
৩.৮	আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লাস্ট স্থাপন প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০২২ - জুন, ২০২৬ পর্যন্ত রয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন প্রয়োজনে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।

আলোচ্যসূচি-২: গত ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৬.১	কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী শতভাগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	এ বিষয়ে সকল প্রকল্প পরিচালক-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	সকল প্রকল্প/কার্যক্রম পরিচালক, বিএডিসি
৬.২	চলমান প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থবছরভিত্তিক সুনির্দিষ্ট ও সময়নিষ্ঠ পরিকল্পনা গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করতে হবে।	বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থবছরভিত্তিক সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।	১. মহাব্যবস্থাপক (সার/শীজ), ২. প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), ৩. সকল প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি
৬.৩	কৃষিক্ষেত্রে সফলতার চিত্র তুলে ধরে তা প্লিন্ট, ইলেক্ট্রনিক এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সম্প্রচার করতে হবে।	কৃষিক্ষেত্রে বিএডিসি'র মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমের সফলতার চিত্র/তথ্য নিয়মিত প্লিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয়ে থাকে।	১. জনসংযোগ কর্মকর্তা, ২. সকল প্রকল্প/কার্যক্রম পরিচালক, বিএডিসি
৬.৫	কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের চলমান প্রকল্পসমূহে আরএডিপি'তে পরিকল্পনা অনুযায়ী বরাদ্দের বিপরীতে শতভাগ বাস্তবায়ন করতে হবে।	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বিএডিসি'র প্রকল্পসমূহে আরএডিপি'তে বরাদ্দের বিপরীতে শতভাগ বাস্তবায়ন করার জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	সকল প্রকল্প/কার্যক্রম পরিচালক, বিএডিসি।

গত ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:

ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৬.৬	যে সকল প্রকল্প সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি প্রয়োজন তা যৌক্তিকতাসহ আইএমইডি ছকে মেয়াদ বৃদ্ধি প্রস্তাব সংস্থা হতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন যে সকল প্রকল্পে সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি প্রয়োজন সে সকল প্রকল্পের সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি
৬.৭	চলমান অর্থবছরে সমাপ্তের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ যথাযথ ও গুণগতমান রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন শেষ করতে হবে।	চলমান অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ যথাযথ ও গুণগতমান রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি

আলোচ্যসূচি-৪: বিএডিসি'র প্রকল্পসমূহের চলতি ও বিগত বছরের তুলনামূলক আর্থিক অগ্রগতি

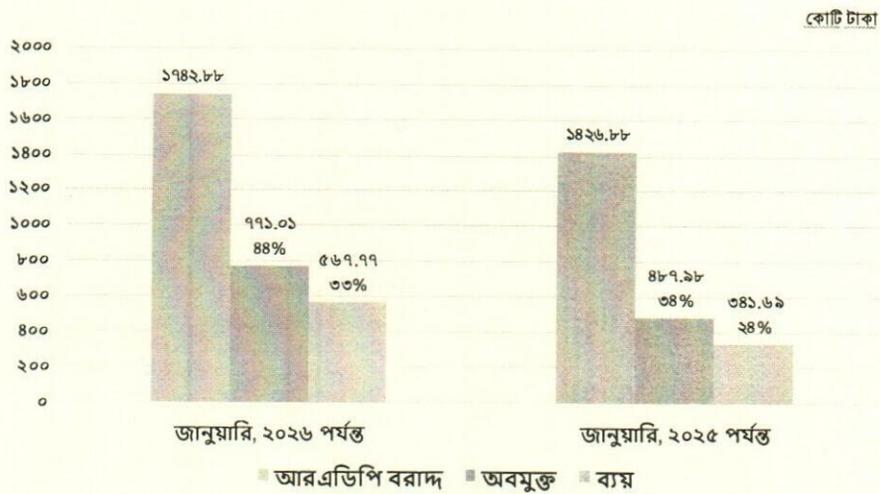

### আলোচ্যসূচি-৫

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র, আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি। (কোটি টাকা)

(১) স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অংশ)

মেয়াদ: জুলাই '১৮-জুন '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৩৯৯.৪০ কোটি টাকা কম্পোনেন্ট ডিরেক্টর: মো. রেজাউর রহমান

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	০	০	০	০

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি			
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি
	৫৭.৯৭	২৮.৭২ (৫০%)	২৪.৪৫ (৪২%)	৬৫%	আর্থিক ৩৫০.৫৬ (৮৮%) ভৌত ৯২%

#### প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৬৬৪	৫৯৭	৬৭	৩৭	৬৩৪
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	কি.মি.	৩১০	২৮৪	২৬	১৪	২৯৮
ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	৩৩১	২৫৯	৭২	৩৬	২৯৫
রেইন ওয়াটার হারভেস্টার নির্মাণ	সংখ্যা	২৪২৪	২১৬২	২৬২	১৬০	২৩২২

(২) বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং ওয়েব বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট গবেষণা প্রকল্প

মেয়াদ: জুলাই '২১-জুন '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৭৩.২৪ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মোছা. মাহফুজা আক্তার

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১	১	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	১৬.৬৭	১১.২৫ (৬৭%)	৭.৯৫ (৪৮%)	৪৯%	৫৪.৫২ (৭৪%)	৭৫%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
ইরিগেশন ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট এবং ওয়েববেজ এপ্রিকালচারাল ইনফরমেশন ব্যবস্থাপনা তৈরিকরণের গবেষণা।	জন মাস	২১৬	১৩১	৫৬	৩৫	১৬৬
খাল খনন	কি.মি.	১৫	২	৮	০	২
কৃষক প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	৩৩	০	২৩	২	২

(৩) বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠী ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্প

মেয়াদ: সেপ্টেম্বর '২৩-ডিসেম্বর '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৩৪৮.৯১ কোটি প্রকল্প পরিচালক: সৈয়দ ওয়াহিদ মুরাদ

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১৫	১৫	১৪	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	১১৮.৫২	৩৭.৭৩ (৩২%)	৩১.৯৬ (২৭%)	৪৫%	১৬৬.৭৭ (৪৮%)	৬৬%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৩৭৫	২১৭	১৩৭	৩১	২৪৮
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	২৭০	১৫৪	১০০	৬৮	২২২
ফসল রক্ষা বাধ নির্মাণ	কি.মি.	৪০	১	৩০	৫	৬
খালের পাড়ে জল নির্গমন পথ নির্মাণ	সংখ্যা	১৫০০	৭৪০	৫৫০	১২০	৮৬০
সেচ পাইপ ক্রয়	সেট	২৭০	২৪০	৩০	৩০	২৭০

(৪) চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ভূউপরিষ্ক পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প

মেয়াদ: জুলাই '১৩-জুন '২৮ ডিপিপি বরাদ্দ: ৬০২.২৬ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. নূরুল ইসলাম

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৪৭	৪৭	৩০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	১৮০.০০	৮২.৪১ (৪৬%)	৮২.৪১ (৪৬%)	৫৫%	৩৪৯.৩৪ (৫৮%)	৫৯%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন	কি.মি	৫২৫	৩১৩	১৭৫	১০০	৪১৩
সেচ পাইপ ফ্রয়	সেট	৪৫৫	৪২২	৩৩	১৭	৪৩৯
এলএলপি/সোলার পাম্পহাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	২৭০	১০৫	৮০	৪০	১৪৫
সোলার ডাগওয়েল নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	২২	১০	৫	২৭
সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৯৮০	৩২৯	২১০	১১৫	৪৪৪

(৫) পানি সাস্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প

মেয়াদ: জুলাই '১৩-জুন '২৮ ডিপিপি বরাদ্দ: ২০১.৪৭ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. মাহাবুব আলম

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১৯	১৯	১৬	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	৮২.০০	৪২.৩৮ (৫২%)	২৫.৪৪ (৩১%)	৩৫%	৫২.৪৭ (২৬%)	২৯%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
পলিশেড নির্মাণ	সংখ্যা	১৩৫	২৫	৫০	৭	৩২
ডিপ ইরিগেশন স্থাপন	সংখ্যা	১৩৫	৩৫	৩৫	৩৫	৭০
মিস্ট ইরিগেশন স্থাপন	সংখ্যা	১৩৫	২৫	৫০	০	২৫
বৃষ্টির পানি হারভেস্টিং অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	১৩৫	২০	৫০	৩	২৩

(৬) সিলেট বিভাগে ভূউপরিষ্ক পানি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প।

মেয়াদ: জানু. '২৫-ডিসে. '২৯ ডিপিপি বরাদ্দ: ৪৯৯.৯৯ কোটি প্রকল্প পরিচালক: প্রনজিত কুমার দেব

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৪৭	৪৭	৪৭	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি			
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
	২০০.০০	১৫০.০০ (৭৫%)	১২০.০৮ (৬০%)	৬৫%	আর্থিক ১২০.০৮ (২৪%)

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৩২৬	০	১২০	৬০	৬০
ব্যারিড পাইপ লাইন নির্মাণ	টি	১৫৮	০	১০০	৫১	৫১
আরসিসি গোপাট নির্মাণ	কি.মি.	১০	০	২	১	১
সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	টি	৯০	০	১৬	৯	৯
সেচ পাইপ ক্রয়	সেট	৩৭৮	০	৩১৯	২৮০	২৮০

(৭) Bangladesh Sustainable Recovery, Emergency Preparedness and Response Project (B-STRONG) Agriculture System Restoration Component (BADC Part).

মেয়াদ: এপ্রিল '২৫-জুন '২৮ ডিপিপি বরাদ্দ: ১২৯.০৮ কোটি উপ-প্রকল্প পরিচালক: এ, কে, এম, জাহাঙ্গীর আলম সরকার

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১৫	১২	৫	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি			
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
	৬১.৩৭	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	৪০%	আর্থিক ০.০০ (০%)

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
সার ও বীজ গুদাম মেরামত	টি	১৪	০	৮	০	০
সেচ অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি মেরামত	টি	৩৫০	০	২০০	০	০
খাল/নালা/বোরোপিট/জলাশয় পুনঃখনন	কি.মি.	১৩০	০	৫৮	০	০
গুদাম নির্মাণ	টি	১	০	১ (আংশিক)	০	০
সেচ পাইপ ক্রয়	সেট	৬০৩	০	৩২৬	০	০

(৮) খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই '২৫- জুন '৩০)  
মেয়াদ: জুলাই '২৫- জুন '৩০ ডিপিপি বরাদ্দ: ৪৯৯.৮২ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. জামাল ফারুক

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৪৭	৩২	২৮	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	৮০.৪০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	০%	০.০০ (০%)	০%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৫০০	০	১২০	০	০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা এবং পাম্প হাউজ নির্মাণ	টি	১৪০	০	১৫	৩	৩
মাকারি ও ছোট হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	টি	১১০	০	১১	০	০
রেইন ওয়াটার হারভেস্টার নির্মাণ	টি	৩০০	০	৮০	০	০
সেচ পাইপ ক্রয়	সেট	১০৬০	০	০	০	০

(৯) বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প  
মেয়াদ: জুলাই '১৯-জুন '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৩৫০.৮৮ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. মজিবুর রহমান খান

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১	০	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	৪০.৬৭	১৫.৯৬ (৩৯%)	১৫.৯৬ (৩৯%)	৪০%	৩২৬.১৬ (৯৩%)	৯৪%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
প্রিফ্রেব্রিকেটেড স্টিল গুদাম নির্মাণ	সংখ্যা	৪২	৩১	১১	৩	৩৪
বিদ্যমান গুদাম সংস্কার	সংখ্যা	১০৫	৮৩	২২	০	৮৩
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা.মি.	১৬,৫৮৪	১৫,৯৮২	৬০২	০	১৫,৯৮২

২৪

**(১০) মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)**  
মেয়াদ: সেপ্টে. '১৯-জুন '২৭ ডিপিপি বরাদ্দ: ১১৩৮.৭৪ কোটি (নিজস্ব: ৯২.২৫ কোটি) প্রকল্প পরিচালক: মো. আবীর হোসেন

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	০	০	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি			
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
	৬১.৮৩	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	৩৫%	আর্থিক ৬৪৩.৫২ (৫৭%)

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
হিমাগার নির্মাণ	সংখ্যা	৮	০	৪ ...	চলমান	০
বীজআলু সংগ্রহ	মে.টন	৩,১৫,৯৭৭	২,২৪,২৮১	৪৮,২২৬	০	২,২৪,২৮১
ধান বীজ সংগ্রহ	মে.টন	৪৭২৮	৩৪২৮	৬৫০	০	৩৪২৮
গম বীজ সংগ্রহ	মে.টন	১৬২	১৩৪	১৪	০	১৩৪
প্লান্টলেট উৎপাদন	লক্ষ টি	২৯	১৯	৫.১০	০	১৯

**(১১) জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প**  
মেয়াদ: জুলাই '২১-জুন '২৭ ডিপিপি বরাদ্দ: ৮১.০৭ কোটি প্রকল্প পরিচালক: ড. এ. বি.এম. গোলাম মনদুর

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৭	৭	৭	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি			
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
	২৫.৬২	৬.৭৫ (২৬%)	৬.০৭ (২৪%)	৪৫%	আর্থিক ৫৬.৭৩ (৭০%)

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
অফিস ডবন কাম টিসুকালচার ল্যাব স্থাপন	সংখ্যা	১	০	১	২০%	৮০%
নিয়ন্ত্রিত গ্রিন হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১	০	১	চলমান	২০%
অনিয়ন্ত্রিত গ্রিন হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১	০	১	চলমান	২০%
প্লান্টলেট সেড নির্মাণ	সংখ্যা	১	০	১	চলমান	-

২৬

(১২) আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প  
মেয়াদ: মার্চ '২২-জুন '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৩১.১০ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. রুহুল আমিন

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৭	৭	৭	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
৬.২০	০.৯৮ (১৬%)	০.৫৪ (৯%)	৩০%	২৪.৬৭ (৭৯%)	৯১%	

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা.মি.	৬০০	৪২৫	১০০	০	৪২৫
হট ওয়াটার ক্রিটমেন্ট প্লান্ট	টি	৪	০	৪	০	০
রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	রা.মি.	২৫০	০	২৫০	২৫	২৫
সোলার প্যানেল স্থাপন	কিও	২৩	০	২৩	৩	৩

২৭

(১৩) বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প

মেয়াদ: মার্চ '২২-সেপ্টেম্বর '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৪৭৮.৩৬ কোটি প্রকল্প পরিচালক: সৈয়দ সারোয়ার জাহান

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৩	৩	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
২৭৭.৬৬	১.৩০ (০.৪৭%)	০.৬৭ (০.২৪%)	৩০%	৫২.৯৫ (১১%)	২১%	

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
ভূমি অধিগ্রহণ	একর	৬২৬.৩৯	০	৫৮৭.৯৩	০	০
বীজ গুদাম নির্মাণ	সংখ্যা	১	০	১	০	০
পাকা রাস্তা নির্মাণ	ব.মি.	২১৪৬০	১৮২২১	৩২৩৯	০	১৮২২১
শ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ	সংখ্যা	২	০	২	০	০
খাল খনন	কি. মি.	১২	০	১২	০	০

(১৪) Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER) (বিএডিসি অঙ্গ)						
মেয়াদ: জুলাই '২০-জুন '২১ ডিপিপি বরাদ্দ: ৯৯০.০৪ কোটি এডেলি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর: ড. এ. কে. এম. সিজানুর রহমান						
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		২১	১৫	১৫		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	১০৬.২১	৬৫.১৬ (৬১%)	৪৯.৯৩ (৪৭%)	৫০%	৩৫৭.৩৮ (৩৬%)	৪২%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
বেরিড পাইপ লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	২৫০	১৬২	৭৯	১৫	১৭৭
বেরিড পাইপ লাইন স্থাপন (৫০০ মি./পাম্প)	সেট	৩৬৫০	১৪৯৭	১৮৮	৭১	১৫৬৮
ধানবীজ উৎপাদন	মে. টন	৭৫০০	৩১৯৮	২৫৪০	৭৬৬	৩৯৬৪
অন্যান্য বীজ উৎপাদন	মে. টন	৭০০০	৩৮৬১.৪৩	২১০০	০	৩৮৬১.৪৩
বীজ সংরক্ষণাগার তৈরী	সংখ্যা	১০	০৩	০৩ ...	০	০৩

(১৫) কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প						
মেয়াদ: সেপ্টেম্বর '২০-জুন '২৭ ডিপিপি বরাদ্দ: ২৮২.৬২ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মোহাম্মাদ মাহমুদুল আলম						
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		৬৫	৫৮	৩০		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	৭১.০০	৬৪.৩১ (৯১%)	৪১.৪২ (৫৮%)	৬০%	১৩৫.৭২ (৪৮%)	৫০%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
বীজ সংরক্ষণাগার নির্মাণ	সংখ্যা	৭৫	৮	৫৩ ...	চলমান	৮
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	মিটার	১৩৬৪৩	৫২৭৩	৯০৭২	২২৬৮	৭৫৪১
ভূমি উন্নয়ন	ঘন মি.	১৩৪৬৮	৮৯১১	৪৫৫৭	০	৮৯১১
কীটনাশক (ক্যামিক্যালস)	লিটার	১২৪৩	৮৩৮	৪৩৩	১০৮	৯৪৬

<p>(১৬) ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প।</p> <p>মেয়াদ: জানু. '২৫-জুন '২৯ ডিপিপি বরাদ্দ: ২৬৫.৭৮ কোটি প্রকল্প পরিচালক: ড. মো. শফিকুল ইসলাম</p>							
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
		১০	৮	৪			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি					
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
	৮০.৯৪	৬৬.২৪ (৮২%)	১৫.০৪ (১৯%)	৬৫%	আর্থিক ১৫.০৪ (৬%)	ভৌত ১৪%	
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি							
প্রধান প্রধান কাজ		একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
ডাল বীজ উৎপাদন ও সংগ্রহ		মে. টন	৮৭৬০	০	১৭০৫	১৩০	১৩০
তৈল বীজ উৎপাদন ও সংগ্রহ		মে. টন	৯২৪০	০	১৭৯০	০	০
কৃষক প্রশিক্ষণ		জন	২০০০	০	৪০০	৩৭৫	৩৭৫
ট্রানজিট বীজ গুদাম নির্মাণ		টি	২	০	২	০	০

৩১

<p>(১৭) তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)</p> <p>মেয়াদ: জুলাই '২০-জুন '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ২৩.২৭ কোটি প্রকল্প সমন্বয়ক: ড. মো. শফিকুল ইসলাম</p>							
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
		১	১	০			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি					
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
	২.২০	০.৬২ (২৮%)	০.৬০ (২৭%)	৫২%	আর্থিক ২১.৬১ (৯৩%)	ভৌত ৯৮%	
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি							
প্রধান প্রধান কাজ		একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
ডালবীজ উৎপাদন (মসুর)		মে. টন	৮৬	৭৬	১০	০	৭৬
তৈলজাতীয় বীজ উৎপাদন		মে. টন	৩৬০	৩১৯	৪১	০	৩১৯
ধানবীজ উৎপাদন		মে. টন	৮১৫	৭৬৬	৪৯	০	৭৬৬
পাটবীজ উৎপাদন		মে. টন	৫	৪	১	০	৪

৩২

(১৮) ধান, গম ও তুটোর উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প।						
মেয়াদ: মার্চ '২৫-জুন '২৯		ডিপিপি বরাদ্দ: ৪৭৪.৬৮ কোটি		প্রকল্প পরিচালক: মো. হামায়ুন কবির		
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		৩৯	২০	১২		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	২১০.০৯	১৬৯.৪৭ (৮১%)	১১৭.৮২ (৫৬%)	৫৭%	১১৭.৮২ (২৫%)	২৬%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
ধান বীজ সংগ্রহ	মে. টন	১১৪৮৭০	১৬১৬০	২৭৩০৩	৭৩১০	২৩৪৭০
গম বীজ সংগ্রহ	মে. টন	২০৬৮০	০	৫১০০	০	০
তুটাবীজ সংগ্রহ	মে. টন	১২০০	০	২০০	১৯৬	১৯৬
পাকা রাস্তা নির্মাণ	বর্গ মি.	৬০	০	৬০	০	০
ডানেজ	টি	৯০০	০	৪৫০	০	০

(১৯) বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প।						
মেয়াদ: মার্চ '২৫-জুন '২৮		ডিপিপি বরাদ্দ: ২৯২.৮৬ কোটি		প্রকল্প পরিচালক: ড. মো. ইব্রাহিম খলিল		
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		৫৯	৫৯	৫১		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	৬২.০০	২৬.২০ (৪২%)	২৫.৯০ (৪২%)	৬০%	২৫.৯০ (৯%)	১২%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
বীজ সংরক্ষণাগার নির্মাণ	টি	২	০	২ (আংশিক)	০	০
পটিং শেড নির্মাণ	টি	৭	০	৭	১	১
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা. মি.	৫৩,৭৮৭	০	২৮,৩৬৮	১০০০	১০০০
সানিং ফ্লোর নির্মাণ	টি.	২৩	০	২৩	১০	১০

### আলোচ্যসূচি-৬

বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহের জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র, আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি (কোটি টাকা)

(১) বীজবর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম  
সময়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ১৩০.০০কোটি কার্যক্রম পরিচালক: ড. মো. রফিকুল ইসলাম

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৮	৪	৪	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	১৮.০০	১১২.০০	১৩০.০০	৬৫.০০ (৫০%)	৪৭.৬৫ (৩৭%)	৬০%

#### প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি

বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য	
আউশ	মে.টন	১,৩৫৮.০০	১,২১৯ (৯০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
আমন	মে.টন	৪,৫৩৫.০০	৩৭০০ (৮২%)	সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান	
বোরো	মে.টন	৪৬৫৩.৪৫	০ (০%)	রোপন কার্যক্রম চলমান	
আলুবীজ	মে.টন	১৫৬১.০০	০ (০%)	উৎপাদন কার্যক্রম চলমান	
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	১২০	৩০ (২৫%)	কার্যক্রম চলমান
		কৃষক	-	-	

(২) চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম						
মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ১৬.০০কোটি কার্যক্রম পরিচালক: মো. আবদুস সামাদ						
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	০	০	০			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	৬.৫০	৯.৫০	১৬.০০	৮.০০ (৫০%)	৬.৫৪ (৪১%)	৬০%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য		
আউশ	মে.টন	৩২৯২	৩২৮৬ (১০০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত		
আমন	মে.টন	১১১০৯	১০০০০ (৯০%)	সংগ্রহ চলমান		
বোরো	মে.টন	২৩৯৬৫	০ (০%)	রোপন শেষ পর্যায়ে		
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কৃষক	৯০০	৩৯০ (৪৩%)	কার্যক্রম চলমান	

৩৭

(৩) উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম						
মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ৫২১.৯২ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: মো. মোশাফের হোসেন						
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	৪২০	৯৯	৮৮			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	৯৪.০০	৪২৭.৯২	৫২১.৯২	২৬০.৯৬ (৫০%)	২৩৭.৪৬ (৪৬%)	৭১%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য		
আউশ	মে.টন	৪৯৬৭.৩২	৪৯৬৭.৩২ (১০০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত		
আমন	মে.টন	১৬৬৭৯.০০	১৫৪৬৬.৭৪ (৯৩%)	সংগ্রহ চলমান		
বোরো	মে.টন	৩০০৮৩.৪০	০ (০%)	রোপন কার্যক্রম চলমান		
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	১৫০	৬০ (৪০%)	কার্যক্রম চলমান	
		কৃষক	-	-		

৩৮

<b>(৪) পাটবীজ কার্যক্রম</b> মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ৫৫.৫০ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: দেবদাস সাহা							
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
		৯	৫	২			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি			
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	
	১৬.০০	৩৯.৫০	৫৫.৫০	২৭.৭৫ (৫০%)	১৯.৯৪ (৩৬%)	৪৩%	
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি							
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)		অর্জন (২০২৫-২৬)		মন্তব্য	
দেশি পাটবীজ	মে.টন	৩৩৭.১০		৩৬৬.৬৭ (১০৯%)		সংগ্রহ চূড়ান্ত	
তোষা পাটবীজ	মে.টন	১৩৫৯.৪২		৬৮০ (৫০%)		সংগ্রহ চলমান	
কেনাফ পাটবীজ	মে.টন	৫১.০০		১২ (২৪%)		সংগ্রহ চূড়ান্ত	
ধানবীজ	মে.টন	১৫১৯.৫৫		৭৪২.২০ (৪৯%)		সংগ্রহ চলমান	
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	ইনহাউজ প্রশিক্ষণ		৩০		০ (০%)	এখনও শুরু হয়নি
		চাষি প্রশিক্ষণ		৬০০		৬০০ (১০০%)	চূড়ান্ত

<b>(৫) এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম</b> মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ১৫.৩০ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: ড. মো. ইসবাত							
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
		০	০	০			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি			
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	
	৭.০০	৮.৩০	১৫.৩০	৭.৬৫ (৫০%)	৬.৯১ (৪৫%)	৬৫%	
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি							
কাজের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)		অর্জন (২০২৫-২৬)		মন্তব্য	
সবজি উৎপাদন	মে.টন	৭০৭২৪.৯৮		৫০,৪৯০.১৩ (৭১%)		চলমান	
মসলা উৎপাদন	মে.টন	৭৬৬.২৯		৬৯০.০৫ (৯০%)		চলমান	
ফলমূল উৎপাদন	মে.টন	৩,৫০৮.৭২		২,০৪৩.৪৭ (৫৮%)		চলমান	
চারা ও কলম	সংখ্যা	৫৩,৫৪,৭২৮ (নারিকেল চারা-৪,৭১,৫০০)		২১,৯২,৩৮৯ (৪১%)		চলমান	
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী		৩০		০ (০%)	এখনও শুরু হয়নি
		কৃষক		৫,৬৪০		১৬৮০ (৩০%)	চলমান

(৬) জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম						
মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ১৩.৬১ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: মেহবাহ উদ্দিন আহমেদ						
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	১	০	০			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	৮.০০	৫.৬১	১৩.৬১	৬.৮০ (৫০%)	৬.৮০ (৫০%)	৬০%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য		
শীতকালীন সবজি	মে.টন	৮৪.১৬	০ (০%)	ফুল ও ফল ধরার পর্যায় রয়েছে		
গ্রীষ্মকালীন সবজি	মে.টন	২১.০৯	০ (০%)	কার্যক্রম চলমান		
পেঁয়াজ বাস	মে.টন	২০০.০০	০ (০%)	ফুল ও ফল ধরার শেষ পর্যায়ে রয়েছে		
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	-	-	-	
		কৃষক	৩০০	১৮০ (৬০%)	কার্যক্রম চলমান	

৪১

(৭) বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম						
মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ৬১.৬৬ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: খালেদুম মুনিরা						
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	০	০	০			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	১০.৫০	৫১.১৬	৬১.৬৬	৩০.৮৩ (৫০%)	১৮.৮২ (৩১%)	৪২%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য		
আউশ	মে.টন	১৪২.৫৯	১৪২.৫৯ (১০০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত		
আমন	মে.টন	২৩০০.০০	১৫৬৭ (৬৮%)	সংগ্রহ চলমান		
বোরো	মে.টন	৪৫৫৩.৫০	০ (০%)	রোপন কাজ চলমান		
গম	মে.টন	১৫৫০.০০	০ (০%)	মাঠে দস্তায়মান		
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কৃষক	৭২০	৪৫০ (৬৩%)	কার্যক্রম চলমান	
		মাঠ দিবস	২	০ (০%)	কার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি	

আলোচ্যসূচি ৭. বিবিধ।

৪০

ধন্যবাদ

৪৪
