



সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

SYLHET GAS FIELDS LIMITED

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

প্রতিবেদনকাল

আগস্ট ২০২৫



মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

MONTHLY MIS REPORT



সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

আগষ্ট ২০২৫ মাসের এমআইএস প্রতিবেদন

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১)	ফিল্ড/স্থাপনা ভিত্তিক উৎপাদন পরিসংখ্যান	১
২)	কোম্পানির সামগ্রিক উৎপাদন পরিসংখ্যান	২
৩)	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণী	৩
৪)	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণী	৪
৫)	বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের আয়/ব্যয়ের তারতম্য বিশ্লেষণ	৫
৬)	আয়-ব্যয় বিবরণী	৬-৭
৭)	গ্যাস বিক্রয়ের বিবরণী	৮
৮)	উপজাত তেল বিক্রয়ের বিবরণী	৯
৯)	গ্রাহকওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণী	১০
১০)	প্রদেয় ভ্যাট এর বিবরণী	১১
১১)	সরকারী কোষাগারে অর্থ জমার বিবরণী	১২
১২)	চলতি মাসের পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের মজুদ বিবরণী	১৩
১৩)	কোম্পানির নগদ তহবিল বিবরণী	১৪
১৪)	চলতি মাসের আয়-ব্যয় এবং বকেয়া পাওনার বিশ্লেষণ বিবরণী	১৫
১৫)	কোম্পানির মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী	১৬
১৬)	কোম্পানির বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী	১৭
১৭)	কোম্পানির উৎপাদন ও বিক্রয়ের তুলনামূলক চিত্র	১৮-১৯
১৮)	কোম্পানির চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ও চিত্র	২০-৩০
১৯)	উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট	৩১
২০)	কোম্পানির গ্রেডভিত্তিক জনবলের পরিসংখ্যান	৩২

উৎপাদন পরিসংখ্যান (ফিল্ড/ছাপনা ভিত্তিক)

প্রতিবেদন মাস : আগস্ট ২০২৫

[illegible]

কোম্পানির সামগ্রিক উৎপাদন পরিসংখ্যান

গ্যাস : এম এম এস সি এম, পানি ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : লিটার										
গ্যাস ক্ষেত্র/ স্থাপনা	বিদ্যমান কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উপাদান	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লজ্যমালা (২০২৫-২০২৬)	বিগত মাস (জুলাই ২০২৫)	চলতি মাস (আগস্ট ২০২৫)	বিগত বৎসরের (২০২৪-২০২৫) মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত (২০২৫-২০২৬)	শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত
সিলেট, কৈলাশটিলা, এমএসটিই প্লান্ট অপারেশন, রশিদপুর, বিয়ানীবাজার, ছাতক, রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্ট, ৪০০০ বিপিডি কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্ট, ৩০০০ বিপিডি ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট ও কৈলাশটিলা এলপিগিজ প্লান্ট	২৬ টি	১৬ টি	গ্যাস	৩.৬৩০৯	১,২২১.৫৪৪৬	১২০.৮৫৫৫	১১৬.৯৬৬৬	১,৩৯২.০০০৬	২২২.৬৩২২	৫৬৬.৬৬৬৬
			পানি	--	--	১২,৩৬৪,২১৩	৫,৩৪২,৭৫৩	১৩৩,০৭০,৭৮৬	৬৬৬.৯৬৬৬	১,৩৯২,৭৫৩
			অপ: তৈল	--	--	--	--	--	--	০৩৬.৯৬৬৬
			অকটেন	২৩৮.৪৮২	৭৮,৬৯৯,০০০	১৬৬,৭৩৩	১৩৩,০৭০,৭৮৬	৬৬৬.৯৬৬৬	১,৩৯২,৭৫৩	
			মটর স্পিরিট RON 81	৫৫০,৭৭২	১৮১,৭৫৪,৯৬২	২১,১২৮,৫২০	১৬০,৭৩৩	২৩৩,০৭০,৭৮৬	৬৬৬.৯৬৬৬	১,৩৯২,৭৫৩
			ডিজেল	২৩,৫৭১	৭,৭৭৮,০০০	১,০৭১,৫৬৬	৮৪৮,৭৩৩	১৩৩,০৭০,৭৮৬	৬৬৬.৯৬৬৬	১,৩৯২,৭৫৩
			কেরোসিন	৩২,১৩৩	১০,৬০৪,০০০	১,০৭১,৫৬৬	৮৪৮,৭৩৩	১৩৩,০৭০,৭৮৬	৬৬৬.৯৬৬৬	১,৩৯২,৭৫৩
			কনডেনসেট	৭২,৩০৩	২৩,৮৫৯,৯৬৬	২,৯০২,২২২	২৩৮,৭৩৩	১৩৩,০৭০,৭৮৬	৬৬৬.৯৬৬৬	১,৩৯২,৭৫৩
			এনজিএল	৪৩,৬১৩	১১,৭৭৮,০০০	১,০৭১,৫৬৬	৮৪৮,৭৩৩	১৩৩,০৭০,৭৮৬	৬৬৬.৯৬৬৬	১,৩৯২,৭৫৩
			মটর স্পিরিট RON 89	৩৫৬,১৩০	১১,৭৭৮,০০০	১,০৭১,৫৬৬	৮৪৮,৭৩৩	১৩৩,০৭০,৭৮৬	৬৬৬.৯৬৬৬	১,৩৯২,৭৫৩
			লাইট ন্যাক্সা	১৪৫,৪৭৩	৪৮,০০৬,০০০	৪,৮০৬,০০০	৪৮০,৬০৬	৪৮,০০৬,০০০	৪৮০,৬০৬	
			রিফর্মিং ইউনিট	৩১০,০২৪	১০২,০০৬,০০০	১০,২০৬,০০০	১০২,০০৬	১০,২০৬,০০০	১০২,০০৬	
			সুপার লাইট কনডেনসেট	--	--	--	--	--	--	
			এলপিগিজ	১১,৮৪৫	৩,৯০৬,০০০	৩,৯০৬,০০০	৩,৯০৬	৩,৯০৬,০০০	৩,৯০৬	

[Signature]

[Signature]

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণী

গ্যাস : এমএমএসসিএম, পেট্রোলিয়াম পণ্যাদি : লিটার									
ক্রমিক	উপাদান	চলতি মাস (আগস্ট ২০২৫)	বিগত মাস (জুলাই ২০২৫)	বৈশি/ কম শতকরা হার (৩ - ৪)	বিগত বৎসরের আগস্ট ২০২৪ মাস	বৈশি/ কম শতকরা হার (৩ - ৬)	মন্তব্য		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮		
ক)	গ্যাস	১১৬.৯৬৬	১২০.৮৫৫	-৩.৮৮%	১১৪.৯৮৭	১.৯৮০	সিলেট-১০নং কুপ হতে গ্যাস উৎপাদন হাস এবং ওয়ার্কওয়ার্ড কার্জের জন্য রশিদপূর-৩নং কুপের গ্যাস উৎপাদন বন্ধ থাকায় চলতি মাসের গ্যাস উৎপাদন হাস পেয়েছে।		
খ)	কনডেনসেট	২,৮৪৮,৩২০	২,৯০২,২৪৯	-৫৩.৯২%	৩,০০৬,৮৩১	-১৫৮.৫১১	হরিশপুর এবং রশিদপুর ফিল্ডে কনডেনসেট উৎপাদন হাস হওয়ায় কারণে কনডেনসেট উৎপাদন হাস পেয়েছে।		
গ)	এনজিএল	১,৮২৬,০০০	১,৭৮০,০০০	৪৬.০০%	১,৫১১,০০০	৩১৫,০০০	এমএসটিই প্লাটে কনডেনসেট উৎপাদন হাস পাওয়ার কারণে এনজিএল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।		
ঘ)	মটর স্পিরিট RON 81	২২,৩৯৮,০৬১	২১,১২৮,৫২০	৬.০১%	১৮,২১৬,৮৭৭	৪,১৮১,১৮৪	আরসিএফপি এবং ৪০০০ বিপিডি সিএফপি প্লাটে গত মাসের তুলনায় কনডেনসেট প্রসেস বেশি হওয়ায় কারণে চলতি মাসের মটর স্পিরিট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।		
ঙ)	ডিজেল	৮৮৫,৪৪৩	১,০৭১,৮১০	-১৭.৩৯%	৭৮৪,১৫২	১০১,২৯১	আরসিএফপি এবং ৪০০০ বিপিডি সিএফপি প্লাটে গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে কনডেনসেটের গুনগতমান লাইট হওয়ায় কারণে ডিজেল উৎপাদন হাস পেয়েছে।		
চ)	কেরোসিন	৯৯১,৭৪৮	৯৭১,৫৬৪	২.০৮%	১,০৭৮,৭৪৫	-৮৬,৯৯৭	চলতি মাসে কনডেনসেটের গুনগতমান লাইট হওয়ায় আরসিএফপি-তে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে কেরোসিন উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।		
ছ)	পেট্রোল (রন ৮৯)	১৫,০৬২,৯০৬	১৮,০২২,৭১৩	(২,৯৫৯,৮০৭)	১০,৩৭১,০৩৯	৪,৬৯১,৮৬৭	গত মাসের তুলনায় পেট্রোলে চাহিদা কম থাকায় ক্রেডিং কম করার কারণে ৪০০০ বিপিডি সিএফপি-তে পেট্রোল উৎপাদন হাস পেয়েছে।		
জ)	অকটেন	৩,৫৩১,৬৭১	২,২৭৫,১৫৫	৫৫.২৩%	৫,৬৩৩,৭১৯	(২,১০২,০৪৮)	চলতি মাসে চাহিদা বেশি থাকায় ৪০০০ বিপিডি সিএফপি-তে মটর স্পিরিটের সহিত রিফরমেটের ক্রেডিং বেশি করায় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।		
ঝ)	লাইট ন্যাফথা	৪,৬৭৮,৮২৫	৪,৭৫৬,০২৮	(৭৭,২০৩)	৪,৩২৯,৪২৩	৩৪৯,৪০২	চলতি মাসে ক্রেডিং কম হওয়ায় লাইট ন্যাফথা এবং রিফরমেট উৎপাদন হাস পেয়েছে।		
ঞ)	রিফরমেট	৮,৯১৮,৯৮৬	৯,০১২,৬৪৬	(৯৩,৬৬০)	৮,৭৮৪,৫৯১	১৩৪,৩৯৫	।		
ট)	এলপিজি	৬৯৪,৫০৮	৭০৬,২২৬	(১১,৭১৮.০০)	৫২৪,৯৭৩	১৬৯,৫৩৫	গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে কৈলাশটিলা এলপিজি প্লাটে এলপিজি উৎপাদন হাস পেয়েছে।		
ঠ)	সুপার লাইট কনডেনসেট	১,১২৪,৪১৩	১,০৮৩,৬৭৫	৪০.৭৩%	৯৬৮৪৪৪	১৫৫,৪৬৬	চলতি মাসে কৈলাশটিলা এলপিজি প্লাটে এনজিএল প্রসেস বেশি করায় সুপার লাইট কনডেনসেট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।		

[Signature]

- ৩৩ -

[Signature]

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণী

গ্যাস : এমএমএসসিএম, পেট্রোলিয়াম পণ্যাদি : লিটার						
ক্রমিক	বিক্রয়	চলতি মাস (আগস্ট ২০২৫)	বিগত মাস (জুলাই ২০২৫)	বেশী/ কম শতকরা হার (৩ - ৪)	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	
ক)	গ্যাস	১১৫.৫৮০	১১৯.৪৭০	-৩.৮৯০ -৩.২৬%	চলতি মাসে বিগত মাসের তুলনায় গ্যাস উৎপাদন কম হওয়ায় বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।	
খ)	কনডেনসেট	৮১০.০০০	১,০৮০.০০০	-২৭০.০০০ -২৫.০০%	চলতি মাসে চাহিদা কম থাকায় কনডেনসেট বিক্রয় গত মাসের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।	
ঘ)	মটর স্পিরিট RON 89	১৪,২২৭,২৯০	১৬,৬০৭,৩৬০	-২,৩৮০,০৭০ -১৪.৩৩%	গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে চাহিদা কম থাকায় মটরস্পিরিট বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।	
ঙ)	ডিজেল	১,০২২,১৫০	১,২১০,৪১০	-১৮৮,২৬০ -১৫.৫৫%	গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে ডিজেলের চাহিদা কম থাকায় বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।	
চ)	কেরোসিন	৭২০,২৯০	৭৫৯,৯৮০	-৩৯,৬৯০ -৫.২২%	গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে কেরোসিনের চাহিদা কম থাকায় বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।	
ছ)	অকটেন	২,৭৮৬,৯৩০	২,২৫৭,১১০	৫২৯৮২০ ২৩.৪৭%	চাহিদা বেশী থাকায় গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে অকটেন বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে	
জ)	এলপিগিজ	৭২২,৮৬০	৭০৮,১৯০	১৪৬৭০.০০ ২%	চলতি মাসে এলপিগিজ বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।	

Signature

— ০৪ —

Signature

বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের আয়/ব্যয়ের তারতম্য বিশ্লেষণ

(কোটি টকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস	চলতি মাস	হ্রাস/বৃদ্ধি	হ্রাস/বৃদ্ধি
		জুলাই ২০২৫	আগস্ট ২০২৫		
১	গ্যাস বিক্রয়	৩৮.২২	৩৯.৩৮	১.১৬	গ্যাস বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
২	উপজাত তেল বিক্রয়	১৮৩.৯৬	১৬৫.৪১	-১৮.৫৫	উপজাত তেল বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।
৩	অপরিশোধিত তেল বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	অপরিশোধিত তেল বিক্রয় অপরিবর্তিত আছে
৪	ভ্যাট				
	গ্যাস	২৬.২৯	২৭.৮৪	১.৫৫	ভ্যাট বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫	উপজাত তেল	২৪.১৭	২১.৬৯	-২.৪৮	ভ্যাট হ্রাস পেয়েছে।
	অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয়	১০৪.৮৬	১০৪.১৫	-০.৭১	ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।
৬	আয়কর পূর্ব নীট মুনাফা	৭২.০১	৫৭.০৩	-১৪.৯৮	মুনাফা হ্রাস পেয়েছে।
৭	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা	৪৯.৮১	৫৭.০৭	৭.২৬	জমা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮	বকেয়া পাওনা আদায়	৬৯.৮৪	১৬০.৩১	৯০.৪৭	আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

২/৮

— ০৫ —

২/৮

কোম্পানির আয় - ব্যয় বিবরণী

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস		জুলাই ২০২৫		চলতি মাস		আগস্ট ২০২৫		বিগত বছরের মোট (২০২৪-২০২৫)		চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জীভূত	
		প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট		
ক) বিক্রয়													
১	গ্যাস	৩২.২২	৩৭.৬৩	৩৭.৬৩	৩৭.৬৩	৩৭.৬৩	৩৭.৬৩	৩৭.৬৩	৩৭.৬৩	৩৭.৬৩	৩৭.৬৩	৩৭.৬৩	৩৭.৬৩
২	অকটেন	৩৭.০২	২৩.০৬	২৩.০৬	২৩.০৬	২৩.০৬	২৩.০৬	২৩.০৬	২৩.০৬	২৩.০৬	২৩.০৬	২৩.০৬	২৩.০৬
২	মটর স্পিরিট	৩৬.১৪	৩৭.৩৭	৩৭.৩৭	৩৭.৩৭	৩৭.৩৭	৩৭.৩৭	৩৭.৩৭	৩৭.৩৭	৩৭.৩৭	৩৭.৩৭	৩৭.৩৭	৩৭.৩৭
৩	ডিজেল	৪৬.৭	২২.২৩	২২.২৩	২২.২৩	২২.২৩	২২.২৩	২২.২৩	২২.২৩	২২.২৩	২২.২৩	২২.২৩	২২.২৩
৪	কেরোসিন	৭১.৬	৩২.৬	৩২.৬	৩২.৬	৩২.৬	৩২.৬	৩২.৬	৩২.৬	৩২.৬	৩২.৬	৩২.৬	৩২.৬
৫	কনডেনসেট	১৬.৫	২০.৩৩	২০.৩৩	২০.৩৩	২০.৩৩	২০.৩৩	২০.৩৩	২০.৩৩	২০.৩৩	২০.৩৩	২০.৩৩	২০.৩৩
৬	এন জি এল	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০
৬	এল পি জি	৪৪.০	১০.১	১০.১	১০.১	১০.১	১০.১	১০.১	১০.১	১০.১	১০.১	১০.১	১০.১
৭	মজুদ সময়	৪৪.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০
মোট ১ হতে ৭ পর্যন্ত		২২২.৬২	৩৭১.০২	৩৭১.০২	৩৭১.০২	৩৭১.০২	৩৭১.০২	৩৭১.০২	৩৭১.০২	৩৭১.০২	৩৭১.০২	৩৭১.০২	৩৭১.০২
খ) ব্যয়													
১। সম্পূরক কর ও ভ্যাট													
i	গ্যাস	৭২.৬২	৬১.৬২	৬১.৬২	৬১.৬২	৬১.৬২	৬১.৬২	৬১.৬২	৬১.৬২	৬১.৬২	৬১.৬২	৬১.৬২	৬১.৬২
i	অকটেন	২৬.২	২৬.২	২৬.২	২৬.২	২৬.২	২৬.২	২৬.২	২৬.২	২৬.২	২৬.২	২৬.২	২৬.২
ii	মটর স্পিরিট	৬৪.৭১	১১.১১	১১.১১	১১.১১	১১.১১	১১.১১	১১.১১	১১.১১	১১.১১	১১.১১	১১.১১	১১.১১
iii	ডিজেল	৬২.১	৭৬.০	৭৬.০	৭৬.০	৭৬.০	৭৬.০	৭৬.০	৭৬.০	৭৬.০	৭৬.০	৭৬.০	৭৬.০
iv	কেরোসিন	১৭.০	৪৭.০	৪৭.০	৪৭.০	৪৭.০	৪৭.০	৪৭.০	৪৭.০	৪৭.০	৪৭.০	৪৭.০	৪৭.০
v	কনডেনসেট	১৭.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০
vi	এন জি এল	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০
vii	এল পি জি	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০
মোট সম্পূরক কর ও ভ্যাট		৩০৬.৬৬	৩০৬.৬৬	৩০৬.৬৬	৩০৬.৬৬	৩০৬.৬৬	৩০৬.৬৬	৩০৬.৬৬	৩০৬.৬৬	৩০৬.৬৬	৩০৬.৬৬	৩০৬.৬৬	৩০৬.৬৬

-- ০৬ --

কোম্পানির আয় - ব্যয় বিবরণী

(কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস	জুলাই ২০২৫	আগস্ট ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট (২০২৪-২০২৫)	চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জীভূত
		প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত
২।	কনডেনসেট ক্রয় ব্যয়	৭৪.৮৭	৯৩.৭৬	৭৪.৯১	৯৩.৭৬	৮৩৫.৪৭
৩।	উৎপাদন ব্যয়	১.৪৭	৪.৩৯	১.৪৭	৪.৩৯	৪৬.৮০
৪।	বেতন ও ভাতাদি	৭.৭০	৮.৩৬	৭.৭০	৮.৩৬	৭৭.৪০
৫।	প্রশাসনিক ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬।	সুদ	০.২২	০.১৫	০.২২	০.১৫	০.২২
৭।	অবচয়	৮.২৩	৩.৭৭	৮.২৩	৩.৭৭	০.০০
৮।	ডিপ্লিশন অব ওয়েল কস্ট	১.৪২	১.৬১	১.৪২	১.৬১	০.০০
৯।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩.৬৫	৬.৭৩	৩.৬৫	৬.৭৩	০.০০
১০।	অন্যান্য ব্যয় (পেট্রোলিয়াম পণ্য পরিবহন সহ)	৭.২৯	১২.২১	৭.২৯	১২.২১	০.০০
	মোট ব্যয় 'খ' (১ হতে ১০)	১৫৫.৩১	১৮৭.৫১	১৫৫.৩১	১৮৭.৫১	১১৬.৬০
গ)	পরিচালনা মূল্য	৬৭.৩১	৬৭.৩১	৬৭.৩১	৬৭.৩১	৬৭.৩১
ঘ)	বিবিধ আয়	৮.৪৮	৫.৪৮	৮.৪৮	৫.৪৮	৮.৪৮
ঙ)	আয়কর ও শুল্কভর্তুকি পূর্ব মূল্য	৭৫.৮০	২১.৫০	৭৫.৮০	২১.৫০	৭৫.৮০
চ) কতন সমূহ						
১।	শঃ অঃ ট্রাস্ট	৩.৬৯	১০.০১	৩.৬৯	১০.০১	৩.৬৯
২।	আয়কর	১৯.৮০	৮.১৬	১৯.৮০	৮.১৬	১৯.৮০
৩।	লভাংশ	৩.৬৭	৩.৬৭	৩.৬৭	৩.৬৭	৩.৬৭
	মোট কতন (চ)	২৭.১৬	২১.৮৪	২৭.১৬	২১.৮৪	২৭.১৬
	নীট উদ্ধৃতি (ঙ - চ)	৮৮.১৫	১০.৬৭	৮৮.১৫	১০.৬৭	৮৮.১৫

[Signature]

-০৭-

[Signature]

পরিমাণ : এম এম সি এম,
মূল্য : কোটি টাকায়

পরিমাণ : এম এম সি এম,

মূল্য : কোটি টাকায়

[illegible]

উপজাত তেল বিক্রয় বিবরণী

পরিমাণ : হাজার লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়

ক্রমপঞ্জিকৃত প্রকৃত মাস	উপজাত তেল												ক্রমপঞ্জিকৃত প্রকৃত মাস																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	উপজাত তেল																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	এল পি জি						এল জি এল																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
২০২৪-২৫	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২

১০৩

১০৩

গ্রাহক ওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণী

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	কোম্পানী ও গ্রাহক খাত	কিস্তি মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া	চলতি মাস আগস্ট ২০২৫		চলতি মাসের শেষ তারিখে বকেয়া পাওনা	চলতি বৎসর (২০২৫-২০২৬) ক্রমপঞ্জিত			বকেয়া কত মাসের গড় বিক্রয়	বকেয়া পাওনা কাল	বকেয়া আদায় কাল
			বিক্রয়	আদায়		বিক্রয়	আদায়	পর্যন্ত			
১	তিতাস	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	২০২৫-২০২৬
২	জালালাবাদ	৬৫.১০	২১০৬	০০০	৬১.৬৭	০০০	০০০	২২২৬	০০০	১০৫.৩২	২০২৫-২০২৬
৩	বাখরাবাদ	১১৬.৩৫	০০৬	০০০	১৪৩.৬২	০০০	০০০	৬৫	০০০	১৩৫.৬৪	২০২৫-২০২৬
৪	কর্ণফুলি	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	২০২৫-২০২৬
৫	পশ্চিমাঞ্চল	৪৭.৩২	৬৭৫	০০০	৪২.৩৫	১১.৩৬	০০০	৬৬.১১	০০০	৪২.৩৫	২০২৫-২০২৬
৬	সুন্দরবন	০০০	২৭২	০০০	২৭২	২৭২	০০০	২৭২	০০০	২৭২	২০২৫-২০২৬
৭	জিটিসিএল	৬২.০৬	২৪২	০০০	৫৬.২৬	২৪২	০০০	২৪২	০০০	৫৬.২৬	২০২৫-২০২৬
৮	আরসিজিসিএল	৭০৫	০০০	০০০	৭০৫	০০০	০০০	০০০	০০০	৭০৫	২০২৫-২০২৬
৯	বিপিসি	৩৬০	০০০	০০০	৩৬০	০০০	০০০	০০০	০০০	৩৬০	২০২৫-২০২৬
১০	পদ্মা	২৮৯.৭৬	০৩৯৫	০০০	২৮৯.৭৬	০৩৯৫	০০০	০৩৯৫	০০০	২৮৯.৭৬	২০২৫-২০২৬
১১	মেঘনা	১৫৩.৯৯	৮৩৩৫	০০০	১৫৩.৯৯	৮৩৩৫	০০০	৮৩৩৫	০০০	৮৩৩৫	২০২৫-২০২৬
১২	উপমোটি (ভেল কোং)	৬৪৭.২০	৬০১৬	০০০	৬০১.৬৫	৬০১.৬৫	০০০	৬০১.৬৫	০০০	৬০১.৬৫	২০২৫-২০২৬
১৩	অন্যান্য (সুপার)	০০০	০৬৪	০০০	০০০	০৬৪	০০০	০০০	০০০	০৬৪	২০২৫-২০২৬
১৪	বিজিএফসিএল	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	২০২৫-২০২৬
১৫	এলসি গ্যাস লিঃ	৩২৬	৩৪০	০০০	৩২৬	৩৪০	০০০	৩৪০	০০০	৩৪০	২০২৫-২০২৬
মোট		৩৪৯৪	৭৫৩০২	১০৩৬১	৩৭৩৭৭	৩৭৩৭৭	২২২৬	৩৭৩৭৭	৩৭৩৭৭	৩৭৩৭৭	২০২৫-২০২৬

১০২

১০২

কোম্পানির প্রদেয় ভ্যাট এর বিবরণী

(কোটি টাকায়)

এজেন্সীর নাম	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত দেয় অংক	চলতি মাস আগস্ট ২০২৫		চলতি মাসের শেষ তারিখে ক্রমপুঞ্জিত দেয় অংক	উদ্ধৃতি কাল (এজি)			চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জিত দেয় অংক ২০২৫-২০২৬	চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জিত পরিশোধিত অংক ২০২৫-২০২৬	বিগত বছরের ৩০শে জুন দেয় অংক ২০২৪-২০২৫
		দেয়	পরিশোধিত		জুন ২০২৫	জুলাই ২০২৫	আগস্ট ২০২৫			
হরিপুর ফিল্ড	৭.১২	২.৮৬	৪.২৯	৭৬.৫	৩২.৩	৩৭.২	৬৭.২	৭৬.৫	৭.৪৪	২৫.৩৫
কৈলাশটিলা	০.০১	০.০০	০.০০	১০.০-	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০.০০	০.১৬
এমএসটিই	৭২.৫৮	৪৪.৭	৯.৬৭	৭২.৭২৫	৭৭.২৫	৬৭.২৫	৯৪.৭	০৩.২২	১৭.৬৬	১৪৩.৯৯
রশিদপুর	৮২.৮৬	১২.৭৭	১২.৩১	২৪.২৭-	১২.৭৭	১১.৭	৬২.৭১	৭৭.০২	২৪.১৫	১০৭.০০
বিমানী বাজার	৪.৭৪	৩.৪৫	৩.৯১	৭২.৪	৬৪.৩	৬৩.৩	৩.৪৫	৭৭.৬৬	৭.৯৬	৪৪.৫২
আরসিএফসি	১৭৪.২৬	৩.৩৫	০.৫১	১৭৬.৬৬	৪৬.৪	২৬.২	৩.৩৫	৬০.৬	৪.০৯	৮৭.১৩
৪০০০ বিপিডি	১১১.৯২	১৭.৬৬	২২.৭৫	১০৭.১৫-	০৬.৯৭	২০.৫০	১৭.৬৬	১১.৭৩	৪৫.১৭	১৯২.৬৬
মোট	১১৯.৯২	৪৯.৫৩	৫৩.৫৪	১১৫.৯০	৫০.৬৫	৫০.৪৬	৪৯.৫৩	৯৯.৯৯	১০৩.৩৫	৫৯৪.৬০

[Signature]

— ২২ —

[Signature]

সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা বিবরণী

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণী	বিগত মাস জুলাই ২০২৫	চলতি মাস আগস্ট ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট ২০২৪-২০২৫	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত চলতি	ক্রমপুঞ্জিত
ক) প্রকৃত প্রদান ভিত্তিক :						
১	ভ্যাট	১৭.৯৪	৪১.৩৫	১১২.১৫	১৫.৩০	১০৬.২২
২	আয়কর	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০
৪	কাপ্তানি কর	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০
৫	ডি এস এল	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০
৬	অন্যান্য	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০
মোট প্রদান		১৭.৯৪	৪১.৩৫	১১২.১৫	১৫.৩০	১০৬.২২

খ) গ্র্যাকুয়াস (প্রাথমিক ভিত্তিক)

১	ভ্যাট	৬৪.০৫	৩১.৯৪	১০৬.৯৯	১৫.২৪	৯১.৭৫
২	আয়কর	০৭.৯১	১৭.১১	২৫.০২	০০.০	০০.০
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	৩.৬৬	৬.৩৬	১০.০২	০০.০	০০.০
৪	কাপ্তানি কর	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০
৫	ডি এস এল	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০
৬	অন্যান্য	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০
মোট		৭৫.৬২	৫৬.৪১	১৩২.০৪	১৫.২৪	১১৬.৮০

[Signature]

-২২-

[Signature]

পরিমাণ : হাজার লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়

মূল্য : ৩ কোটি টাকা

[illegible]

কোম্পানির নগদ তহবিল বিবরণী

(কেটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	ক্যাশ ব্যালান্স	ব্যাংক ব্যালান্স				মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালান্স
			চলতি হিসাব	স্বল্প মেয়াদী হিসাব	দীর্ঘ মেয়াদী হিসাব	মোট ব্যাংক ব্যালান্স	
১	চলতি মাসের শেষ তারিখ ৩১-০৮-২০২৫	০.০০২	১.৬৮০	১০২.৭৫৪	১১৪৪.৯৩৩	১২৪৯.৩৬৭	১২৪৯.৩৬৯
২	বিগত মাসের শেষ তারিখ ৩১-০৭-২০২৫	০.০০৫	০.৭৯৮	১২৫.৯০৪	১১৪৪.৬৬৭	১২৭১.৩৭০	১২৭১.৩৭৫
৩	বিগত বছরের শেষ তারিখ ৩০-০৬-২০২৫	০.০০৪	২.১৫০	৪০০.০১২	৯৪৪.৬৫৮	১৩৪৬.৮২০	১৩৪৬.৮২৪

[Signature]

-১৪-

[Signature]

বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের গ্যাস ও উপজাত তেল বিক্রয়

আয়-ব্যয় এবং বকেয়া পাওনার বিশ্লেষণ বিবরণী

ক্রমিক নং	মাস		গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ (এম এম সি এম)	উপজাত তেল বিক্রয়ের পরিমাণ (হাজার লিটার)	আয় (কোটি টাকায়)	ব্যয় (এসডি ভ্যাটসহ) (কোটি টাকায়)	বকেয়া পাওনা (কোটি টাকায়)
১	চলতি মাস	আগস্ট ২০২৫	১১৫.৫৮	২০,২৮৯.৫১	২০৪.৭৯	১৫৩.৬৮	১৭৬৩.৩৩
২	বিগত মাস	জুলাই ২০২৫	১১৯.৪৭	২২,৬২৩.০৫	২২২.১২	১৫৫.৩১	১১১৫.৮৩
৩	কম/বেশী (বিগত মাস হতে চলতি মাস)						
ক)	পরিমাণ		-৩.৮৯	-২৩৩৩.৫৪	-১৭.৩৯	-১.৬৩	৬৪৭.৫০
খ)	পরিমাণ হ্রাস / বৃদ্ধির শতকরা হার (%)		-৩.২৬%	-১০.৩১%	%৭.৮৩	-১.০৫%	৫৮.০৩%
৪	বিগত বছরের আগস্ট ২০২৪		১০৯.১৩	১৭২১১.৯৫	১৭৫.৯৯	১৪২.৫৫	১১৪০.১৪
৫	কম/বেশী (বিগত বছরের চলতি মাস হতে চলতি বছরের চলতি মাস)						
ক)	পরিমাণ		৬.৪৪	৩০৭৭.৫৬	২৭.৭২	১১.১৩	৬২৩.১৯
খ)	পরিমাণ হ্রাস / বৃদ্ধির শতকরা হার (%)		৫.৯১%	১৭.৮৮%	%১৬.৩৬	৭.৮১%	৫৪.৬৬%

(Signature)

- ২০ -

(Signature)

মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

২০২৫-২০২৬ ইং অর্থ বৎসরের বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ: এমএমসিএম,

মূল্য: মিলিয়ন টাকায়

মাস	তিতাস		জালালাবাদ		বাখরাবাদ		কর্ণফুলী		পশ্চিমাঞ্চল		সুন্দরবন		জিটিসিএল		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
জুলাই ২৫	০.০০	০.০০	৬৪.১৯	২৯৯.০৩	৩৮.১৯	১১৯.১৮	০০.০	০০.০	৮১.৮১	৫০.৮১	০০.০	০০.০	০.০০	০.০০	১১৯.৮১	৩৮২.২২
আগস্ট ২৫	০.০০	০.০০	৬০.৩৬	২১০.৯০	২১.৮৬	৭০.৬১	০০.০	০০.০	৮১.৮১	৫৯.৫৯	০৬.৮	২২.৮২	৭.০১	২৪.৫১	১১৫.৫১	৩৯৩.৬৮
সেপ্টেম্বর ২৫															০.০০	০.০০
অক্টো ২৫															০.০০	০.০০
নভে ২৬															০.০০	০.০০
ডিসে ২৫															০.০০	০.০০
জানু ২৬															০.০০	০.০০
ফেব্রু ২৬															০.০০	০.০০
মার্চ ২৬															০.০০	০.০০
এপ্রিল ২৬															০.০০	০.০০
মে ২৬															০.০০	০.০০
জুন ২৬															০.০০	০.০০
সমগ্র																
মোট	০.০০	০.০০	১২৪.৫৫	৪৯৯.৯৩	৫৯.০৫	১৮৯.৮১	০০.০	০০.০	৮১.৮১	৫০.৮১	০৬.৮	২২.৮২	৭.০১	২৪.৫১	২৩৫.০৮	৭৭৬.০৬

[Signature]

[Signature]

—১৬—

বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

২০২৫-২০২৬ ইং অর্থ বৎসরের বিবরণী

মূল্য: মিলিয়ন টাকায়

গ্যাসের পরিমাণঃ এক এক সি এক,








[illegible]

[Signature]

100

Blank

কোম্পানির ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন চিত্র
প্রতিবেদনাধীনঃ আগস্ট ২০২৫

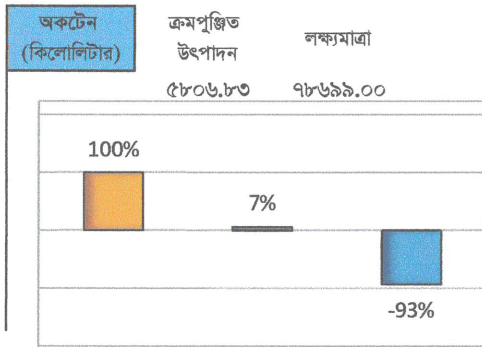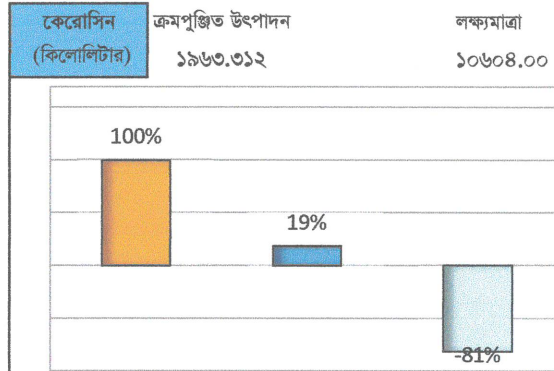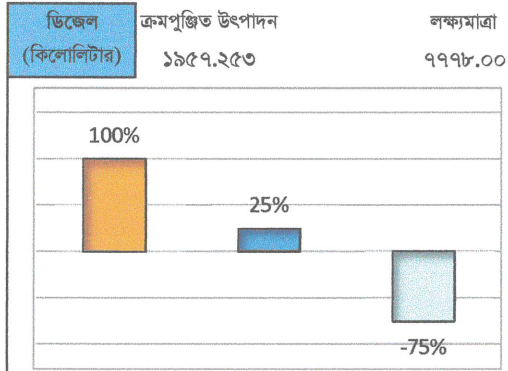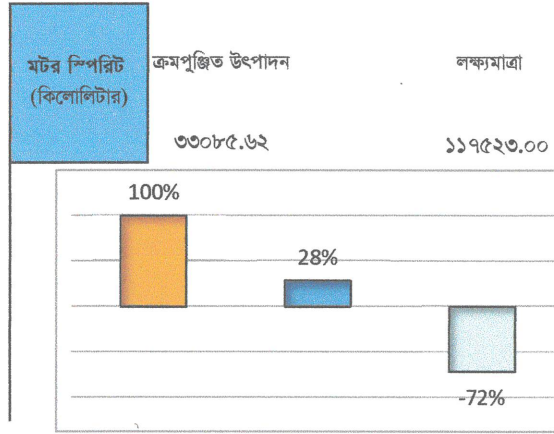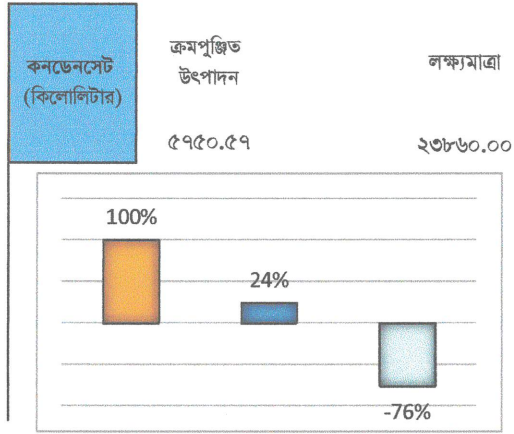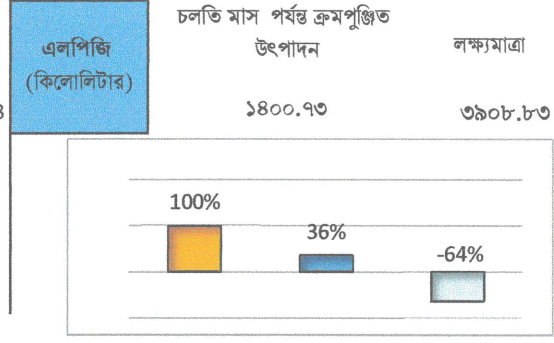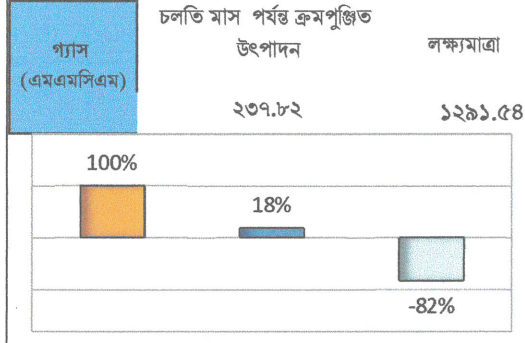

পরিচিতি









লক্ষ্যমাত্রা	
চলতি মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন-	
ঘাটতি (-)/বর্ধিত (+)	

[Signature]

[Signature]

কোম্পানির ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিত বিক্রয় চিত্র

প্রতিবেদনাধীন মাস: আগস্ট ২০২৫

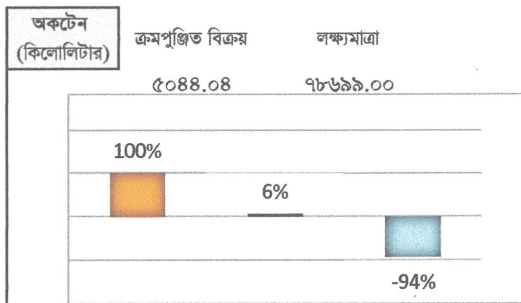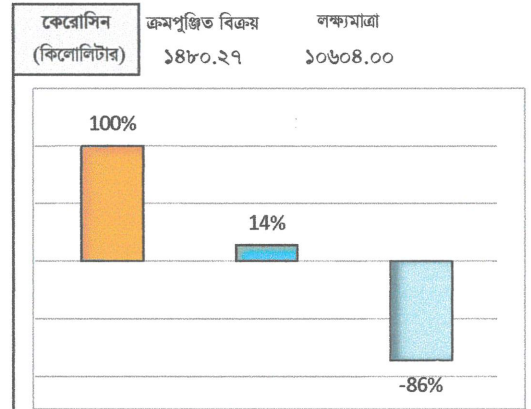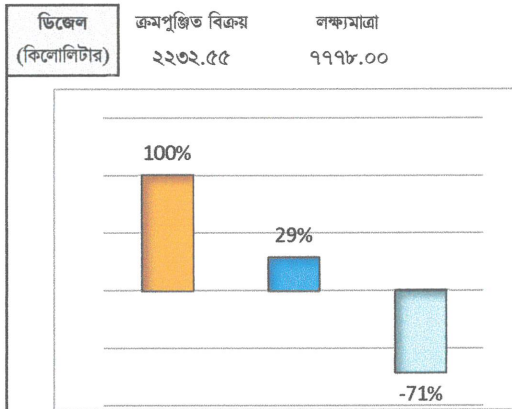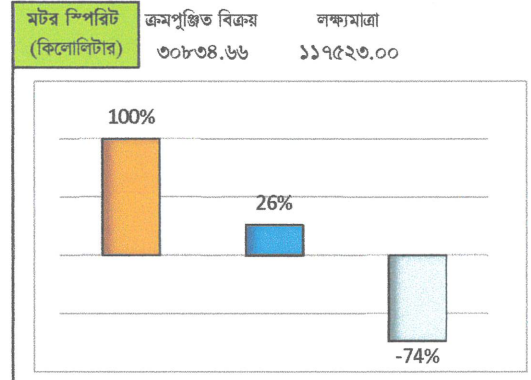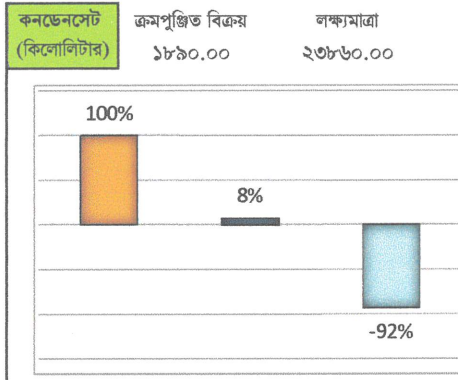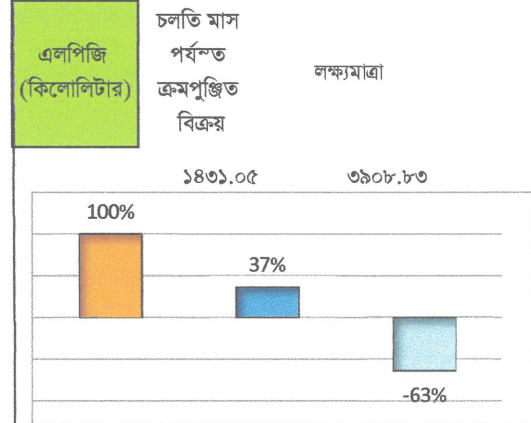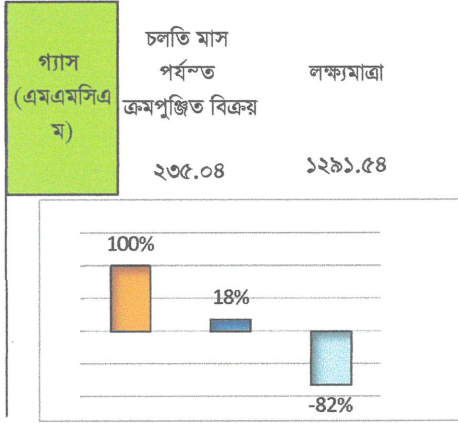

—২৩—

কোম্পানির চলমান প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর আওতায় ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নধীন রয়েছে। উক্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে ২টি নিজস্ব অর্থায়নে, ২টি নিজস্ব ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) এবং ৩টি নিজস্ব ও জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসজিএফএল-এর চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আগষ্ট ২০২৫ মাস পর্যন্ত হালনাগাদ সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

(ক) এ্যাকরেজ ব্লক- ১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প, ১ম সংশোধিত।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	এ্যাকরেজ ব্লক- ১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় গ্যাস রিজার্ভ ও রিসোর্স মূল্যায়নে অধিকতর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ভবিষ্যত গ্যাস চাহিদা মেটাতে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা; এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় (৮৬৫+১২৯=) ৯৯৪ বর্গকিলোমিটার ৩ডি সাইসমিক জরিপ পরিচালনা করা এবং কম-বেশী ৮ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত হাইড্রোকার্বন পে-জোন চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা	:	৭৯৫৭.০০				
		:	বৈদেশিক মুদ্রা	:	৩১৭১০.০০				
		:	মোট	:	৩৯৬৬৭.০০				
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: জুলাই ২০২১ সমাপ্তি: ডিসেম্বর ২০২৫						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৬-০৮-২০২১ এবং আরডিপিপি: ০৪-১১-২০২৪						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের আগষ্ট ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
		৩৬৫২১.৯৩	৯৭%	১২০৪.০০	০.৪৪	১%	৩৬৫২২.৩৭	৯৮%	
৭	আগষ্ট ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৮৬৫ বর্গকিলোমিটার ৩ডি সাইসমিক ডাটা এ্যাকুইজিশন, প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশনসহ প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগের লক্ষ্যে কোম্পানি পরিচালনা পর্যদের অনুমোদনক্রমে BGP Inc, China- এর সাথে ২৯-০৬-২০২২ তারিখে চুক্তি সম্পাদন এবং ১৩-১১-২০২৪ তারিখে চুক্তি সংশোধন করা হয়েছে। এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর প্রকল্প এলাকায় সর্বমোট ৮৬৫ বর্গকিলোমিটার ডাটা এ্যাকুইজিশন, প্রসেসিং, ইন্টারপ্রিটেশন, পেট্রোফিজিক্যাল এনালাইসিস, স্ট্যাটিক ও ডাইনামিক মডেলিং, হাইড্রোকার্বন রিসোর্স এস্টিমেশন, ফিল্ড ডেভলপমেন্ট প্লান এবং ১০টি ড্রিলবেল কুপ লোকেশন চিহ্নিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রসপেক্টসমূহে ১০টি অনুসন্ধান কুপ খননের লোকেশন প্রদান করেছে-তন্মধ্যে ডুপিটলা প্রসপেক্ট-এ ১টি কুপ খননের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া সিলেট সাউথ-১, বাতচিয়া-১ ও হারারগঞ্জ-১ সহ মোট ৩টি কুপ খনন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে-যা অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত প্রসপেক্টসমূহে সর্বমোট ২৫২৯.১৯ বিসিএফ গ্যাস ও ৮৮.৬৪ মিলিয়ন ব্যারেল তেলের রিসোর্স এস্টিমেট করা হয়েছে। প্রকল্পের বর্ধিত কুড়িগাঁও (১২৯ বর্গ কি.মি) এলাকায় ২১-১১-২০২৪ তারিখ হতে সার্ভে, শর্ট-হোল ড্রিলিং ও এক্সপ্লোরেশন লোডিং শুরু করে ০৯-০১-২০২৫ তারিখে ডাটা এ্যাকুইজিশন/রেকর্ডিং সম্পন্ন করা হয়েছে। এ্যাকুইজিশন/রেকর্ডিংকৃত ডাটাসমূহ ডাউনলোড করে প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশনের জন্য চীনে অবস্থিত BGP Inc, China- এর ডাটা সেন্টার এ ১৮-০১-২০২৫ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। ০২-০৬-২০২৫ তারিখে ডাটা প্রসেসিং সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে এ্যাকুইজিশনকৃত ডাটার ইন্টারপ্রিটেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল বর্ধিতকরণ: ২২-০৬-২০২৫ তারিখে জাখসবি কর্তৃক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত অনুমোদিত হয়েছে।						



— ২০ —



(খ) সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন, ১ম সংশোধিত।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট স্ট্রাকচারে নর্দান ক্লোজারে ২৫৭৬ মিটার গভীরতায় একটি অনুসন্ধান কূপ (সিলেট-১০) এবং এ কূপের আওতায় অধিকহারে গ্যাস উত্তোলনের জন্য মূল ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩৩০০ (± ১০০) মিটার গভীরতায় আরো একটি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ (সিলেট-১০এক্স) খনন করা; সিলেট-১০ ও সিলেট-১০এক্স কূপ খনন করত: ১০৬ বিসিএফ গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি এবং প্রথম ৫ বছর দৈনিক প্রায় ৪০ (সিলেট-১০: ২০ ও সিলেট-১০এক্স: ২০) মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছর দৈনিক প্রায় ৩৫ (সিলেট-১০: ২০ ও সিলেট-১০এক্স: ১৫) মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক প্ররণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	স্থানীয় মুদ্রা		:	১৩৯০১.০০			
		বৈদেশিক মুদ্রা		:	৩৭৮০৯.০০			
		মোট		:	৫১৭১০.০০			
৩	বাস্তবায়নকাল	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২১ সমাপ্তি: জুন ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	ডিপিপি: ২৩-১২-২০২১ এবং আরডিপিপি: ২৭-০৫-২০২৪						
৫	অর্থায়নের উৎস	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের আগষ্ট ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
		২৪৫৮৮.৮৮	৭১.০৭%		২৬০০৮.০০	৩৯০.৭১	৩.০৪%	২৪৯৭৯.৫৯
৭	আগষ্ট ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	প্রকল্পের আওতায় ৮.৪৮১ একর জমি অধিগ্রহণ কাজ গত ২২-০৯-২০২২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। খনন ঠিকাদার নিয়োগ: সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্পের আওতায় টার্গ-কি ভিত্তিতে কূপ খনন অপারেশন, মালামাল সরবরাহ, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য সিসিজিপি'র অনুমোদনক্রমে নির্বাচিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান Sinopec International Petroleum Service Corporation, China-এর সাথে ০৭-০৯-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিভূক্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ২৪-০৬-২০২৩ তারিখে খনন কাজ শুরু (স্পাড-ইন) করে ২৫৭৬ মিটার গভীরতায় খনন সমাপ্ত করা হয়েছে। কূপ খনন সম্পন্ন করে ২৬-১১-২০২৩ তারিখে ১ম ডিএসটি চলাকালীন দৈনিক ২২-২৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে ফ্লো এর বিপরীতে ওয়েলহেড প্রেসার ৩২৫০ পিএসআইজি পাওয়া গেছে। উক্ত কূপ হতে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। গত ০২-১২-২০২৩ তারিখে ২২৮৯-২৩০০ মিটার গভীরতার স্তরে ২য় ডিএসটি অপারেশন পরিচালনা করা হলে উক্ত স্তরে গ্যাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়। পরবর্তী ১৩৯৭-১৪৪৫ মিটার জোনে ০৮-১২-২০২৩ তারিখে ৩য় ডিএসটি পরিচালনা করা হয়। উক্ত জোন পরীক্ষাকালে ক্রুড অয়েলের উপস্থিতি জানা যায়। গত ১৮-১২-২০২৩ তারিখে ২২১৮-২২২৩ মিটার গভীরতায় Perforation করে ৪র্থ ডিএসটি করা হলে সেখানেও গ্যাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়। বটম ইন্টারভাল ২৫৪০-২৫৬৫ মিটার জোনের গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যে Well Completion এর কাজ গত ০৭-০২-২০২৪ তারিখে সম্পন্ন হয়। গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ: ১০ কিলোমিটার উচ্চচাপ গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান GasMin Limited, Dhaka এর সাথে ২৮-০৩-২০২৪ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ১০ কিলোমিটার গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন স্থাপন শেষে ২৭-০৪-২০২৫ তারিখে সিলেট-১০ নং কূপ হতে কম-বেশি ১০-১২.৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা হয়। বর্তমানে উক্ত কূপ হতে কম-বেশি দৈনিক ৪-৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে এবং প্রতি মিলিয়ন গ্যাসের সাথে আনুমানিক ১০-১২ ব্যারেল হারে কনডেনসেট পাওয়া যাচ্ছে।						

— ২০ —

	বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: প্রকল্পের আওতায় সিলেট-১০নং কূপ খননে মোট তিনজন বৈদেশিক পরামর্শক প্রকল্প সাইটে কাজ করেছেন। সিলেট-১০এক্স কূপ খনন চলাকালীন সময়ে ৩ ক্যাটাগরিতে বৈদেশিক পরামর্শক সেবা গ্রহণের নিমিত্ত ১২.১২.২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। ১৪-০৭-২০২৫ ও ১৬-০৭-২০২৫ তারিখে ড্রিলিং সুপারভাইজার ও পেট্রোলিয়াম জিওলজিস্ট প্রকল্প সাইটে এসে পৌঁছেছে। বাস্তব কাজ ১৫% সম্পন্ন হয়েছে। সিলেট-১০এক্স নং কূপ: সিলেট-১০নং কূপটি সফলভাবে খননের মাধ্যমে কয়েকটি লেয়ারে গ্যাস ও তেলের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়ায় এ কূপের আওতায় অধিক হারে গ্যাস উত্তোলনের লক্ষ্যে ৩৩০০ (±১০০) মিটার গভীরতায় মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ (সিলেট-১০এক্স) খননের জন্য প্রকল্পের ১ম সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (১ম আরডিপিপি) ২৭-০৫-২০২৪ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে অনুমোদিত হয়েছে। সিলেট-১০এক্স কূপ খননের লক্ষ্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CNPC Chuangeng Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), China এর সাথে ১৯-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CCDC, China কর্তৃক খনন রিগ ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক, খনন মালামাল এবং প্রয়োজনীয় জনবল খনন সাইটে মবিলাইজেশনের জন্য ২৫-০২-২০২৫ তারিখে ঠিকাদারকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CCDC, China-এর অনুকূলে ২৯-০৪-২০২৫ তারিখে Letter of Credit (LC) খোলা হয়েছে। কূপ খনন মালামালের ১ম শিপমেন্ট ২২-০৪-২০২৫ তারিখে এবং ০২-০৫-২০২৫ তারিখে রিগ ও এক্সেসরিজ, মাড কেমিক্যালস, সিমেন্ট এডিটিভস ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ সমূহের মালামাল প্রকল্প সাইটে পৌঁছেছে। সিলেট-১০এক্স নং কূপ খননের জন্য প্রয়োজনীয় রিগ ফাউন্ডেশন মডিফিকেশন-এর কাজ নির্বাচিত স্থানীয় ঠিকাদার মেসার্স বেলাল এন্টারপ্রাইজ এর মাধ্যমে ১৭-০৬-২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে এবং ২২-০৬-২০২৫ তারিখে সিসিডিসি, চায়না-কে প্রকল্প সাইট হস্তান্তর করা হয়েছে। ২৫-০৬-২০২৫ তারিখ থেকে হাইড্রলিক রোটরি বোরিং রিগ মেশিনের মাধ্যমে ৩৬ ইঞ্চি হোল শুরু করা হয় এবং ৩০ মিটার পর্যন্ত ৩০ ইঞ্চি কন্ডাকটর কেসিং স্থাপন ও সিমেন্টেশনের কাজ ০২-০৭-২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। সিলেট-১০এক্স নং কূপ খননের লক্ষ্যে ১৩-০৭-২০২৫ তারিখে রিগ-আপ করা হয়েছে। রিগ-আপ পরবর্তী প্রয়োজনীয় পরীক্ষণ শেষে ২৭-০৭-২০২৫ তারিখে (স্পাড-ইন) ২০ ইঞ্চি কেসিং রান করার জন্য ২৬ ইঞ্চি হোল খনন কার্যক্রম শুরু করা হয়, ০১-০৮-২০২৫ তারিখে ২০ ইঞ্চি কেসিং স্থাপন শেষে ০২-০৮-২০২৫ তারিখে উক্ত সেকশনের সিমেন্টেশন সম্পন্ন হয়েছে। Annular BOP, Blind Ram BOP, Pipe Ram BOP, Kill manifold, Choke manifold, Stand pipe প্রেশার টেস্টসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষণ শেষে ১০-০৮-২০২৫ তারিখ থেকে ১৩ ৩/৮ ইঞ্চি কেসিং রান করার জন্য ১৭ ১/২ ইঞ্চি হোল রান কার্যক্রম শুরু করে ১৬-০৮-২০২৫ তারিখে ১৩৩৪.০০ মিটার পর্যন্ত হোল খনন সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ১৭ ১/২ ইঞ্চি হোল এর ওপেন হোল লগিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল বর্ধিতকরণ: ২২-০৬-২০২৫ তারিখে জাখসবি কর্তৃক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়নকাল অক্টোবর ২০২১ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ অনুমোদিত হয়েছে।
--	---





(গ) সিলেট-১১নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট ও রশিদপুর স্ট্রীকচারে যথাক্রমে ২০০০ (±১০০) মিটার ও ৪২০০ (±১০০) মিটার (TVD) গভীরতায় একটি উন্নয়ন কূপ (সিলেট-১১) ও একটি অনুসন্ধান কূপ (রশিদপুর-১৩) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে সিলেট-১১ ও রশিদপুর- ১৩নং কূপ দুটি হতে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১৬ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।							
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)		স্থানীয় মুদ্রা		:	১৮২৬৭.০০				
			বৈদেশিক মুদ্রা		:	৪১৬৮৩.০০				
			মোট		:	৫৯৯৫০.০০				
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: মার্চ ২০২৪ সমাপ্তি: জুন ২০২৬							
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১৮-০৪-২০২৪							
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ							
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)		জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের আগষ্ট ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
			৪৫৮.০০	১৮.১৯%	৫১৭০.০০	৮১০.১২	৩.৩৯%	১২৬৮.১২	২১.৫৭%	
৭	আগষ্ট ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ভূমি অধিগ্রহণ: সিলেট-১১নং কূপ (উন্নয়ন) খননের জন্য ৩.৯৩১ একর ভূমি অধিগ্রহণ করার লক্ষ্যে ২৪-১১-২০২৪ তারিখে ৪ খারা জারি করা হয়েছে। ৩-১২-২০২৪ তারিখে যৌথ তদন্ত সহ ভূমি ডিমার্কেশন করা হয়েছে। ২২-০৪-২০২৫ তারিখে ৭ খারা নোটিশ জারি করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক, সিলেট ৩.৯৩১ একর ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ মূল্য জানিয়ে ২০-০৮-২০২৫ তারিখে এসজিএফএল বরাবরে পত্র প্রেরণ করেছে। রশিদপুর-১৩নং কূপের জন্য ৯.৭৭৮ একর (কম/বেশি) ভূমি অধিযাচনের নিমিত্ত ভূমি মন্ত্রণালয় ১৭-০৩-২০২৫ তারিখে ২ (দুই) বছরের জন্য অনুমোদন প্রদান করে জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শীঘ্রই জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ৯.৭৭৮ একর ভূমি ২ (দুই) বছরের জন্য অধিযাচন বাবদ মূল্য জানিয়ে এসজিএফএল বরাবরে পত্র প্রেরণ করবে। খনন ঠিকাদার নিয়োগ: Sinopec International Petroleum Service Corporation, China-এর মাধ্যমে টার্গ-কি ভিত্তিতে সিলেট-১১ নং (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩ নং (অনুসন্ধান কূপ) কূপ খননের লক্ষ্যে ১৫-১০-২০২৪ তারিখে এসজিএফএল-এর সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ঠিকাদারের অনুকূলে ০৬-০৪-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। সিলেট-১১নং কূপের বিপরীতে খনন অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় মালামালসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি করতঃ সাইটে পৌঁছেছে। খনন ঠিকাদার কর্তৃক ২১-০৮-২০২৫ তারিখ হতে খননস্থলে রিগ ও অন্যান্য যন্ত্রাদি মবিলাইজ করা শুরু করেছে। রিগ মবিলাইজ সম্পন্ন করতঃ রিগ বিস্তিং, টেস্টিং এবং রিগ-আপ শেষে সেপ্টেম্বর মাসে খনন কাজ শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়। সিলেট-১১নং কূপের ৪৫ মিটার ৩০ ইঞ্চি কেসিং স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত Rich Spread Group Limited, British Virgin Islands এর সাথে ৩১-০৭-২০২৫ তারিখে নেগোশিয়েশন সম্পন্ন করতঃ খসড়া চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজ: সিলেট-১১নং কূপ খনন এলাকায় মাটি ভরাট, মাটি কম্পেকশন/রোলিং ও লেভেলিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পে ১৭-০৫-২০২৫ তারিখ হতে রিগ ফাউন্ডেশন নির্মাণ কাজ এবং ২টি গভীর নলকূপ স্থাপন							

— ২৬ —

		কাজ শুরু হয়েছে। রিগ ফাউন্ডেশন নির্মাণ কাজের মধ্যে ইতোমধ্যে সেলার নির্মাণ, মাড পাম্প বেজ নির্মাণ, জেনারেটর বেজ নির্মাণ, জেনারেটর বেজ নির্মাণ, ব্লি-পাইলিং, ২৮টি RCC Piling এবং ২টি রিগ লেগ নির্মাণসহ রিগ ফাউন্ডেশনের ১০০% কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া ২টি নলকূপ স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সিলেট-১১নং কূপ খনন এলাকায় বর্তমানে ব্রিকস হেরিং বন্ড নির্মাণ কাজ প্রায় ৬০% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় ৩-ফেজ বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন কাজ শেষ হয়েছে। রশিদপুর-১৩নং প্রকল্প এলাকায় ২০-০৮-২০২৫ তারিখ হতে প্রায় ২ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পের গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ: কূপ খনন শেষে ড্রিল স্টিম টেস্ট (ডিসটি) সম্পন্ন করত: গ্যাস প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে সিলেট-১১নং কূপের জন্য ৬ ইঞ্চি ব্যাসের ৪ কিলোমিটার গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ করা হবে। এতদলক্ষ্যে ২৩-০৭-২০২৫ তারিখে জাতীয় দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ২৭-০৮-২০২৫ তারিখে প্রাপ্তব্য দরপ্রস্তাবসমূহ গ্রহণ ও কারিগরি অংশ খোলা হয়েছে। ইআইএ/আইইই, ডিওআই ক্লিয়ারেন্স/পরিবেশ ছাড়পত্র: প্রকল্পের অনুকূলে ১৪-০১-২০২৫ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে সাইট ক্লিয়ারেন্স পাওয়া গিয়াছে।
--	--	--

(ঘ) কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২নং কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্প।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২নং কূপসমূহকে পুনরায় গ্যাস উৎপাদন আনয়ন: সংশ্লিষ্ট কূপের টার্গেটেড স্যান্ডসমূহে মজুদকৃত ৭১২ বিসিএফ গ্যাসের মধ্যে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে (কৈলাশটিলা-১: ৫, রশিদপুর-৩: ১০ ও বিয়ানীবাজার-২: ৮) এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে (কৈলাশটিলা-১: ৫, রশিদপুর-৩: ৭ ও বিয়ানীবাজার-২: ৬) অর্থাৎ মোট ৭১.৭৫ বিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করে দেশের জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।							
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা : ১৬১২৯.০০ বৈদেশিক মুদ্রা : ৬২৬৬.০০ মোট : ২২৩৯৫.০০							
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: জানুয়ারি ২০২৫ সমাপ্তি: জুন ২০২৬							
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১১-১২-২০২৪							
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ							
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
			৭৫.০০	৮.২০%	১২০৮০.০০	৩১১.০১	১০.৪৬%	৩৮৬.০১	১৮.৬৬%	
৭	আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	মালামাল ক্রয়/সংগ্রহ: প্রকল্পের ওয়ার্কওভার বাপেক্স-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এসজিএফএল এবং বাপেক্স-এর মধ্যে ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত চুক্তি মোতাবেক ওয়ার্কওভার কাজে প্রয়োজনীয় সকল মালামাল বাপেক্স কর্তৃক প্রদান করা হবে। বৈদেশিক পরামর্শ সেবা: বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে ইওআই এর বিপরীতে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান বরাবর প্রেরিত আরএফপি দলিলসমূহ ২৯-০৬-২০২৫ তারিখে উন্মুক্ত করতঃ মূল্যায়ন কাজ ২২-০৭-২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। ২৭-০৭-২০২৫ তারিখে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রস্তাব খোলা হয়েছে। বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানকে এসজিএফএল-এর বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ১২-০৮-২০২৫ তারিখে NOA জারী করা হয়েছে। নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক							

— ২৪ —

		পারফরমেন্স সিকিউরিটি জমা প্রদান করা হয়েছে। ইআইএ সম্পাদন: প্রকল্পের অনুকূলে ৩১-০৭-২০২৫ তারিখে সাইট ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পাওয়া গিয়েছে। থার্ড পার্টি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস: থার্ড পার্টি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস সংগ্রহের লক্ষ্যে ০৩-০৬-২০২৫ তারিখে NOA জারি করা হয়েছে এবং সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। ২৩-০৭-২০২৫ তারিখে রশিদপুর-৩নং কূপের জন্য ওয়ারারলাইন লগিং এবং ০৩-০৮-২০২৫ তারিখে ডিএসটি সার্ভিস মোবাইলাইজেশনের করার জন্য পত্র প্রদান করা হয়েছে। এলসি খোলার কাজ চলমান আছে। ওয়ার্কওভার অপারেশন সেবা ও মালামাল: প্রকল্পের ওয়ার্কওভার অপারেশন কাজ সম্পন্ন করার জন্য এসজিএফএল এবং বাপেক্স-এর মধ্যে ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক ওয়ার্কওভার অপারেশন এবং কতিপয় তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা (মোড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস, সিমেন্ট ও সিমেন্ট এডিটিভসসহ সিমেন্টেশন সার্ভিসেস, সারফেস প্রোডাকশন টেস্টিং সার্ভিসেস এবং স্লিকলাইন ইউনিট ভাড়া) এবং প্রয়োজনীয় মালামাল বাপেক্স কর্তৃক সরবরাহ করা হবে। রশিদপুর-৩নং কূপের টিউবিং পুল আউট, ড্রিল স্ট্রিং রান এবং স্ক্যাপার রান সম্পন্ন করতঃ লগিং সম্পন্ন হয়েছে। সিমেন্ট স্কুইজিং-এর কাজ শেষ করে প্রথম ডিএসটি সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে দ্বিতীয় ডিএসটির কাজ চলমান রয়েছে। কৈলাশটিলা-১নং কূপের রিগ আপের কাজ ০৪-০৮-২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। ওয়েল কীল করে টিউবিং পুল আউটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে প্যাকার মিলিং-এর কাজ চলমান রয়েছে। বিয়ানীবাজার-২নং কূপের রিগ মোবাইলাইজেশনের জন্য ১৫-০৭-২০২৫ তারিখে বাপেক্স বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। রিগ ফাউন্ডেশন মডিফিকেশন: প্রকল্পের রশিদপুর-৩, কৈলাশটিলা-১ এবং বিয়ানীবাজার-২নং কূপের রিগ ফাউন্ডেশন মডিফিকেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
--	--	--

(ঙ) ডুপিটলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডুপিটলা ও কৈলাশটিলা স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ৩৪৬০ (±১০০) মিটার ও ৩৬০০ (±১০০) মিটার (TVD) গভীরতায় দু'টি অনুসন্ধান কূপ (ডুপিটলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে ডুপিটলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ দুটি হতে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে অর্থাৎ ১০ বছরে মোট ৫৬ বিসিএফ গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)		স্থানীয় মুদ্রা		:	১৯৯১২.০০			
		বৈদেশিক মুদ্রা		:	৪৪৭৩৬.০০				
		মোট		:	৬৪৬৪৮.০০				
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২৪ সমাপ্তি: সেপ্টেম্বর ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৭-০১-২০২৫						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
				১০.০০	৫.৩৬%	১৬৮৮৭.০০	৭.৬৬	০.৯৬%	১৭.৬৬

— ২৫ —

৭	আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	পরিবেশের অবস্থানগত ছাড়পত্র: কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খননের লক্ষ্যে ০৯-০৪-২০২৪ তারিখে এবং ডুপিটিলা-১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খননের লক্ষ্যে ১১-০৭-২০২৪ তারিখে পরিবেশের অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়। ভূমি অধিগ্রহণ: কৈলাশটিলা-৯নং কূপের খননস্থল উন্নয়ন ও সংযোগ রাস্তা নির্মাণের জন্য ৬.০৩৫ একর ভূমি হকুমদখলে লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট ২০-০৩-২০২৫ তারিখে কৈলাশটিলা-৯নং কূপের ভূমি হকুমদখলের সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করেছে এবং ২৯-০৪-২০২৫ তারিখে কৈলাশটিলা-৯নং কূপের ভূমি হকুমদখলের বিষয়ে জেলা ভূমি অধিগ্রহণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৮-০৬-২০২৫ তারিখে জেলা ভূমি অধিগ্রহণ কমিটির সভায় কৈলাশটিলা-৯নং কূপের ভূমি হকুমদখল প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট হতে কৈলাশটিলা-৯নং কূপের জন্য সৃজিত এলএ মামলা নম্বর ০১/২০২৪-২৫ এর হালনাগাদ রেকর্ড সরবরাহের নিমিত্ত সহকারী কমিশনার (ভূমি), গোলাপগঞ্জ, সিলেট-এ ১৩-০৭-২০২৫ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ডুপিটিলা-১নং কূপের খননস্থল উন্নয়ন ও সংযোগ রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যে ৭.৮২৩ একর ভূমি হকুমদখলের জন্য ৩০-০৪-২০২৫ তারিখে ডুপিটিলা-১নং কূপের ভূমি হকুমদখলের সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করেছে এবং ১৮-০৬-২০২৫ তারিখে ডুপিটিলা-১নং কূপের ভূমি হকুমদখলের বিষয়ে জেলা ভূমি অধিগ্রহণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠিত জেলা ভূমি অধিগ্রহণ কমিটির সভায় প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক রাস্তার জমি পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে অধিগ্রহণ করার শর্তে ডুপিটিলা-১নং কূপের ভূমি হকুমদখল প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট হতে ডুপিটিলা-১নং কূপের জন্য সৃজিত এলএ মামলা নম্বর ০২/২০২৪-২৫ এর হালনাগাদ রেকর্ড সরবরাহের নিমিত্ত সহকারী কমিশনার (ভূমি), জৈন্তাপুর, সিলেট-এ ১৩-০৭-২০২৫ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। খনন ঠিকাদার নিয়োগ: “রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন” এবং “ডুপিটিলা-১নং কূপ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন” শীর্ষক প্রকল্পসমূহের আওতায় উল্লেখিত কূপসমূহ খননের লক্ষ্যে Turn-key ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে ১৫-০২-২০২৫ তারিখে খসড়া চুক্তিপত্রের ওপর আইনি মতামতের জন্য আইন বিশেষজ্ঞ-এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও কারিগরি মূল্যায়নে উত্তীর্ণ দু’টি দরদাতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আর্থিক মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য ও সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC)-এর সাথে ২৭-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০-০৫-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ: “সিলেট-১২ নং কূপ (তেল কূপ) খনন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় তেল কূপটি খননের লক্ষ্যে দরপত্র প্রণয়নের কাজে ড্রিলিং সুপারভাইজার ক্যাটাগরীতে এবং “সিলেট-১২ নং কূপ (তেল কূপ) খনন”, “সিলেট-১১ নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন” ও “ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন” শীর্ষক প্রকল্পসমূহের আওতায় ৫টি কূপ খনন কাজে বৈদেশিক পরামর্শক [(খনন সুপারভাইজার, পেট্রোলিয়াম জিওলজিস্ট এবং পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার (কমপ্লিশন)] সেবা গ্রহণের নিমিত্ত আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে আগ্রহী আবেদনকারীদের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়নের নিমিত্ত প্রণীত আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ সম্বলিত Request for Expression of Interest (REOI) ০৯-০১-২০২৫ তারিখে চারটি দৈনিক পত্রিকা এবং এসজিএফএল, পেট্রোবাংলা ও বিপিপিএ-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত REOI এর বিপরীতে ৩০-০১-২০২৫ তারিখে মোট ০৯(নয়)টি EOI পাওয়া যায়। EOI মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও প্রণীত RFP Document ১৫-০৩-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির বোর্ড সভায় অনুমোদিত হলে কমিটির মূল্যায়নে Shortlisted ০৬(ছয়)টি প্রতিষ্ঠানের নিকট ১৮-০৩-২০২৫ তারিখে RFP Document প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরিত RFP Document অনুযায়ী ২৯-০৪-২০২৫ তারিখে দাখিল ও উন্মুক্ত করা হলে ৩টি দরপ্রস্তাব পাওয়া যায়, যার মূল্যায়ন কাজ শেষ হয়েছে। কারিগরি মূল্যায়নে উত্তীর্ণ ০৩টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রস্তাব ২৯-০৬-২০২৫ তারিখে খোলা হয়েছে এবং ৩০-০৬-২০২৫ তারিখে আর্থিক
---	-----------------------------------	--

— ২৬ —

		মূল্যায়ন শেষ করা হয়েছে। চুক্তি সম্পাদনের জন্য ২৩-০৭-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালক পর্ষদের অনুমোদন নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত Rich Spread Group Limited, British Virgin Islands এর সাথে ৩১-০৭-২০২৫ তারিখে নেগোশিয়েশন সম্পন্ন করতঃ ১৯-০৮-২০২৫ তারিখে খসড়া চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।
--	--	---

(চ) রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রশিদপুর স্ট্রাকচারে ২৯০০ (±১০০) মিটার গভীরতায় একটি অনুসন্ধান কূপ (রশিদপুর-১১) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে ২৯.৪৯ বিসিএফ গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি করা এবং প্রথম ৩ বছরে দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।																											
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মূল্য : ৭৫১৮.০০ বৈদেশিক মূল্য : ১৯৬৬৯.০০ মোট : ২৭১৮৭.০০																											
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২৪ সমাপ্তি: জুন ২০২৬																											
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১৪-০১-২০২৫																											
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি																											
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	<table><tr><th colspan="2">জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন</th><th rowspan="2">এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)</th><th colspan="2">২০২৫-২৬ অর্থ-বছরের আগষ্ট ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি</th><th colspan="2">প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি</th></tr><tr><th>আর্থিক</th><th>বাস্তব</th><th>আর্থিক</th><th>বাস্তব</th><th>আর্থিক</th><th>বাস্তব</th></tr><tr><td>৩১.০০</td><td>০.১৩%</td><td>৮৩৮৪.০০</td><td>৭.০১</td><td>১৫.৩২%</td><td>৩৮.০১</td><td>১৫.৪৫%</td></tr></table>								জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ-বছরের আগষ্ট ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	৩১.০০	০.১৩%	৮৩৮৪.০০	৭.০১	১৫.৩২%	৩৮.০১	১৫.৪৫%
জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ-বছরের আগষ্ট ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি																									
আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব																								
৩১.০০	০.১৩%	৮৩৮৪.০০	৭.০১	১৫.৩২%	৩৮.০১	১৫.৪৫%																								
৭	আগষ্ট ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ভূমি অধিগ্রহণ: প্রকল্পের কাজে ৮.৩৮৭ একর ভূমি অধিযাচনের লক্ষ্যে অধিযাচন সংক্রান্ত সকল নথি ২৭-০২-২০২৫ তারিখে জেলা প্রশাসক হবিগঞ্জের এলএ শাখা কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ২৩-০৩-২০২৫ তারিখে ভূমি মালিকদের পাওনা অর্থ পরিশোধের শর্তে ২ বছরের জন্য হুকুম দখলের নিমিত্তে অনুমোদন পাওয়া যায়। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ২৩-০৪-২০২৫ তারিখে এল শাখার সার্ভেয়ার কর্তৃক নির্ধারিত ভূমির সীমানা ২ (দুই) বছরের জন্য বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন ও পূত নির্মাণ কাজ: প্রকল্পে ২৯-০৫-২০২৫ তারিখ থেকে ভূমি উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। চলতি বর্ষা মৌসুমে প্রকল্প এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার কারনে ভূমি উন্নয়ন কাজ কিছুটা ব্যাহত হয়। বর্তমানে ভূমি উন্নয়নের কাজ ৮৫% সম্পন্ন হয়েছে। প্রায় ১০০০ মিটার এইচবিবি রোড নির্মাণ শেষ হয়েছে। তাছাড়া, কাল-ভার্ট নির্মাণ, মাঠের চারপাশে সারফেস ড্রেইন ও ফেলিং নির্মাণ, মাড-পিট খনন ইত্যাদি কাজ চলমান আছে। খনন ঠিকাদার নিয়োগ: “রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন” এবং “ডুপিটিলা-১নং কূপ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন” শীর্ষক প্রকল্পসমূহের আওতায় উল্লেখিত কূপসমূহ খননের লক্ষ্যে Turn-key ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে ১৫-০২-২০২৫ তারিখে খসড়া চুক্তিপত্রের ওপর আইনি মতামতের জন্য আইন বিশেষজ্ঞ-এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও কারিগরি মূল্যায়নে উত্তীর্ণ দু’টি দরদাতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আর্থিক মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য ও সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান CNPC Chuangqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC)-এর সাথে ২৭-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০-০৫-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে।																											

— ২৭ —

		বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত Rich Spread Group Limited, China এর সাথে ৭-১১-২০২১ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তির মেয়াদ ৩১-১২-২০২৫ তারিখে উত্তীর্ণ হবে। তাই ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সংশোধন করে মেয়াদ ৩০-০৬-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইআইএ/আইইই, ডিওআই ক্লিয়ারেন্স/পরিবেশ ছাড়পত্র: পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের অনুকূলে ১১/০৬/২০২৪ তারিখে এক বছরের জন্য Site Clearance ছাড়পত্র পাওয়া গেছে, যার মেয়াদ ১১-০৬-২০২৫ তারিখে উত্তীর্ণ হয়েছে। পরিবেশ ছাড়পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য ২৯-০৪-২০২৫ তারিখে পুনরায় আবেদন করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের অনুকূলে ইস্যুকৃত Site Clearance এর মেয়াদ ১০/০৬/২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।
--	--	---

(ছ) সিলেট-১২ নং কুপ খনন (তেল কুপ)।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	তেল উৎপাদনের লক্ষ্যে সিলেট স্ট্রাকচারের নর্দান ক্রোজারে ২৪৯১ (± ৫০) মিটার গভীরতায় ২৪ মাসে একটি তেল কূপ (সিলেট-১২) খনন করা; সিলেট-১২নং তেল কূপ খনন করত: ১০ বছর দৈনিক প্রায় ৮০০ ব্যারেল হারে তেল উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)		স্থানীয় মুদ্রা		:	৫৭৪৩.০০			
			বৈদেশিক মুদ্রা		:	১৯৭৮২.০০			
			মোট		:	২৫৫২৫.০০			
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: জানুয়ারি ২০২৫ সমাপ্তি: ডিসেম্বর ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২২-০২-২০২৫						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)		জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
			-	৬.০৭%	২১৪.০০	১৫.২২	২.০৫%	১৫.২২	৮.১২%
৭	আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	বৈদেশিক পরামর্শক সেবা : তিন ক্যাটাগরিার বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে কিউসিবিএস পদ্ধতিতে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ২৪-০৬-২০২৫ তারিখে এসজিএফএল বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ২৯-০৬-২০২৫ তারিখে আর্থিক প্রস্তাব খোলা হয়েছে এবং ৩০-০৬-২০২৫ তারিখে আর্থিক মূল্যায়ন শেষ হয়েছে। চুক্তি সম্পাদনের জন্য ২৩-০৭-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এসজিএফএল-এর পরিচালক পর্যদের অনুমোদন পাওয়া যায়। প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত Rich Spread Group Limited, British Virgin Islands এর সাথে ৩১-০৭-২০২৫ তারিখে নেগোশিয়েশন সম্পন্ন করতঃ ১৯-০৮-২০২৫ তারিখে খসড়া চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ: প্রকল্পের আওতায় ২.০০ (দুই) একর ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসমূহ প্রস্তুত করা হয় এবং প্রকল্প অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ প্রাপ্তির সাথে সাথেই ২৩-০২-২০২৫ তারিখে পূর্ণাঙ্গ অধিগ্রহণ প্রস্তাব সিলেট ডিসি অফিসে প্রেরণ করা হয়। পেট্রোবাংলার ১০০টি কূপ খনন সংক্রান্ত কমিটির সিদ্ধান্ত/ সুপারিশ এর প্রেক্ষিতে বাপেক্স এর সহায়তায় রিভিউতে হালনাগাদকৃত প্রস্তাবিত ১ লোকেশনে খননস্থান সরেজমিনে চিহ্নিত করায় নতুনভাবে প্রায় ৯.০ একর ভূমি অধিগ্রহণ অনুমোদনের লক্ষ্যে ৩০-০৬-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পিআইসি সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় পূর্বের তুলনায় অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়টি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC)-এর ২৭-০৫-২০২৫ তারিখের সভায় এবং প্রকল্পের স্ট্রিয়ারিং কমিটি (PSC)-এর ৩০-০৬-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদিত হয়েছে। গত ১৩-০৭-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত						

— ২৮ —








		এসজিএফএল পরিচালক পর্ষদের ৬৬০ তম সভায় “সিলেট-১২নং কুপ খনন (তেল কুপ)” শীর্ষক প্রকল্পের জন্য পূর্বের ২ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব বাতিলপূর্বক সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলাধীন খাগড়া হাওড় ১ম খন্ড মৌজায় ৯ (নয়) একর ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে জালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণের নিমিত্ত পেট্রোবাংলায় পত্র প্রেরণের অনুমোদন দেওয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে ০৪-০৮-২০২৫ তারিখে জ্বাখসবি’র প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়। ০৬-০৮-২০২৫ তারিখে সিলেট ডিসি অফিসে খাগড়া হাওড় ১ম খন্ড মৌজায় ৮.৮৭ একর ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে। পরিবেশগত ছাড়পত্র: প্রকল্পের অনুকূলে ২০-০৮-২০২৪ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া গিয়াছে। কুপ খননের লোকেশন চিহ্নিতকরণ: পেট্রোবাংলার ১০০টি কুপ খনন সংক্রান্ত কমিটির সিদ্ধান্ত/ সুপারিশ এর প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত ১ লোকেশনে যাচাইপূর্বক খননস্থান সরেজমিনে চিহ্নিতকরণের অনুরোধ জানিয়ে ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে বাপেক্স বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বাপেক্স কর্তৃক ১৫-০৫-২০২৫ তারিখে সরেজমিনে খনন লোকেশন চিহ্নিত করা হয়েছে। জিটিও প্রণয়ন: কুপ-এর হালনাগাদকৃত খনন লোকেশন সরেজমিনে চিহ্নিত করার পর বাপেক্স হতে কুপ খননের চূড়ান্ত জিটিও প্রণয়ন কাজ চলমান রয়েছে। খনন ঠিকাদার নিয়োগ : সিলেট-১২নং কুপ খনন (তেল কুপ) প্রকল্পের আওতায় টার্ন-কি ভিত্তিতে কুপ খনন অপারেশন, মালামাল সরবরাহ, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র দলিল প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শকের মাধ্যমে উক্ত দরপত্র দলিল চূড়ান্ত করে দরপত্র আহ্বান করার লক্ষ্যে ২১-০৮-২০২৫ তারিখে মোবাইলাইজেশন নোটিশ প্রদান করা হয়েছে।
--	--	--



— ২৩ —



কোম্পানির চলমান প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি আগস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত

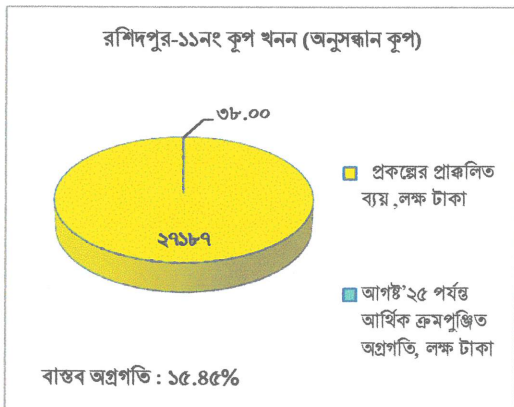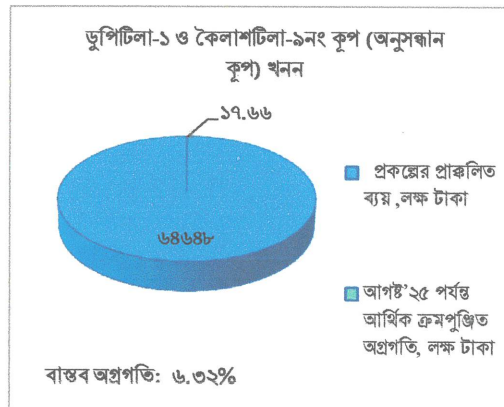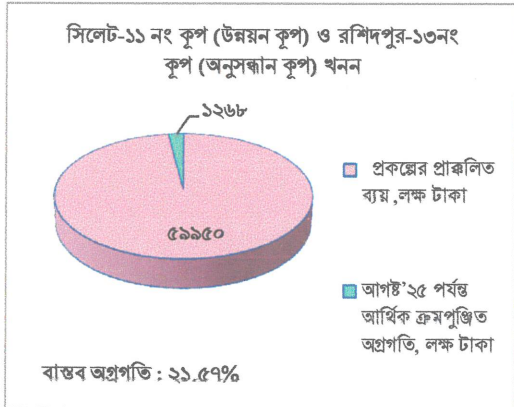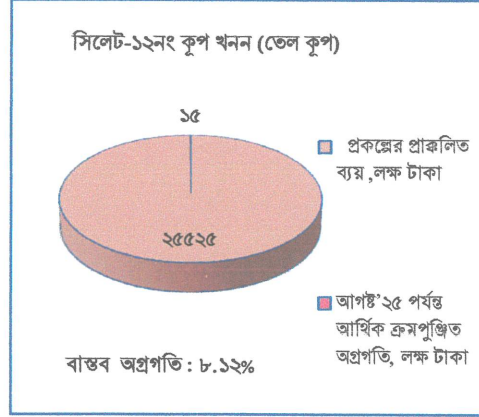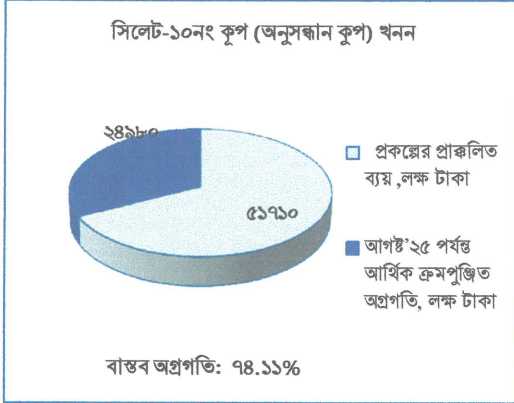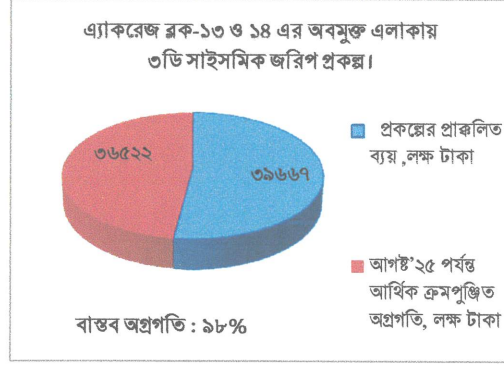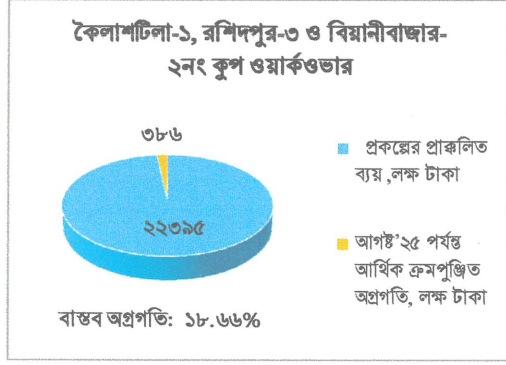

Handwritten signature

— ৬০ —

Handwritten signature

উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট

আগষ্ট ২০২৫

উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট :

- ক) উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড : নাই।
- খ) আগামী দুই মাসে সম্পাদিতব্য গুরুত্বপূর্ণ : ১) রশিদপুর-৩নং কুপের ওয়ার্ক-ওভার কাজ সম্পন্ন
কাজের তালিকা। হবে বলে আশা করা যায়।
২) কোম্পানির ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)
সম্পন্ন করা হবে বলে আশা করা যায়।
- গ) আগামী দুই মাসে বড় রকমের কোন : নাই।
সমস্যা/সংকটের আশঙ্কা করা হলে তার
বিবরণ



— ৬০ —



জনবলের পরিসংখ্যান

মাসের নাম : আগস্ট ২০২৫

জনবলের পরিসংখ্যান :

১। কর্মকর্তা

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫	কর্মরত পদের সংখ্যা
১।	৭৮০০০ (নির্ধারিত)	-
২।	৬৬০০০-৬৮৮৮০-৭১০৫০-৭৩৭২০-৭৬৪৯০	-
৩।	৫৬৫০০-৫৮৭৬০-৬১১২০-৬৩৫৭০-৬৬১২০-৬৮৭৭০-৭১৫৩০-৭৪৪০০	১০
৪।	৫০০০০-৫২০০০-৫৪০৮০-৫৬২৫০-৫৮৫০০-৬০৮৪০-৬৩২৮০-৬৫৮২০-৬৮৪৬০-৭১২০০	৬৯
৫।	৪৩০০০-৪৪৯৪০-৪৬৯৭০-৪৯০৯০-৫১৩০০-৫৩৬১০-৫৬০৩০-৫৮৫৬০-৬১২০০-৬৩৯৬০-৬৬৮৪০-৬৯৮৫০	৬৫
৬।	৩৫৫০০-৩৭২৮০-৩৯১৫০-৪১১১০-৪৩১৭০-৪৫৩৩০-৪৭৬০০-৪৯৯৮০-৫২৪৮০-৫৫১১০-৫৭৮৭০-৬০৭৭০-৬৩৮১০-৬৭০১০	৪৮
৭।	২৯০০০-৩০৪৫০-৩১৯৮০-৩৩৫৮০-৩৫২৬০-৩৭০৩০-৩৮৮৯০-৪০৮৪০-৪২৮৯০-৪৫০৪০-৪৭৩০০-৪৯৬৭০-৫২১৬০-৫৪৭৭০-৫৭১০০-৬০৩৯০-৬৩৪১০	-
৮।	২৩০০০-২৪১৫০-২৫৩৬০-২৬৬৩০-২৭৯৭০-২৯৩৭০-৩০৮৪০-৩২৩৯০-৩৪০১০-৩৫৭২০-৩৭৫১০-৩৯৩৯০-৪১৩৬০-৪৩৪৩০-৪৫৬১০-৪৭৯০০-৫০৩০০-৫২৮২০-৫৫৪৭০	২
৯।	২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০	১০৭
১০।	১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫০০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০	২৮
মোট কর্মকর্তা :		৩২৯

২। কর্মচারী

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫	কর্মরত পদের সংখ্যা
১।	২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০	০০
২।	১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫০০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০	০০
৩।	১২৫০০-১৩১০০-১৩৭৯০-১৪৪৮০-১৫২১০-১৫৯৮০-১৬৭৮০-১৭৬২০-১৮৫১০-১৯৪৪০-২০৪২০-২১৪৫০-২২৫৩০-২৩৬৬০-২৪৮৫০-২৬১০০-২৭৪১০-২৮৭৯০-৩০২৩০	০৫
৪।	১১৩০০-১১৮৭০-১২৪৭০-১৩১০০-১৩৭৬০-১৪৪৫০-১৫১৮০-১৫৯৪০-১৬৭৪০-১৭৫৮০-১৮৪৬০-১৯৩৯০-২০৩৬০-২১৩৮০-২২৪৫০-২৩৫৮০-২৪৭৬০-২৬০০০-২৭৩০০	২৪
৫।	১১০০০-১১৫৫০-১২১৩০-১২৭৪০-১৩৩৮০-১৪০৫০-১৪৭৬০-১৫৫০০-১৬২৮০-১৭১০০-১৭৯৬০-১৮৮৬০-১৯৮১০-২০৮১০-২১৮৬০-২২৯৬০-২৪১১০-২৫৩২০-২৬৫৯০	৬৫
৬।	১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০-২১৩১০-২২৩৮০-২৩৫০০-২৪৬৮০	২৯
৭।	৯৭০০-১০১৯০-১০৭০০-১১২৪০-১১৮১০-১২৪১০-১৩০৪০-১৩৭০০-১৪৩৯০-১৫১১০-১৫৮৭০-১৬৬৭০-১৭৫১০-১৮৩৯০-১৯৩১০-২০২৮০-২১৩০০-২২৩৭০-২৩৪৯০	০৩
৮।	৯৩০০-৯৭৭০-১০২৬০-১০৭৮০-১১৩২০-১১৮৯০-১২৪৯০-১৩১২০-১৩৭৮০-১৪৪৭০-১৫২০০-১৫৯৬০-১৬৭৬০-১৭৬০০-১৮৪৮০-১৯৪১০-২০৩৯০-২১৪১০-২২৪৯০	৪৭
৯।	৯০০০-৯৪৫০-৯৯৩০-১০৪৩০-১০৯৬০-১১৫১০-১২০৯০-১২৭০০-১৩৩৪০-১৪০১০-১৪৭২০-১৫৪৬০-১৬২৪০-১৭০৬০-১৭৯২০-১৮৮২০-১৯৭৭০-২০৭৬০-২১৮০০	০১
১০।	৮৮০০-৯২৪০-৯৭১০-১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০	০
১১।	৮৫০০-৮৯৩০-৯৩৮০-৯৮৫০-১০৩৫০-১০৮৭০-১১৪২০-১২০০০-১২৬০০-১৩২৩০-১৩৯০০-১৪৬০০-১৫৩৩০-১৬১০০-১৬৯১০-১৭৭৬০-১৮৬৫০-১৯৫৯০-২০৫৭০	০
১২।	৮২৫০-৮৬৭০-৯১১০-৯৫৭০-১০০৫০-১০৫৬০-১১০৯০-১১৬৫০-১২২৪০-১২৮৬০-১৩৫১০-১৪১৯০-১৪৯০০-১৫৬৫০-১৬৪৪০-১৭২৭০-১৮১৪০-১৯০৫০-২০০১০	০২
মোট কর্মচারী :		১৭৬
মোট কর্মকর্তা এবং কর্মচারী (৩২৯+১৭৬) :		৫০৫ জন

১ জন কর্মকর্তা ও ১ জন কর্মচারির অবসর এবং ১ জন কর্মচারীর মৃত্যুজনিত কারণে গত মাসের প্রতিবেদনের সাথে প্রতিবেদনাবীন মাসে জনবলের সংখ্যার তারতম্য হয়েছে।

— ৩২ —
