



সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

SYLHET GAS FIELDS LIMITED

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

প্রতিবেদনকাল

জুলাই ২০২৫



মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

MONTHLY MIS REPORT

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

জুলাই ২০২৫

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১)	উৎপাদন পরিসংখ্যান (ফিল্ড/স্থাপনা ভিত্তিক)	১
২)	কোম্পানির সামগ্রিক উৎপাদন পরিসংখ্যান	২
৩)	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণী	৩
৪)	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণী	৪
৫)	বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের আয়/ব্যয়ের তারতম্য বিশ্লেষণ	৫
৬)	আয়-ব্যয় বিবরণী	৬-৭
৭)	বিক্রয় বিবরণী (গ্যাস)	৮
৮)	বিক্রয় বিবরণী (উপজাত তেল)	৯
৯)	গ্রাহকওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণী	১০
১০)	প্রদেয় ভ্যাট এর বিবরণী	১১
১১)	সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা বিবরণী	১২
১২)	মাসের মজুদ বিবরণী	১৩
১৩)	নগদ তহবিল বিবরণী	১৪
১৪)	আয়-ব্যয় এবং বকেয়া পাওনার বিশ্লেষণ বিবরণী	১৫
১৫)	মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী	১৬
১৬)	বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী	১৭
১৭)	কোম্পানির উৎপাদন ও বিক্রয়ের তুলনামূলক চিত্র	১৮-১৯
১৮)	কোম্পানির চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ও চিত্র	২০-২৯
১৯)	উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট	৩০
২০)	জনবলের পরিসংখ্যান	৩১

উৎপাদন পরিসংখ্যান (ফিল্ড/স্থাপনা ভিত্তিক)

প্রতিবেদন মাস : জুলাই ২০২৫

ক্রমিক নং	গ্যাস ক্ষেত্র/ স্থাপনা	বিদ্যমান কূপ	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উপাদান	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বকসের সাক্ষ্যমাণ (২০২৫- ২০২৬)	বিলত মাস (জুন ২০২৫)	চলতি মাস (জুলাই ২০২৫)	বিলত বকসের (২০২৪-২০২৫) মোট	চলতি বকসের (২০২৫-২০২৬) ক্রমসূত্রিত	গ্যাস হইতে ক্রমসূত্রিত গ্যাস (এম এম এস সি এক্স) পেট্রোলিয়ামজাত স্রাবাদি (লিটার)	গ্যাস হইতে ক্রমসূত্রিত গ্যাস (এম এম এস সি এক্স) পেট্রোলিয়ামজাত স্রাবাদি (লিটার)
১।	সিলেট	কূপ নং-৩, ৭, ৮ ও সিলেট-৯ ও সিলেট-১০	৪টি	গ্যাস	০.৬৪৫	২৪৩.২৬৪৮	২২.৫১২	২২.৫১২	১০৫.৯০২	২২.১৬৯	৬.৫০১.৫৪১	২২.১৬৯
				পানি	-	-	-	-	৪	৩.০০৩	২১.৭৭৭.৮৭১	২১.৭৭৭.৮৭১
				অপর তৈল	-	-	-	-	৪	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				মটর স্পিরিট RON 81	-	-	-	-	-	-	০.০০০	০.০০০
				ডিজেল	-	-	-	-	-	-	০.০০০	০.০০০
২।	বৈকালগিলা	কূপ নং-১, ৪	০টি	গ্যাস	১.৮৬৪.০০	২.৫৪৫.১০৪.০০	৩৬০.৬৩২	২৪৪.৭২৭	২,০১০.৬৪৫	২৪৪.৭২৭	৬.৫০১.৫৪১	২৪৪.৭২৭
				পানি	-	-	-	-	১,০৬১	-	৬.৫০১.৫৪১	৬.৫০১.৫৪১
				মটর স্পিরিট RON 81	-	-	-	-	-	-	০.০০০	০.০০০
				ডিজেল	-	-	-	-	-	-	০.০০০	০.০০০
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	০.০০০	০.০০০
৩।	এমএনআই প্রাক্ত অগারশন (বৈকালগিলা)	কূপ নং-২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯	৪টি	গ্যাস	০.৮৫০	৩০১.৫৪১	৩৬০.৬৩২	৩৬০.৬৩২	১,০৬১	৩৬০.৬৩২	৬.৫০১.৫৪১	৩৬০.৬৩২
				পানি	-	-	-	-	১,০৬১	-	৬.৫০১.৫৪১	৬.৫০১.৫৪১
				মটর স্পিরিট RON 81	-	-	-	-	-	-	০.০০০	০.০০০
				ডিজেল	-	-	-	-	-	-	০.০০০	০.০০০
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	০.০০০	০.০০০
৪।	রশিদপুর	কূপ নং-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯	৭টি	গ্যাস	১.৭৪৮	৩৬০.৬৩২	৩৬০.৬৩২	৩৬০.৬৩২	১,০৬১	৩৬০.৬৩২	৬.৫০১.৫৪১	৩৬০.৬৩২
				পানি	-	-	-	-	১,০৬১	-	৬.৫০১.৫৪১	৬.৫০১.৫৪১
				মটর স্পিরিট RON 81	-	-	-	-	-	-	০.০০০	০.০০০
				ডিজেল	-	-	-	-	-	-	০.০০০	০.০০০
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	০.০০০	০.০০০
৫।	বিমানবাজার	কূপ নং-১ ও ২	২টি	গ্যাস	০.৮৫০	৩০১.৫৪১	৩৬০.৬৩২	৩৬০.৬৩২	১,০৬১	৩৬০.৬৩২	৬.৫০১.৫৪১	৩৬০.৬৩২
				পানি	-	-	-	-	১,০৬১	-	৬.৫০১.৫৪১	৬.৫০১.৫৪১
				মটর স্পিরিট RON 81	-	-	-	-	-	-	০.০০০	০.০০০
				ডিজেল	-	-	-	-	-	-	০.০০০	০.০০০
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	০.০০০	০.০০০
৬।	ছাতক	কূপ নং-১	-	গ্যাস	-	-	-	-	-	-	-	-
				পানি	-	-	-	-	-	-	-	-
				মটর স্পিরিট RON 81	-	-	-	-	-	-	-	-
				ডিজেল	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-
৭।	রশিদপুর কমডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্রাক্ত			গ্যাস	-	-	-	-	-	-	-	-
				পানি	-	-	-	-	-	-	-	-
				মটর স্পিরিট RON 81	-	-	-	-	-	-	-	-
				ডিজেল	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-
৮।	৪০০০ বিপিটি কমডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্রাক্ত			গ্যাস	-	-	-	-	-	-	-	-
				পানি	-	-	-	-	-	-	-	-
				মটর স্পিরিট RON 81	-	-	-	-	-	-	-	-
				ডিজেল	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-
৯।	৩০০০ বিপিটি ক্যাটালিটিক ফ্রাকশনেশন ইউনিট			গ্যাস	-	-	-	-	-	-	-	-
				পানি	-	-	-	-	-	-	-	-
				মটর স্পিরিট RON 81	-	-	-	-	-	-	-	-
				ডিজেল	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-
১০।	বৈকালগিলা এলপিগি প্রাক্ত			গ্যাস	-	-	-	-	-	-	-	-
				পানি	-	-	-	-	-	-	-	-
				মটর স্পিরিট RON 81	-	-	-	-	-	-	-	-
				ডিজেল	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-

২০২৫

- ১০ -

২০২৫

কোম্পানির সামগ্রিক উৎপাদন পরিসংখ্যান

গ্যাস : এম এম এস সি এম, পানি ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : লিটার										
গ্যাস ক্ষেত্র/ স্থাপনা	বিদ্যমান কুপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কুপ সংখ্যা	উপাদান	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২০২৬)	বিগত মাস (জুন ২০২৫)	চলতি মাস (জুলাই ২০২৫)	বিগত বৎসরের (২০২৪-২০২৫) মোট	চলতি বৎসরের (২০২৫-২০২৬) ক্রমপঞ্জিত	শুরু হতে ক্রমপঞ্জিত
সিলেট, কৈলাশটীলা, এমএসটিই প্লান্ট অপারেশন, রশিদপুর, বিয়ানীবাজার, হাতক, রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্ট, ৪০০০ বিপিডি কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্ট, ৩০০০ বিপিডি ক্যাটলাইটিক রিফর্মিং ইউনিট ও কৈলাশটীলা এলপিগি প্লান্ট	২৬ টি	১৭ টি	গ্যাস	৩.৬৩০৯	১,২৯১.৫৪৪৬	১২১.৮৪৬	১২০.৮৫৫	১,৩৯২.০০৬	১২০.৮৫৫	৫৫,৪৭৮.৬১২
			পানি	--	--	১৩,৪৮৯,১৪০	১২,৩৬৪,২১৩	১৩৩,০৭০,৭৮৬	১২,৩৬৪,২১৩	১,৬২৩,৩৫৮,৭৭৫
			অপ: তৈল	--	--	--	--	--	--	৮৯,১৪৯,৬৩০
			অকটেন	২৩৮,৪৮২	৭৮,৬৯৯,০০০	৩,৭৪৮,৮৫৬	২,২৭৫,১৫৫	৭০,৯৬৫,৫৩১	২,২৭৫,১৫৫	৩২০,৩২০,৩৭১
			মটর স্পিরিট RON 81	৫৫০,৭৭২	১৮১,৭৫৪,৯৬২	১৮,৫৩৪,৫৯১	২১,১২৮,৫২০	২২৬,৮৯৩,০৩২	২১,১২৮,৫২০	২,২২৬,১৭১,১৫২
			ডিজেল	২৩,৫৭১	৭,৭৭৮,০০০	৮১২,১৩১	১,০৭১,৮১০	৯,৭৩৩,৩২৫	১,০৭১,৮১০	৫২৪,২০২,০৭১
			কেরোসিন	৩২,১৩৩	১০,৬০৪,০০০	৯২০,৫১১	৯৭১,৫৬৪	১১,৯৯৭,১৭৭	৯৭১,৫৬৪	৩১৫,১৩৬,৭৫১
			কনডেনসেট	৭২,৩০৩	২৩,৮৫৯,৯৯৬	৩,১৪৩,১২৭	২,৯০২,২৪৯	৩৪,৭২৬,৫৯৪	২,৯০২,২৪৯	১,৯৩৩,১২০,৪৬৭
			এনজিএল	৪৩,৬১৩	১৪,৩৯২,৩২৫	১,৪১৯,০০০	১,৭৮০,০০০	১৯,৬৯৯,০০০	১,৭৮০,০০০	৫৯৮,৫০৯,৯৯২
			মটর স্পিরিট RON 89	৩৫৬,১৩০	১১৭,৫২৩,০০০	১৪,৬৪৪,৩৬৪	১৮,০২২,৭১৩	১৫৩,৯৪৮,৬৬৬	১৮,০২২,৭১৩	৫২৩,৮৪৯,২৯৭
			লাইট ন্যাফথা	১৪৫,৪৭৩	৪৮,০০৬,০০০	৪,৫২২,৬৫৩	৪,৭৫৬,০২৮	৫৩,১২৬,৭৭৪	৪,৭৫৬,০২৮	১৯৮,৪১৯,০৭৫
			রিফর্মেন্ট	৩১০,০২৪	১০২,৩০৮,০০০	৮,৬৪১,৬৯৫	৯,০১২,৬৪৬	১০৮,৪৮৫,৮১৬	৯,০১২,৬৪৬	৪৩৩,২৫৬,৮০৯
			সুপার লাইট কনডেনসেট	-	-	৯৮৪,২০৬	১,০৮৩,৬৭৫	১১,৮৮৭,১১২	১,০৮৩,৬৭৫	১৪,৮৫৩,৩২৯
			এলপিগি	১১,৮৪৫	৩,৯০৮,৮৩১	৪৩৭,৬৯৯	৭০৬,২২৬	৮,১৫৮,৬৭৫	৭০৬,২২৬	১২,৩৮১,৯০১

[Signature]

[Signature]

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণী

গ্যাস : এমএমএসসিএম, পেট্রোলিয়াম পণ্যাদি : লিটার						
ক্রমিক	উপাদান	চলতি মাস (জুলাই ২০২৫)	বিগত মাস (জুন ২০২৫)	বৈশি/ কম শতকরা হার (৩ - ৪)	বিগত বৎসরের জুলাই ২০২৪ মাস	বৈশি/ কম শতকরা হার (৩ - ৬)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক)	গ্যাস	১২০.৮৫৫	১২১.৮৪৬	-০.৯৯১	১০৬.০৯৯	১৪.৭৫৭
				-০.৮১%		১৩.৯১%
খ)	কনডেনসেট	২,৯০২,২৪৯	৩,১৪৩,১২৭	-২৪০.৮৭৮	২,৫৮৩,৩৭৬	৩১৮.৮৭৩
				-৭.৬৬%		১২.৩৪%
গ)	এনজিএল	১,৭৮০,০০০	১,৪১৯,০০০	৩৬১,০০০	১,২৭৯,০০০	৫০১,০০০
				২৫.৪৪%		৩৯.১৭%
ঘ)	মটর স্পিরিট RON 81	২১,১২৮,৫২০	১৮,৫৩৪,৫৯১	২,৫৯৩,৯২৯	১৮,৪৩৩,১৭৩	২,৬৬৫,৩৩৭
				১৪.০০%		১৪.৪৪%
ঙ)	ডিজেল	১,০৭১,৮১০	৮১২,১৩১	২৫৯,৬৭৯	৯৪২,৭৮৯	১২৯,০২১
				৩১.৯৮%		১৩.৬৯%
চ)	কেরোসিন	৯৭১,৫৬৪	৯২০,৫১১	৫১,০৫৩	১,১০৯,৮৩১	-১৩৮,২৬৭
				৫.৫৫%		-১২.৪৬%
ছ)	পেট্রোল (রন ৮৯)	১৮,০২২,৭১৩	১৪,৬৪৪,৩৬৪	৩,৩৭৮,৩৪৯	৮,২৮০,১৩৯	৯,৭৪২,৫৭৪
				২৩.০৭%		১১৭.৬৬%
জ)	অকটেন	২,২৭৫,১৫৫	৩,৭৪৮,৮৫৬	(১,৪৭৩,৭০১.০০)	৬,৪১৭,৭৩৫	(৪,১৪২,৬১০)
				-৩৯.৩১%		-৬৪.৫৫%
ঝ)	লাইট ন্যাফথা	৪,৭৫৬,০২৮	৪,৫২২,৬৫৩	২৩৩,৩৭৫	৪,৬১৪,৬১৫	১৪১,৪১৩
				৫.১৬%		৩.০৬%
এগ)	রিফরমেট	৯,০১২,৬৪৬	৮,৬৪১,৬৯৫	৩৭০,৯৫১	৯,২৮৩,১১১	(২৭৩,৪৬৮)
				৪.২৯%		-২.৯৪%
ট)	এলপিগিজ	৭০৬,২২৬	৪৩৭,৬৯৯	২৬৮,৫২৭.০০	৫২৬,৪৯০	১৭৯,৭৩৬
				৬১.৩৫%		৩৪.১৪%
ঠ)	সুপার লাইট কনডেনসেট	১,০৮৩,৬৭৫	৯৮৪,২০৬	৯৯,৪৬৯	৭৭৩২২৪	৩১০,৪৫১
				১০.১১%		৪০.১৫%

(Signature)

- ৩৩ -

(Signature)

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণী

গ্যাস : এমএমএসসিএম, পেট্রোলিয়াম পণ্যাদি : লিটার					
ক্রমিক	বিক্রয়	চলতি মাস (জুলাই ২০২৫)	বিগত মাস (জুন ২০২৫)	বেশী/ কম শতকরা হার (৩ - ৪)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
ক)	গ্যাস	১১৯.৪৭০	১২০.৫১০	-১.০৪০ -০.৮৬%	চলতি মাসে বিগত মাসের তুলনায় গ্যাস উৎপাদন কম হওয়ায় বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।
খ)	কনডেনসেট	১,০৮০,০০০	১,০৫২,৫০০	-৪৭২,৫০০ -৩০.৪৩%	চলতি মাসে চাহিদা কম থাকায় কনডেনসেট বিক্রয় গত মাসের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।
ঘ)	মটর স্পিরিট RON ৪৭	১৬,৬০৭,৩৬০	১৪,৪৯১,৭৯০	২,১১৫,৫৭০ ১৪.৬০%	গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে চাহিদা বেশী থাকায় মটরস্পিরিট বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
ঙ)	ডিজেল	১,২১০,৪১০	৯৩৫,৯২০	২৭৪,৪৯০ ২৯.৩৩%	গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে ডিজেলের চাহিদা বেশী থাকায় বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
চ)	কেরোসিন	৭৫৯,৯৮০	৭৫৫,৫২০	৪,৪৬০ ০.৫৯%	গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে কেরোসিনের চাহিদা বেশী থাকায় বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
ছ)	অকটেন	২,২৫৭,৭৭০	৪,১০৭,২৮০	-১৮৪৯৫১০ -৪৫.০৩%	চাহিদা কম থাকায় গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে অকটেন বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।
জ)	এলপিগিজ	৭০৮,১৯০	৫১৮,৫২০	১৮৯৬৭০.০০ ৩৭%	চলতি মাসে এলপিগিজ বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

-০৪-

বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের আয়/ব্যয়ের তারতম্য বিশ্লেষণ

প্রতিবেদনকালীন মাসঃ জুলাই ২০২৫

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস	চলতি মাস	হ্রাস/বৃদ্ধি	হ্রাস/বৃদ্ধি
		জুন ২০২৫	জুলাই ২০২৫		
১	গ্যাস বিক্রয়	৩৮.৫৪	৩৮.২২	-০.৩২	গ্যাস বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।
২	উপজাত তেল বিক্রয়	১৮২.৮৭	১৮৩.৯৬	১.০৯	উপজাত তেল বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩	অপরিশোধিত তেল বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	অপরিশোধিত তেল বিক্রয় অপরিবর্তিত আছে
ভ্যাট					
৪	গ্যাস	২৬.৫০	২৬.২৯	-০.২২	ভ্যাট হ্রাস পেয়েছে।
	উপজাত তেল	২৪.১৫	২৪.১৭	০.০২	ভ্যাট বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫	অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয়	১০৫.১২	১০৪.৮৬	-০.২৬	ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।
৬	আয়কর পূর্ব নীট মুনাফা	৬৮.৯৭	৭২.০১	৩.০৪	মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৭	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা	৮১.৪৫	৪৯.৮১	-৩১.৬৪	জমা হ্রাস পেয়েছে।
৮	বকেয়া পাওনা আদায়	২৮১.০৭	৬৯.৮৪	-২১১.২৩	আদায় হ্রাস পেয়েছে।

হুমায়ুন

- ০৩ -

সিগমন্ড

আয় - ব্যয় বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : জুলাই ২০২৫

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস		জুন ২০২৫		চলতি মাস		জুলাই ২০২৫		বিগত বৎসরের মোট (২০২৪-২০২৫)		চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত	
		প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট
ক) বিক্রয়													
১	গ্যাস	৪৫.৭৩	৪১.৮৩	৩৮.২২	৪১.৮৩	৩৮.২২	৩৮.২২	৩৮.২২	৩৮.২২	৩৮.২২	৩৮.২২	৩৮.২২	৩৮.২২
২	অকটেন	৩৭.৯৩	৬১.৬৩	২০.৮৩	৬১.৬৩	২০.৮৩	২০.৮৩	২০.৮৩	২০.৮৩	২০.৮৩	২০.৮৩	২০.৮৩	২০.৮৩
২	মটর স্পিরিট	১২৩.৫৬	৮৩.৩৬	১৪১.৬০	৮৩.৩৬	১৪১.৬০	১৪১.৬০	১৪১.৬০	১৪১.৬০	১৪১.৬০	১৪১.৬০	১৪১.৬০	১৪১.৬০
৩	ডিজেল	৩৫.৮৬	২৫.৮৬	৩৫.৮৬	২৫.৮৬	৩৫.৮৬	৩৫.৮৬	৩৫.৮৬	৩৫.৮৬	৩৫.৮৬	৩৫.৮৬	৩৫.৮৬	৩৫.৮৬
৪	কেরোসিন	৬.৫৮	৫.৫৮	৬.৫৮	৫.৫৮	৬.৫৮	৬.৫৮	৬.৫৮	৬.৫৮	৬.৫৮	৬.৫৮	৬.৫৮	৬.৫৮
৫	কনডেনসেট	৭.৬৮	৬.৬৮	৭.৬৮	৬.৬৮	৭.৬৮	৭.৬৮	৭.৬৮	৭.৬৮	৭.৬৮	৭.৬৮	৭.৬৮	৭.৬৮
৬	এন জি এল	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
৭	এল পি জি	৫.৮০	৫.৮০	৫.৮০	৫.৮০	৫.৮০	৫.৮০	৫.৮০	৫.৮০	৫.৮০	৫.৮০	৫.৮০	৫.৮০
মোট ১ হতে ৭ পর্যন্ত		৮৭.১২	৮১.১২	৮৮.২২	৮১.১২	৮৮.২২	৮৮.২২	৮৮.২২	৮৮.২২	৮৮.২২	৮৮.২২	৮৮.২২	৮৮.২২
খ) ব্যয়													
১। সম্পূরক কর ও ভ্যাট													
i	গ্যাস	০৫.৬২	০২.৬২	৫.৬২	৫.৬২	৫.৬২	৫.৬২	৫.৬২	৫.৬২	৫.৬২	৫.৬২	৫.৬২	৫.৬২
i	অকটেন	৪৫.৪১	৮৬.৮১	২৬.২১	৮৬.৮১	২৬.২১	২৬.২১	২৬.২১	২৬.২১	২৬.২১	২৬.২১	২৬.২১	২৬.২১
ii	মটর স্পিরিট	২৫.৬১	৮৫.৮১	৬৪.৮১	৮৫.৮১	৬৪.৮১	৬৪.৮১	৬৪.৮১	৬৪.৮১	৬৪.৮১	৬৪.৮১	৬৪.৮১	৬৪.৮১
iii	ডিজেল	৮৫.৮০	২৬.৮০	৮৫.৮০	২৬.৮০	৮৫.৮০	৮৫.৮০	৮৫.৮০	৮৫.৮০	৮৫.৮০	৮৫.৮০	৮৫.৮০	৮৫.৮০
iv	কেরোসিন	০৮.৮০	৮০.৮০	৮৫.৮০	৮০.৮০	৮৫.৮০	৮৫.৮০	৮৫.৮০	৮৫.৮০	৮৫.৮০	৮৫.৮০	৮৫.৮০	৮৫.৮০
v	কনডেনসেট	০৩.৮০	৮৫.৮০	৮৫.৮০	৮৫.৮০	৮৫.৮০	৮৫.৮০	৮৫.৮০	৮৫.৮০	৮৫.৮০	৮৫.৮০	৮৫.৮০	৮৫.৮০
vi	এন জি এল	০০.৮০	০০.৮০	০০.৮০	০০.৮০	০০.৮০	০০.৮০	০০.৮০	০০.৮০	০০.৮০	০০.৮০	০০.৮০	০০.৮০
vii	এল পি জি	০০.৮০	০০.৮০	০০.৮০	০০.৮০	০০.৮০	০০.৮০	০০.৮০	০০.৮০	০০.৮০	০০.৮০	০০.৮০	০০.৮০
মোট সম্পূরক কর ও ভ্যাট		৫০.৬৫	৫০.৬৫	৫০.৬৫	৫০.৬৫	৫০.৬৫	৫০.৬৫	৫০.৬৫	৫০.৬৫	৫০.৬৫	৫০.৬৫	৫০.৬৫	৫০.৬৫

— ১০ —

আয় - ব্যয় বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : জুলাই ২০২৫

(কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস প্রকৃত	জুন ২০২৫ বাজেট	চলতি মাস প্রকৃত	জুলাই ২০২৫ বাজেট	বিগত বৎসরের মোট (২০২৪-২০২৫) প্রকৃত	বাজেট	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জীভূত প্রকৃত	বাজেট
২।	কনডেনসেট ক্রয় ব্যয়	৭৩.৯৫	১০০.৬১	৭৪.৮৬	৯৩.৭৬	৮৩৫.৪৬	১২০৭.৩৭	৭৪.৮৬	৯৩.৭৬
৩।	উৎপাদন ব্যয়	৩.৯০	৫.০২	১.৪৬	৪.৩৯	৪৬.৮০	৬০.১৯	১.৪৬	৪.৩৯
৪।	বেতন ও ভাতাদি	৬.৪৫	৬.৭৯	৭.৭০	৮.৩৬	৭৬.৬৬	৮১.৪৬	৭.৭০	৮.৩৬
৫।	প্রশাসনিক ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬।	সুদ	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৫	০.২৮	০.২৮	০.২৮	০.২৮
৭।	অবচয়	৮.০৫	৯.৬৯	৮.২৩	৯.৬৯	০.২০	০.২০	৮.২৩	৯.৬৯
৮।	ডিস্ট্রিশন অব ওয়েল কস্ট	১.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১.০০	০.০০
৯।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩.৫২	৬.৬৮	৩.৫২	৬.৬৮	০.০০	০.০০	৩.৫২	৬.৬৮
১০।	অন্যান্য ব্যয় (পেট্রোলিয়াম পণ্য পরিবহন সহ)	৭.৪৫	১০.০১	৭.৪৫	১০.০১	০.০০	০.০০	৭.৪৫	১০.০১
	মোট ব্যয় 'খ' (১ হতে ১০)	১৫৫.৬৭	১৮৬.৬৮	১৫৫.৬৭	১৮৬.৬৮	৯৬২.০৯	১২০৭.৩৭	৯৬২.০৯	১২০৭.৩৭
গ।	পরিচালনা মূল্য	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬
ঘ।	বিবিধ আয়	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬
ঙ।	আয়কর ও শংসারতঃ পূর্ব মূল্য	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬
চ) কতন সমূহ									
১।	শংসারতঃ ট্রাস্ট	৩.৬৬	৩.৬৬	৩.৬৬	৩.৬৬	৩.৬৬	৩.৬৬	৩.৬৬	৩.৬৬
২।	আয়কর	২০.৬৬	২০.৬৬	২০.৬৬	২০.৬৬	২০.৬৬	২০.৬৬	২০.৬৬	২০.৬৬
৩।	লভ্যাংশ	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬
	মোট কর্তন (চ)	৩০.৬৬	৩০.৬৬	৩০.৬৬	৩০.৬৬	৩০.৬৬	৩০.৬৬	৩০.৬৬	৩০.৬৬
	নাইট উদ্ধৃতি (ঙ - চ)	৪২.০০	৪২.০০	৪২.০০	৪২.০০	৪২.০০	৪২.০০	৪২.০০	৪২.০০

Signature

- ০৭ -

Signature

বিক্রয় বিবরণী (গ্যাস)

প্রতিবেদনকালীন মাস : জুলাই ২০২৫

পরিমাণ : এম এম সি এম, মূল্য : কোটি টাকায়

	তিতাস		জালালাবাদ		বাখরাবাদ		কর্ণফুলি		পাটমাঞ্চল		মোট গ্যাস বিক্রয়	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১। চলতি মাস : জুলাই ২০২৫												
বাজেট	০.০০	০.০০	৪৫.৫০	১৬.১৮	৩৩.৩৩	১১.৮৫	০.০০	০.০০	২৭.৪৬	৯.৭৬	১০৬.২৯	৩৭.৭৯
প্রকৃত	০.০০	০.০০	৬৪.১৯	২০.৯০	৩৮.১৪	১১.৯২	-	-	১৭.১৪	৫.৪০	১১৯.৪৭	৩৮.২২
২। বিগত মাস : জুন ২০২৫												
বাজেট	০.০০	০.০০	৫০.৪২	১৭.১১	৪০.২৫	১৩.৬৬	০.০০	০.০০	১৮.৭৫	৬.৩৬	১০৯.৪১	৩৭.১৪
প্রকৃত	০.০০	০.০০	৬৩.৭৪	২০.৬৬	৩৮.৬৩	১২.৯৭	-	-	১৮.১৪	৫.৭২	১২০.৫১	৩৮.৫৪
৩। ক্রমপুঞ্জিত : চলতি বছর ২০২৫-২০২৬ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত												
বাজেট	০.০০	০.০০	৪৫.৫০	১৬.১৮	৩৩.৩৩	১১.৮৫	০.০০	০.০০	২৭.৪৬	৯.৭৬	১০৬.২৯	৩৭.৭৯
প্রকৃত	০.০০	০.০০	৬৪.১৯	২০.৯০	৩৮.১৪	১১.৯২	০.০০	০.০০	১৭.১৪	৫.৪০	১১৯.৪৭	৩৮.২২
৪। মোট বিগত বছর (২০২৪-২০২৫)												
বাজেট	০.০০	০.০০	৬০৫.০০	২০৫.৩৮	৪৮৩.০০	১৬৩.৯৬	০.০০	০.০০	২২৪.৯৭	৭৬.৩৭	১৩২২.৯৭	৪৪৫.৭১
প্রকৃত	০.০০	০.০০	৬৭৬.০৬	২২০.১৫	৪৮১.৮৯	১৪৭.১৮	০.০০	০.০০	২১৭.৭০	৬৮.৫৯	১৩৬৫.৬৫	৪৩৬.২২
৫। ক্রমপুঞ্জিত : আরম্ভকাল হতে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত												
প্রকৃত	১১০৫৭.২১	১৯১২.৮১	২৪৭২৬.১৫	৩৯৮৩.২৬	১৪১১৬.১২	২৮০৮	৪১২৭৭১	৩১০.৫৯	২৯৫৮.৩৯	৬৫০.২০	৫৪০৪১.১৯	৯৬৬৪.০৩

Signature

— ০৬ —

Signature

প্রতিবেদনকালীন মাস : জুলাই ২০২৫

পরিমাণ : হাজার লিটার, মূল্য : কোটি টাকা

[illegible]

গ্রাহক ওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : জুলাই ২০২৫

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	কোম্পানী ও গ্রাহক খাত	বিলত মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া	চলতি মাস জুলাই ২০২৫		চলতি মাসের শেষ তারিখে বকেয়া পাওনা	চলতি বৎসর (২০২৫-২০২৬) ক্রমপুঞ্জিত জুলাই ২০২৫			বকেয়া কত মাসের গড় বিক্রয়	বকেয়া পাওনা কাল ২০২৫-২০২৬	বকেয়া আদায় কাল ২০২৫-২০২৬
			বিক্রয়	আদায়		বিক্রয়	আদায়	বকেয়া			
১	তিতাস	৭৩০-০	০০০	০০০	৭৩০-০	০০০	০০০	০০০	০০০	৭৩০-০	০০০
২	জালালাবাদ	৭১০১১	২০.৯০	১৯.১৩	১১২৬৬	২০.৯০	১৯.১৩	১.৭৭	৩.০০	১৩১.৮৯	১৯.১৩
৩	বাখরাবাদ	১৪৭.৯৭	১১.৯২	১২.৩৩	১৪৭.৯৭	১১.৯২	১২.৩৩	০.০০	৩.০০	১৩১.৮৯	১২.৩৩
৪	কর্ণফুলি	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	২.০০	০০০	০০০
৫	পক্ষিমাঞ্চল	৬৬.৩৩	০৪.৫	০০০	৬৬.৩৩	০৪.৫	০০০	০৪.৫	৩.০০	৬৬.৩৩	০০০
৬	আরপিজিসিএল	৭০০	০০০	০০০	৭০০	০০০	০০০	০০০	০০.০	৭০০	০০০
৭	বিপিসি	৬০০			৬০০			০০০	০০০	৬০০	০০০
৮	পদ্মা	৭৪২১১	৬০.৭৬	০০০	৭৪০৭২	৬০.৭৬	০০০	৬০.৭৬	৬.০০	৭৪০৭২	০০০
৯	মেঘনা	২২৫.৩৫	৫৫.০৫	৫১.৩৫	২২৫.৩৫	৫৫.০৫	৫১.৩৫	২৩.৬০	০০.০	২২৫.৩৫	০০০
১০	যমুনা	১৯৫.৩১	৬১.৫৫	৬১.৫৫	১৯৫.৩১	৬১.৫৫	৬১.৫৫	৬১.৫৫	০০.০	১৯৫.৩১	০০.০
	উপমোটি (তেল কোং)	৬৩৩.১৬	৭১.৬১	৬৩.৩১	৬৩৩.১৬	৭১.৬১	৬৩.৩১	১৯.৮৫	২.০০	৬৩৩.১৬	০০.০
১১	অন্যান্য (মুদ্রা)	৫১০-০	৫৬.৫	৫৬.৫	৫১০-০	৫৬.৫	৫৬.৫	৫৬.৫	০০.০	৫১০-০	৫৬.৫
১২	বিজিএফসিএল	৬১১	০০০	০০০	৬১১	০০০	০০০	০০০	১.০০	৬১১	০০০
১৩	এলসি গ্যাস লিঃ	৫১০-০	৫৬.৫	৫৬.৫	৫১০-০	৫৬.৫	৫৬.৫	৫৬.৫	০০০	৫১০-০	৫৬.৫
	মোট	৯৬২.৬৭	২২২.৫৫	১৯৬.৮৭	৯৬২.৬৭	২২২.৫৫	১৯৬.৮৭	১৯৬.৮৭	৮৬.২৬	৯৬২.৬৭	৮৬.২৬

Handwritten signature

-০২-

Handwritten signature

প্রদেয় ভ্যাট এর বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : জুলাই ২০২৫

(কোটি টকায়)

এজেন্সীর নাম	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত দেয় অংক	চলতি মাস জুলাই ২০২৫		চলতি মাসের শেষ তারিখে ক্রমপুঞ্জিত দেয় অংক	উদ্ধৃতি কাল (এজিং)			চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জিত দেয় অংক ২০২৫-২০২৬	চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জিত পরিশোধিত অংক ২০২৫-২০২৬	বিগত বছরের ৩০শে জুন দেয় অংক ২০২৪-২০২৫
		দেয়	পরিশোধিত		মে ২০২৫	জুন ২০২৫	জুলাই ২০২৫			
হরিপুর ফিল্ড	৭.৪৪	২.৭১	৩.১৫	২১৬	০১৪	৩২.৩	৩.৭২	৩.৭২	৩.১৫	২৫.৩৫
কৈলাশটিলা	২০০-০	০০০	০০০	১০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০.১৬
এমএলসিটিই	৭৬.৩৩	৬.৭২	৬.৭৬	৭৬.৭২	৭০.৪১	৭.৭২	৬.৭২	৬.৭২	৬.৭৬	১৪.৯৩
রশিদপুর	৬৬.১৬	১১.৭	১১.১১	৬৭.২৭	৭৬.৭	১২.৭	১১.৭	১১.৭	১১.১১	০.৭০
বিয়ানী বাজার	৫.৪১	৩.৩৬	৪.০৪	৪৬.৪	০৬.৩	৬.৪৩	৬.৩৬	৬.৩৬	৪.০৪	৪৪.৫২
আরসিএফপি	১৬১.৬১	২.৬২	৩.৪০	৬২.৪৬	৬০.৬	৪৬.৪	২.৬২	২.৬২	৩.৪০	৬১.১৬
৪০০০ বিপিডি	১১৫.০৫	২০.৫৫	২২.৪২	২২.৪২	২২.৭১	০৬.৬১	২০.৫৫	২০.৫৫	২২.৪২	১৯২.৬৬
মোট	৬২২.১১	৬৪.০৫	১৭.৯৪	২৬৭.১১	৬৭.৪৩	২৬.০৫	৬৪.০৫	৬৪.০৫	১৭.৯৪	৫৯৬.৬৬

-১১-

সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : জুলাই ২০২৫

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণী	বিগত মাস জুন ২০২৫	চলতি মাস জুলাই ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট ২০২৪-২০২৫	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত	প্রারম্ভ হতে ক্রমপুঞ্জিত
ক) প্রকৃত প্রদান ভিত্তিক :						
১	ভ্যাট	৫২.০৪	১৭.৭৪	৫৬০.১৫	১৭.৭৪	৪৭১৩.৫১
২	আয়কর	১৫.২৭	০০.০০	৩৮.৬৯	০০.০০	৬৭.৭৭
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	১১.০০	০.০০	২২.০০	০.০০	২০৫২.৯০
৪	কাষ্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০
৫	ডি এস এল	৩.১৪	০.০০	৯.৪৩	০.০০	৭২২.৬৯
৬	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট প্রদান		৮১.৪৫	১৭.৭৪	৬৩০.২৭	১৭.৭৪	১৭৭৭.৭৭

খ) গ্র্যাকুয়াল (প্রতিনিধাল ভিত্তিক)

১	ভ্যাট	৫০.৬৫	৫০.৪৬	৫৯৪.৬০	৫০.৪৬	১১১১.২২
২	আয়কর	২০.৬৯	১৯.৮০	২৬৯.৪১	১৯.৮০	৩১৬২.৩১
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	৬.২৫	৩.৬৭	৭৫.০০	৩.৬৭	১৭৭১.৩২
৪	কাষ্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০
৫	ডি এস এল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪৪৫.৭৩
৬	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট		৭৭.৫৯	৭৩.৯৩	৯৩৯.০১	৭৩.৯৩	১৬৫৬৩.৫২

Handwritten signature

--২২--

Handwritten signature

মাসের মজুদ বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : জুলাই ২০২৫

পরিমাণ : হাজার লিটার

মূল্য : কোটি টাকা

ক্রমিক ক.নং	বিবরণ	চলতি মাসের শেষ তারিখ ৩১-০৭-২০২৫										বিগত মাসের শেষ তারিখ ৩০-০৬-২০২৫										বিগত বক্তরের শেষ তারিখ ৩০-০৬-২০২৫									
		পরিমাণ	মূল্য	কোটি	কোটি	কোটি	কোটি	কোটি	কোটি	কোটি	কোটি	পরিমাণ	মূল্য	কোটি	কোটি	কোটি	কোটি	কোটি	কোটি	কোটি	কোটি	পরিমাণ	মূল্য	কোটি	কোটি	কোটি	কোটি	কোটি	কোটি	কোটি	কোটি
১	অক্টোন																														
২	১০০০																														
৩	১০০০																														
৪	১০০০																														
৫	১০০০																														
৬	১০০০																														
৭	১০০০																														
৮	১০০০																														
৯	১০০০																														
১০	১০০০																														

Handwritten signature and date: ০৫/০৭/২৫

নগদ তহবিল বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : জুলাই ২০২৫

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	ক্যাশ ব্যালান্স	ব্যাংক ব্যালান্স				মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালান্স
			চলতি হিসাব	স্বল্প মেয়াদী হিসাব	দীর্ঘ মেয়াদী হিসাব	মোট ব্যাংক ব্যালান্স	
১	চলতি মাসের শেষ তারিখ ৩১-০৭-২০২৫	০.০০৫	০.৭৯৮	১২৫.৯০৪	১১৪৪.৬৬৭	১২৭১.৩৭০	১২৭১.৩৭৫
২	বিগত মাসের শেষ তারিখ ৩০-০৬-২০২৫	০.০০৪	২.১৫০	৪০০.০১২	৯৪৪.৬৫৮	১৩৪৬.৮২০	১৩৪৬.৮২৪
৩	বিগত বছরের শেষ তারিখ ৩০-০৬-২০২৫	০.০০৪	২.১৫০	৪০০.০১২	৯৪৪.৬৫৮	১৩৪৬.৮২০	১৩৪৬.৮২৪



- ২৪ -



বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের গ্যাস ও উপজাত তেল বিক্রয়

আয়-ব্যয় এবং বকেয়া পাওনার বিশ্লেষণ বিবরণী

ক্রমিক নং	মাস	গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ (এম এম সি এম)	উপজাত তেল বিক্রয়ের পরিমাণ (হাজার লিটার)	আয় (কোটি টাকায়)	ব্যয় (এসডি ভাউচসহ) (কোটি টাকায়)	বকেয়া পাওনা (কোটি টাকায়)
১	চলতি মাস জুলাই ২০২৫	১১৯.৪৭	২২,৬২৩.০৫	২২২.১৮	১৫৫.৩১	১১৫.৮৩
২	বিগত মাস জুন ২০২৫	১২০.৫১	২২,৩৬১.৫৩	২২১.৪১	১৫৫.৭৭	৯৬২.৮০
৩	কম/বেশী (বিগত মাস হতে চলতি মাস)					
ক)	পরিমাণ	-১.০৪	২৬১.৫২	০.৭৭	-০.৪৬	১৫৩.০৩
খ)	পরিমাণ হ্রাস / বৃদ্ধির শতকরা হার (%)	-০.৮৬%	১.১৭%	০.৩৫%	-০.২৯%	১৫.৮৯%
৪	বিগত বছরের জুলাই ২০২৪	১০১.১৯	১৩৬১৭.৭০	১৩৯.৭১	১৩৭.০৩	১১১৪.১০
৫	কম/বেশী (বিগত বছরের চলতি মাস হতে চলতি বছরের চলতি মাস)					
ক)	পরিমাণ	১৮.২৮	৯০০৫.৩৬	৮২.৪৭	৭৮.২৭	১.৭৩
খ)	পরিমাণ হ্রাস / বৃদ্ধির শতকরা হার (%)	১৮.০৭%	৬৬.১৩%	৫৯.০৩%	১৩.৩৪%	০.১৫%





- ১৩ -

মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

২০২৫-২০২৬ ইং অর্থ বৎসরের বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ: এমএমসিএম, মূল্য: মিলিয়ন টাকায়








মাস	তিতাস		জালান্যবাদ		বাখরাবাদ		কর্ণফুলী		পশ্চিমাঞ্চল		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
জুলাই ২৫	০.০০	০.০০	৬৪.১৯	২০৯.০৩	৪৮.১৭	১১৯.১৭	০০.০০	০.০০	১৭.১৪	৫৪.০১	১১৯.৪৭	৩৮২.২২
আগস্ট ২৫											০.০০	০.০০
সেপ্টেম্বর ২৫											০.০০	০.০০
অক্টো ২৫											০.০০	০.০০
নভে ২৬											০.০০	০.০০
ডিসে ২৫											০.০০	০.০০
জানু ২৬											০.০০	০.০০
ফেব্রু ২৬											০.০০	০.০০
মার্চ ২৬											০.০০	০.০০
এপ্রিল ২৬											০.০০	০.০০
মে ২৬											০.০০	০.০০
জুন ২৬											০.০০	০.০০
সমগ্র											০.০০	০.০০
মোট	০.০০	০.০০	৬৪.১৯	২০৯.০৩	৪৮.১৭	১১৯.১৭	০০.০০	০.০০	১৭.১৪	৫৪.০১	১১৯.৪৭	৩৮২.২২

Handwritten signature

—১৭৬—

Handwritten signature

কোম্পানির ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন চিত্র
প্রতিবেদনাধীনঃ জুলাই ২০২৫

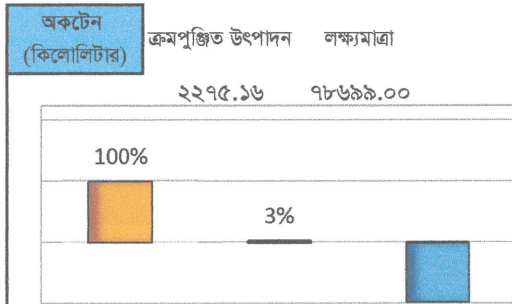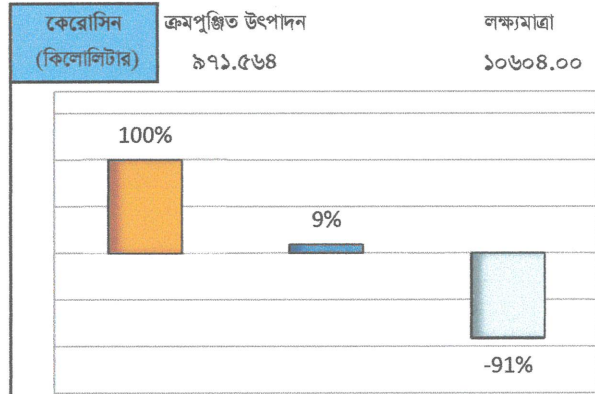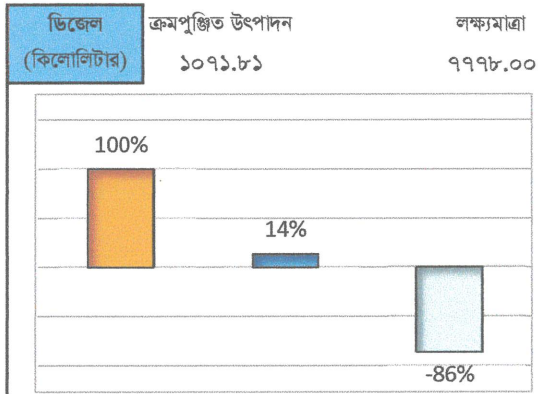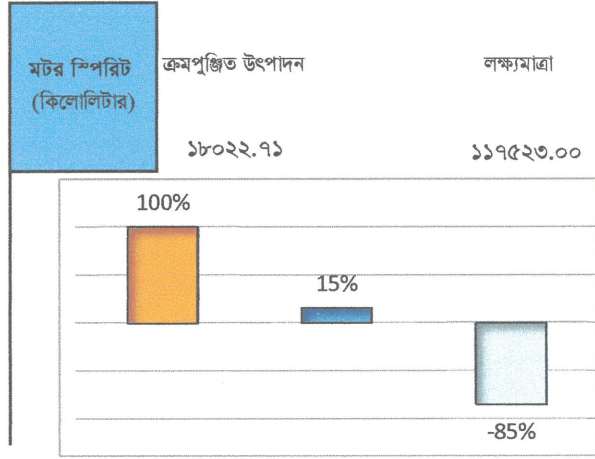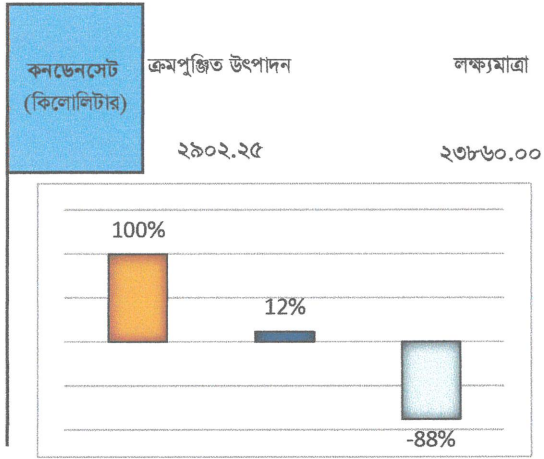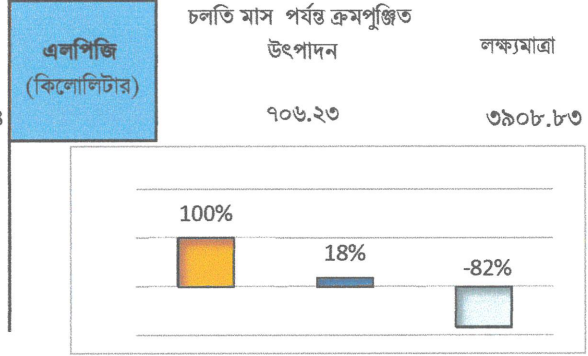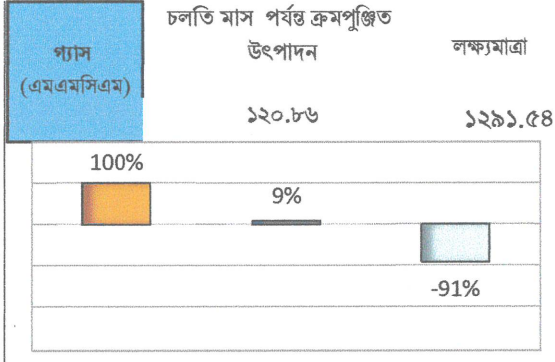

পরিচিতি









লক্ষ্যমাত্রা	
চলতি মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন-	
ঘটতি (-)/বর্ধিত (+)	

[Signature]

[Signature]

কোম্পানির ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিত বিক্রয় চিত্র

প্রতিবেদনাধীন মাস: জুলাই ২০২৫

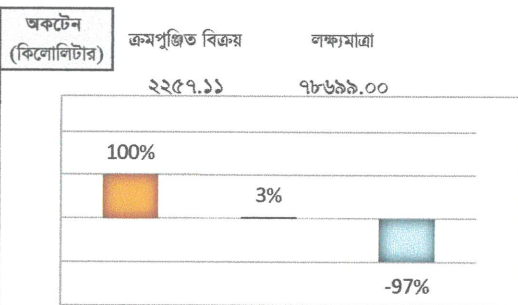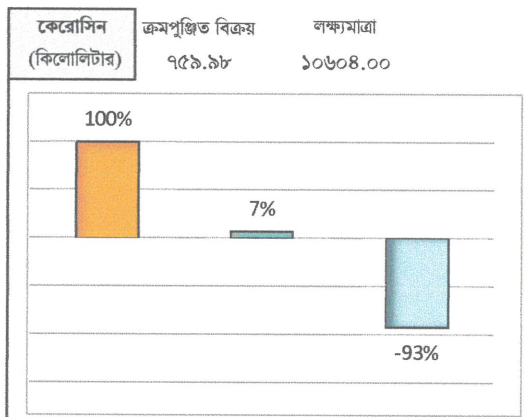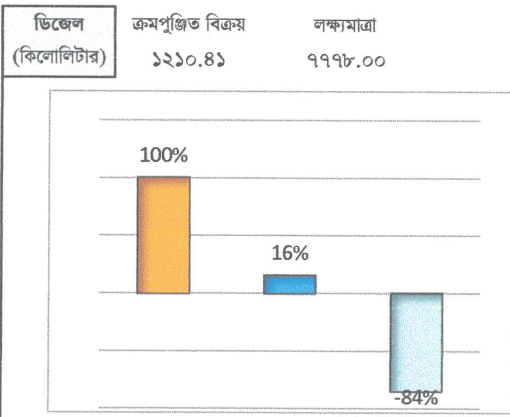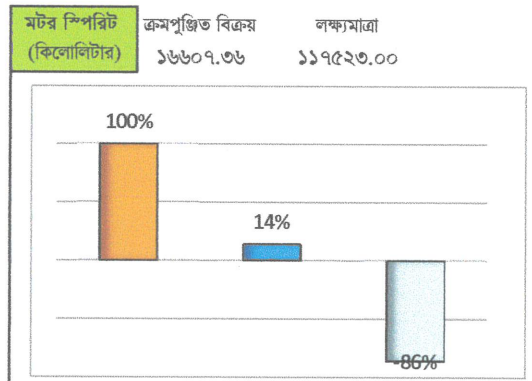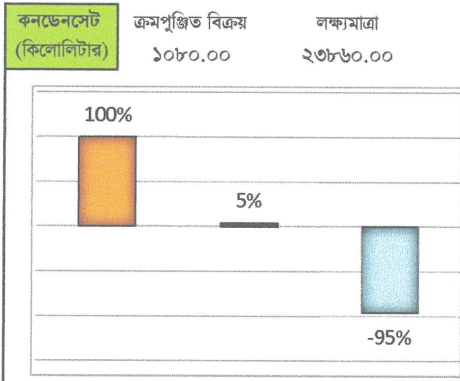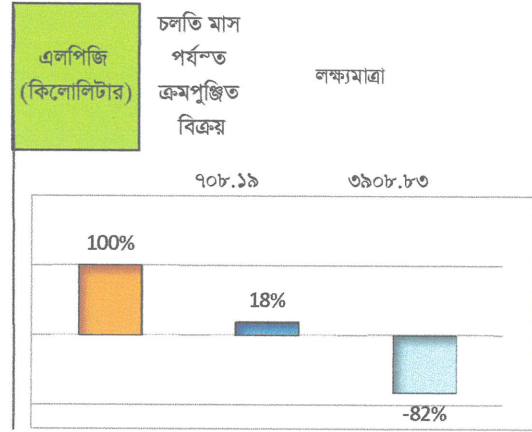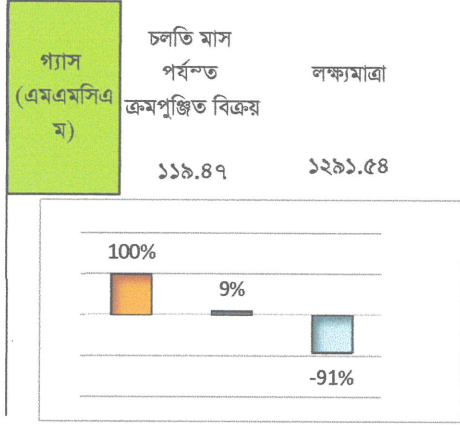

হস্তাক্ষর

-১৭-

হস্তাক্ষর

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর আওতায় ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে ২টি নিজস্ব অর্থায়নে, ২টি নিজস্ব ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) এবং ৩টি নিজস্ব ও জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসজিএফএল-এর চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুলাই ২০২৫ মাস পর্যন্ত হালনাগাদ সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

(ক) এ্যাকরেজ ব্লক- ১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প, ১ম সংশোধিত।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	এ্যাকরেজ ব্লক- ১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় গ্যাস রিজার্ভ ও রিসোর্স মূল্যায়নে অধিকতর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ভবিষ্যত গ্যাস চাহিদা মেটাতে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা; এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় (৮৬৫+১২৯=) ৯৯৪ বর্গকিলোমিটার ৩ডি সাইসমিক জরিপ পরিচালনা করা এবং কম-বেশী ৮ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত হাইড্রোকার্বন পে-জোন চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা		:	৭৯৫৭.০০			
		:	বৈদেশিক মুদ্রা		:	৩১৭১০.০০			
		:	মোট		:	৩৯৬৬৭.০০			
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: জুলাই ২০২১ সমাপ্তি: ডিসেম্বর ২০২৫						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৬-০৮-২০২১ এবং আরডিপিপি: ০৪-১১-২০২৪						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
		৩৬৫২১.৯৩	৯৭%	১২০৪.০০	০.০০	০.৫%	৩৬৫২১.৯৩	৯৭.৫%	
৭	জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৮৬৫ বর্গকিলোমিটার ৩ডি সাইসমিক ডাটা এ্যাকুইজিশন, প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশনসহ প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগের লক্ষ্যে কোম্পানি পরিচালনা পর্যদের অনুমোদনক্রমে BGP Inc, China- এর সাথে ২৯-০৬-২০২২ তারিখে চুক্তি সম্পাদন এবং ১৩-১১-২০২৪ তারিখে চুক্তি সংশোধন করা হয়েছে। এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর প্রকল্প এলাকায় সর্বমোট ৮৬৫ বর্গকিলোমিটার ডাটা এ্যাকুইজিশন, প্রসেসিং, ইন্টারপ্রিটেশন, পেট্রোফিজিক্যাল এনালাইসিস, স্ট্যাটিক ও ডাইনামিক মডেলিং, হাইড্রোকার্বন রিসোর্স এস্টিমেশন, ফিল্ড ডেভলপমেন্ট প্লান এবং ১০টি ড্রিলবল কুপ লোকেশন চিহ্নিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রসপেক্টসমূহে ১০টি অনুসন্ধান কুপ খননের লোকেশন প্রদান করেছে-তন্মধ্যে ডুপিটলা প্রসপেক্ট-এ ১টি কুপ খননের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ডুপিটলা-২, বাতচিয়া-১ ও হারারগঞ্জ-১ সহ মোট ৩টি কুপ খনন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে-যা অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত প্রসপেক্টসমূহে সর্বমোট ২৫২৯.১৯ বিসিএফ গ্যাস ও ৮৮.৬৪ মিলিয়ন ব্যারেল তেলের রিসোর্স এস্টিমেট করা হয়েছে। প্রকল্পের বর্ধিত কুড়িগাঁও (১২৯ বর্গ কি.মি) এলাকায় ২১-১১-২০২৪ তারিখ হতে সার্ভে, শর্ট-হোল ড্রিলিং ও এক্সপ্লোরেশন লোডিং শুরু করে ০৯-০১-২০২৫ তারিখে ডাটা এ্যাকুইজিশন/রেকর্ডিং সম্পন্ন করা হয়েছে। এ্যাকুইজিশন/রেকর্ডিংকৃত ডাটাসমূহ ডাউনলোড করে প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশনের জন্য চীনে অবস্থিত BGP Inc, China- এর ডাটা সেন্টার এ ১৮-০১-২০২৫ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। ০২-০৬-২০২৫ তারিখে ডাটা প্রসেসিং সম্পন্ন করা হয়েছে। এ্যাকুইজিশনকৃত ডাটার ইন্টারপ্রিটেশন/মডেলিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল বর্ধিতকরণ: ২২-০৬-২০২৫ তারিখে জাঞ্চসবি কর্তৃক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত অনুমোদিত হয়েছে।						

— ২০ —

(খ) সিলেট-১০নং কুপ (অনুসন্ধান কুপ) খনন, ১ম সংশোধিত।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট স্ট্রাকচারে নর্দান ক্রোজারে ২৫৭৬ মিটার গভীরতায় একটি অনুসন্ধান কুপ (সিলেট-১০) এবং এ কুপের আওতায় অধিকহারে গ্যাস উত্তোলনের জন্য মূল ডিপিসিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩৩০০ (± ১০০) মিটার গভীরতায় আরো একটি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কুপ (সিলেট-১০এক্স) খনন করা; সিলেট-১০ ও সিলেট-১০এক্স কুপ খনন করত: ১০৬ বিসিএফ গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি এবং প্রথম ৫ বছর দৈনিক প্রায় ৪০ (সিলেট-১০: ২০ ও সিলেট-১০এক্স: ২০) মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছর দৈনিক প্রায় ৩৫ (সিলেট-১০: ২০ ও সিলেট-১০এক্স: ১৫) মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক প্ররণ করা।																											
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধিত ডিপিসিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা : ১৩৯০১.০০ বৈদেশিক মুদ্রা : ৩৭৮০৯.০০ মোট : ৫১৭১০.০০																											
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২১ সমাপ্তি: জুন ২০২৬																											
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিসিপি: ২৩-১২-২০২১ এবং আরডিপিসিপি: ২৭-০৫-২০২৪																											
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)																											
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	<table><tr><th colspan="2">জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন</th><th rowspan="2">এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)</th><th colspan="2">২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি</th><th colspan="2">প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি</th></tr><tr><th>আর্থিক</th><th>বাস্তব</th><th>আর্থিক</th><th>বাস্তব</th><th>আর্থিক</th><th>বাস্তব</th></tr><tr><td>২৪৫৮৮.৮৮</td><td>৭১.০৭%</td><td>২৬০০৮.০০</td><td>-</td><td>১.০১%</td><td>২৪৫৮৮.৮৭</td><td>৭২.০৮%</td></tr></table>								জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	২৪৫৮৮.৮৮	৭১.০৭%	২৬০০৮.০০	-	১.০১%	২৪৫৮৮.৮৭	৭২.০৮%
জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি																									
আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব																								
২৪৫৮৮.৮৮	৭১.০৭%	২৬০০৮.০০	-	১.০১%	২৪৫৮৮.৮৭	৭২.০৮%																								
৭	জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	প্রকল্পের আওতায় ৮.৪৮১ একর জমি অধিগ্রহণ কাজ গত ২২-০৯-২০২২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। খনন ঠিকাদার নিয়োগ: সিলেট-১০নং কুপ (অনুসন্ধান কুপ) খনন প্রকল্পের আওতায় টার্ন-কি ভিত্তিতে কুপ খনন অপারেশন, মালামাল সরবরাহ, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য সিসিডিপি'র অনুমোদনক্রমে নির্বাচিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান Sinopec International Petroleum Service Corporation, China-এর সাথে ০৭-০৯-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিভুক্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ২৪-০৬-২০২৩ তারিখে খনন কাজ শুরু (স্পাড-ইন) করে ২৫৭৬ মিটার গভীরতায় খনন সমাপ্ত করা হয়েছে। কুপ খনন সম্পন্ন করে ২৬-১১-২০২৩ তারিখে ১ম ডিএসটি চলাকালীন দৈনিক ২২-২৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে ফ্লো এর বিপরীতে ওয়েলহেড প্রেসার ৩২৫০ পিএসআইজি পাওয়া গেছে। উক্ত কুপ হতে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। গত ০২-১২-২০২৩ তারিখে ২২৮৯-২৩০০ মিটার গভীরতার স্তরে ২য় ডিএসটি অপারেশন পরিচালনা করা হলে উক্ত স্তরে গ্যাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়। পরবর্তী ১৩৯৭-১৪৪৫ মিটার জোনে ০৮-১২-২০২৩ তারিখে ৩য় ডিএসটি পরিচালনা করা হয়। উক্ত জোন পরীক্ষাকালে ক্রুড অয়েলের উপস্থিতি জানা যায়। গত ১৮-১২-২০২৩ তারিখে ২২১৮-২২২৩ মিটার গভীরতায় Perforation করে ৪র্থ ডিএসটি করা হলে সেখানেও গ্যাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়। বটম ইন্টারভাল ২৫৪০-২৫৬৫ মিটার জোনের গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যে Well Completion এর কাজ গত ০৭-০২-২০২৪ তারিখে সম্পন্ন হয়। গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ: ১০ কিলোমিটার উচ্চচাপ গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান GasMin Limited, Dhaka এর সাথে ২৮-০৩-২০২৪ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ১০ কিলোমিটার গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন স্থাপন শেষে ২৭-০৪-২০২৫ তারিখে সিলেট-১০ নং কুপ হতে কম-বেশি ১০-১২.৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা হয়। বর্তমানে উক্ত কুপ হতে কম-বেশি দৈনিক ৪-৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে এবং প্রতি মিলিয়ন গ্যাসের সাথে আনুমানিক ১০-১২ ব্যারেল হারে কনডেনসেট পাওয়া যাচ্ছে।																											

- ২০ -

		বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: প্রকল্পের আওতায় সিলেট-১০নং কুপ খননে মোট তিনজন বৈদেশিক পরামর্শক প্রকল্প সাইটে কাজ করেছেন। সিলেট-১০এক্স কুপ খনন চলাকালীন সময়ে ৩ ক্যাটাগরিতে বৈদেশিক পরামর্শক সেবা গ্রহণের নিমিত্ত ১২.১২.২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। ইতোমধ্যে গত ১৪-০৭-২০২৫ ও ১৬-০৭-২০২৫ তারিখে ড্রিলিং সুপারভাইজার ও পেট্রোলিয়াম জিওলজিস্ট প্রকল্প সাইটে এসে পৌঁছেছে। সিলেট-১০এক্স নং কুপ: সিলেট-১০নং কুপটি সফলভাবে খননের মাধ্যমে কয়েকটি লেয়ারে গ্যাস ও তেলের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়ায় এ কুপের আওতায় অধিক হারে গ্যাস উত্তোলনের লক্ষ্যে ৩৩০০ (±১০০) মিটার গভীরতায় মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কুপ (সিলেট-১০এক্স) খননের জন্য প্রকল্পের ১ম সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (১ম আরডিপিপি) ২৭-০৫-২০২৪ তারিখে জালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে অনুমোদিত হয়েছে। সিলেট-১০এক্স কুপ খননের লক্ষ্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CNPC Chuangning Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), China এর সাথে ১৯-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CCDC, China কর্তৃক খনন রিগ ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক, খনন মালামাল এবং প্রয়োজনীয় জনবল খনন সাইটে মবিলাইজেশনের জন্য ২৫-০২-২০২৫ তারিখে ঠিকাদারকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CCDC, China-এর অনুকূলে ২৯-০৪-২০২৫ তারিখে Letter of Credit (LC) খোলা হয়েছে। কুপ খনন মালামালের ১ম শিপমেন্ট ২২-০৪-২০২৫ তারিখে এবং ০২-০৫-২০২৫ তারিখে রিগ ও এক্সেসরিজ, মাড কেমিক্যালস, সিমেন্ট এডিটিভস ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ সমূহের মালামাল প্রকল্প সাইটে পৌঁছেছে ও অবশিষ্ট মালামাল চট্টগ্রাম বন্দরে খালাসের জন্য অপেক্ষমান। সিলেট-১০এক্স নং কুপ খননের জন্য প্রয়োজনীয় রিগ ফাউন্ডেশন মডিফিকেশন-এর কাজ নির্বাচিত স্থানীয় ঠিকাদার মেসার্স বেলাল এন্টারপ্রাইজ এর মাধ্যমে ১৭-০৬-২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে এবং ২২-০৬-২০২৫ তারিখে সিসিডিসি, চায়না-কে প্রকল্প সাইট হস্তান্তর করা হয়েছে। ২৫-০৬-২০২৫ তারিখ থেকে হাইড্রলিক রোটোরি বোরিং রিগ মেশিনের মাধ্যমে ৩৬ ইঞ্চি হোল শুরুর করা হয় এবং ৩০ মিটার পর্যন্ত ৩০ ইঞ্চি কন্ডাকটর কেসিং স্থাপন ও সিমেন্টেশনের কাজ ০২-০৭-২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। সিলেট-১০এক্স নং কুপ খননের লক্ষ্যে ১৩-০৭-২০২৫ তারিখে রিগ-আপ করা হয়েছে। রিগ-আপ পরবর্তী প্রয়োজনীয় পরীক্ষণ শেষে ২৭-০৭-২০২৫ তারিখে (স্পাড-ইন) ২০ ইঞ্চি কেসিং রান করার জন্য ২৬ ইঞ্চি হোল খনন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল বর্ধিতকরণ: ২২-০৬-২০২৫ তারিখে জাখসবি কর্তৃক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়নকাল অক্টোবর ২০২১ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ অনুমোদিত হয়েছে।
--	--	---

(গ) সিলেট-১১নং কুপ (উন্নয়ন কুপ) ও রশিদপুর-১৩নং কুপ (অনুসন্ধান কুপ) খনন।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট ও রশিদপুর স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ২০০০ (±১০০) মিটার ও ৪২০০ (±১০০) মিটার (TVD) গভীরতায় একটি উন্নয়ন কুপ (সিলেট-১১) ও একটি অনুসন্ধান কুপ (রশিদপুর-১৩) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা;
			নতুন কুপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে সিলেট-১১ ও রশিদপুর- ১৩নং কুপ দুটি হতে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১৬ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা : ১৮২৬৭.০০
		:	বৈদেশিক মুদ্রা : ৪১৬৮৩.০০
		:	মোট : ৫৯৯৫০.০০
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: মার্চ ২০২৪ সমাপ্তি: জুন ২০২৬

— ২২ —

৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১৮-০৪-২০২৪						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
			৪৫৮.০০	১৮.১৯%	৫১৭০.০০	২৪৬.৩১	১.৮২%	৭০৪.৩১	২০.০১%
৭	জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ভূমি অধিগ্রহণ: সিলেট-১১নং কুপ (উন্নয়ন) খননের জন্য ৩.৯৩১ একর ভূমি অধিগ্রহণ করার লক্ষ্যে ২৪-১১-২০২৪ তারিখে ৪ খারা জারি করা হয়েছে। ৩-১২-২০২৪ তারিখে যৌথ তদন্ত সহ ভূমি ডিমার্কেশন করা হয়েছে। ২২-০৪-২০২৫ তারিখে ৭ খারা নোটিশ জারি করা হয়েছে। শীঘ্রই জেলা প্রশাসক, সিলেট ৩.৯৩১ একর ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ মূল্য জানিয়ে এসজিএফএল বরাবরে পত্র প্রেরণ করবে। রশিদপুর-১৩নং কুপের জন্য ৯.৭৭৮ একর (কম/বেশি) ভূমি অধিযাচনের নিমিত্ত ভূমি মন্ত্রণালয় ১৭-০৩-২০২৫ তারিখে ২ (দুই) বছরের জন্য অনুমোদন প্রদান করে জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শীঘ্রই জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ৯.৭৭৮ একর ভূমি ২ (দুই) বছরের জন্য অধিযাচন বাবদ মূল্য জানিয়ে এসজিএফএল বরাবরে পত্র প্রেরণ করবে। খনন ঠিকাদার নিয়োগ: Sinopec International Petroleum Service Corporation, China-এর মাধ্যমে টার্গ-কি ভিত্তিতে সিলেট-১১ নং (উন্নয়ন কুপ) ও রশিদপুর-১৩ নং (অনুসন্ধান কুপ) কুপ খননের লক্ষ্যে ১৫-১০-২০২৪ তারিখে এসজিএফএল-এর সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ঠিকাদারের অনুকূলে ০৬-০৪-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। খনন অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় মালামালসমূহের মধ্যে প্রায় ৯০% মালামাল ঠিকাদার কর্তৃক আমদানি করতঃ সাইটে পৌঁছেছে। অবশিষ্ট মালামাল আগামী সেপ্টেম্বর ২০২৫ মাসের মধ্যে আমদানি সম্পন্ন হবে। বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত ০৯-০১-২০২৫ তারিখে EOI (Expression of Interest) আহ্বানের বিপরীতে ৩০-০১-২০২৫ তারিখে প্রাপ্ত ৯টি আবেদনসমূহ হতে মূল্যায়নে উত্তীর্ণ ৬টি প্রতিষ্ঠানের নিকট ১৮-০৩-২০২৫ তারিখে Request for Proposal (RFP) প্রেরণ করা হয়। আহ্বানকৃত RFP অনুযায়ী ২৯-০৪-২০২৫ তারিখে দরপ্রস্তাবসমূহ গ্রহণ ও খোলা হলে ৩টি দরপ্রস্তাব পাওয়া যায়, যার কারিগরি মূল্যায়ন শেষে ২৯-০৬-২০২৫ তারিখে আর্থিক খোলা হয়েছে। আর্থিক মূল্যায়ন শেষে অনুমোদন গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজ: রশিদপুর-১৩নং কুপ খনন এলাকায় অদ্যাবধি মাটি ভরাট/ভূমি উন্নয়ন কাজের প্রায় ৯৫% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পে ১৭-০৫-২০২৫ তারিখ হতে রিগ ফাউন্ডেশন নির্মাণ কাজ এবং ২টি গভীর নলকূপ স্থাপন কাজ শুরু হয়েছে। রিগ ফাউন্ডেশন নির্মাণ কাজের মধ্যে ইতোমধ্যে সেলার নির্মাণ, মাড পাম্প বেজ নির্মাণ, জেনারেটর বেজ নির্মাণ, জেনারেটর বেজ নির্মাণ, বাল্লি-পাইলিং, ২৮টি RCC Piling এবং ২টি রিগ লেগ নির্মাণসহ রিগ ফাউন্ডেশনের ১০০% কাজ শেষ হয়েছে। সিলেট-১১নং কুপ খনন এলাকায় বর্তমানে ব্রিকস হেরিং বন্ড নির্মাণ, মাড ট্যাংক বেজ নির্মাণ, কানেকটিং স্লাব নির্মাণ এবং ২টি গভীর নলকূপ স্থাপন কাজ চলমান আছে। প্রকল্প এলাকায় 3-Phase বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পের গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ: কুপ খনন শেষে ডিল স্টিম টেস্ট (ডিএসটি) সম্পন্ন করতঃ গ্যাস প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে সিলেট-১১নং কুপের জন্য ৬ ইঞ্চি ব্যাসের ৪ কিলোমিটার গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ করা হবে। এতদলক্ষ্যে ২৩-০৭-২০২৫ তারিখে জাতীয় দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আগামী ২৭-০৮-২০২৫ তারিখে প্রাপ্তব্য দরপ্রস্তাবসমূহ গ্রহণ ও কারিগরি অংশ খোলা হবে। ইআইএ/আইইই, ডিওআই ক্রিয়ারেপ/পরিবেশ ছাড়পত্র: প্রকল্পের অনুকূলে ১৪-০১-২০২৫ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে সাইট ক্রিয়ারেপ পাওয়া গিয়াছে।						

— ২৬ —

(ঘ) কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২নং কুপ ওয়ার্কওভার প্রকল্প।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২নং কুপসমূহকে পূর্ণরায় গ্যাস উৎপাদন আনয়ন: সংশ্লিষ্ট কুপের টার্গেটেড স্যান্ডসমূহে মজুদকৃত ৭১২ বিসিএফ গ্যাসের মধ্যে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে (কৈলাশটিলা-১: ৫, রশিদপুর-৩: ১০ ও বিয়ানীবাজার-২: ৮) এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে (কৈলাশটিলা-১: ৫, রশিদপুর-৩: ৭ ও বিয়ানীবাজার-২: ৬) অর্থাৎ মোট ৭১.৭৫ বিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করে দেশের জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা : ১৬১২৯.০০ বৈদেশিক মুদ্রা : ৬২৬৬.০০ মোট : ২২৩৯৫.০০						
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: জানুয়ারি ২০২৫ সমাপ্তি: জুন ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১১-১২-২০২৪						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
			৭৫.০০	৮.২০%	১২০৮০.০০	-	৬.১৩%	৭৫.০০	১৪.৩৩%
৭	জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	মালামাল ক্রয়/সংগ্রহ: প্রকল্পের ওয়ার্কওভার বাপেক্স-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এসজিএফএল এবং বাপেক্স-এর মধ্যে ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত চুক্তি মোতাবেক ওয়ার্কওভার কাজে প্রয়োজনীয় সকল মালামাল বাপেক্স কর্তৃক প্রদান করা হবে। বৈদেশিক পরামর্শ সেবা: বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে ইওআই এর বিপরীতে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান বরাবর প্রেরিত আরএফপি দলিলসমূহ ২৯-০৬-২০২৫ তারিখে উন্মুক্ত করতঃ মূল্যায়ন কাজ ২২-০৭-২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। ২৭-০৭-২০২৫ তারিখে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রস্তাব খোলা হয়েছে, যা মূল্যায়ন কাজ চলমান রয়েছে। ইআইএ সম্পাদন: নির্বাচিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ইআইএ রিপোর্ট অনুমোদন এবং অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য ২৩-০৩-২০২৫ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর বরাবর আবেদন করা হয়েছে। ২২-০৪-২০২৫ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সাইট ভিজিট করেছেন। আবেদনপত্রটি পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশ ছাড়পত্র কমিটির ৫২৭তম সভায় ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ ছাড়পত্র অনুমোদন করা হয়েছে। ছাড়পত্রের জন্য ফি পরিশোধ করা হয়েছে। থার্ড পার্টি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস: ০৩-০৬-২০২৫ তারিখে NOA জারি করা হয়েছে এবং সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। ২৩-০৭-২০২৫ তারিখে রশিদপুর-৩নং কুপের জন্য ওয়ারারলাইন লগিং এবং ০৩-০৮-২০২৫ তারিখে ডিএসটি সার্ভিস মোবাইলাইজেশনের করার জন্য পত্র প্রদান করা হয়েছে। এলসি খোলার কাজ চলমান আছে। ওয়ার্কওভার অপারেশন সেবা ও মালামাল: প্রকল্পের ওয়ার্কওভার অপারেশন কাজ সম্পন্ন করার জন্য এসজিএফএল এবং বাপেক্স-এর মধ্যে ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক ওয়ার্কওভার অপারেশন এবং কতিপয় তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা (মোড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস, সিমেন্ট ও সিমেন্ট এডিটিভসসহ সিমেন্টেশন সার্ভিসেস, সারফেস প্রোডাকশন টেস্টিং সার্ভিসেস এবং স্লিকলাইন ইউনিট ভাড়া) এবং প্রয়োজনীয় মালামাল বাপেক্স কর্তৃক সরবরাহ করা হবে।						

— ২৪ —

		রশিদপুর-৩নং কুপের টিউবিং পুল আউট, ড্রিল স্ট্রিং রান এবং স্ক্যাপার রান সম্পন্ন হয়েছে। ৩০-০৬-২০২৫ তারিখে রিগ মাস্ট আপ করা হয়েছে এবং টিউবিং পুল আউটের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শীঘ্রই রশিদপুর-৩নং কুপের লগিং কার্যক্রম শুরু হবে। কৈলাশটিলা-১নং কুপের রিগ এবং মালামাল মোবিলাইজেশনের কাজ চলমান এবং বিয়ানীবাজার-২নং কুপের রিগ মোবিলাইজেশনের জন্য ১৫-০৭-২০২৫ তারিখে বাপেক্স বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। রিগ ফাউন্ডেশন মডিফিকেশন: প্রকল্পের রশিদপুর-৩, কৈলাশটিলা-১ এবং বিয়ানীবাজার-২নং কুপের রিগ ফাউন্ডেশন মডিফিকেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
--	--	--

(ঙ) ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-১নং কুপ (অনুসন্ধান কুপ) খনন।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডুপিটিলা ও কৈলাশটিলা স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ৩৪৬০ (±১০০) মিটার ও ৩৬০০ (±১০০) মিটার (TVD) গভীরতায় দু'টি অনুসন্ধান কুপ (ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-১) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কুপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-১নং কুপ দুটি হতে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে অর্থাৎ ১০ বছরে মোট ৫৬ বিসিএফ গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।																										
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	<table><tr><td colspan="2">স্থানীয় মুদ্রা</td><td>:</td><td colspan="2">১৯৯১২.০০</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">বৈদেশিক মুদ্রা</td><td>:</td><td colspan="2">৪৪৭৩৬.০০</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">মোট</td><td>:</td><td colspan="2">৬৪৬৪৮.০০</td><td colspan="2"></td></tr></table>						স্থানীয় মুদ্রা		:	১৯৯১২.০০				বৈদেশিক মুদ্রা		:	৪৪৭৩৬.০০				মোট		:	৬৪৬৪৮.০০			
স্থানীয় মুদ্রা		:	১৯৯১২.০০																										
বৈদেশিক মুদ্রা		:	৪৪৭৩৬.০০																										
মোট		:	৬৪৬৪৮.০০																										
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২৪ সমাপ্তি: সেপ্টেম্বর ২০২৬																										
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৭-০১-২০২৫																										
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি																										
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	<table><tr><td colspan="2">জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন</td><td rowspan="2">এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)</td><td colspan="2">২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি</td><td colspan="2">প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি</td></tr><tr><td>আর্থিক</td><td>বাস্তব</td><td>আর্থিক</td><td>বাস্তব</td><td>আর্থিক</td><td>বাস্তব</td></tr><tr><td>১০.০০</td><td>৫.৩৬%</td><td>১৬৮৮৭.০০</td><td>-</td><td>০.৯২%</td><td>১০.০০</td><td>৬.২৮%</td></tr></table>						জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	১০.০০	৫.৩৬%	১৬৮৮৭.০০	-	০.৯২%	১০.০০	৬.২৮%	
জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি																								
আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব																							
১০.০০	৫.৩৬%	১৬৮৮৭.০০	-	০.৯২%	১০.০০	৬.২৮%																							
৭	জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	পরিবেশের অবস্থানগত ছাড়পত্র: কৈলাশটিলা-১নং কুপ (অনুসন্ধান কুপ) খননের লক্ষ্যে ০৯-০৪-২০২৪ তারিখে এবং ডুপিটিলা-১নং কুপ (অনুসন্ধান কুপ) খননের লক্ষ্যে ১১-০৭-২০২৪ তারিখে পরিবেশের অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়। ভূমি অধিগ্রহণ: কৈলাশটিলা-১নং কুপের খননস্থল উন্নয়ন ও সংযোগ রাস্তা নির্মাণের জন্য ৬.০৩৫ একর ভূমি হকুমদখলে লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট ২০-০৩-২০২৫ তারিখে কৈলাশটিলা-১নং কুপের ভূমি হকুমদখলের সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করেছে এবং ২৯-০৪-২০২৫ তারিখে কৈলাশটিলা-১নং কুপের ভূমি হকুমদখলের বিষয়ে জেলা ভূমি অধিগ্রহণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৮-০৬-২০২৫ তারিখে জেলা ভূমি অধিগ্রহণ কমিটির সভায় কৈলাশটিলা-১নং কুপের ভূমি হকুমদখল প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট হতে কৈলাশটিলা-১নং কুপের জন্য সৃজিত এলএ মামলা নম্বর ০১/২০২৪-২৫ এর হালনাগাদ রেকর্ড সরবরাহের নিমিত্ত সহকারী কমিশনার (ভূমি), গোলাপগঞ্জ, সিলেট-এ ১৩-০৭-২০২৫ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ডুপিটিলা-১নং কুপের খননস্থল উন্নয়ন ও সংযোগ রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যে ৭.৮২৩ একর ভূমি হকুমদখলের জন্য ৩০-০৪-২০২৫ তারিখে ডুপিটিলা-১নং কুপের ভূমি হকুমদখলের সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করেছে এবং ১৮-০৬-২০২৫ তারিখে ডুপিটিলা-১নং কুপের ভূমি হকুমদখলের বিষয়ে জেলা ভূমি অধিগ্রহণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠিত জেলা ভূমি অধিগ্রহণ কমিটির সভায় প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক রাস্তার জমি পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে অধিগ্রহণ করার শর্তে ডুপিটিলা-																										

— ২৫ —

		১নং কূপের ভূমি হকুমদখল প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট হতে ডুপিটলা-১নং কূপের জন্য সৃজিত এলএ মামলা নম্বর ০২/২০২৪-২৫ এর হালনাগাদ রেকর্ড সরবরাহের নিমিত্ত সহকারী কমিশনার (ভূমি), জৈন্তাপুর, সিলেট-এ ১৩-০৭-২০২৫ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। খনন ঠিকাদার নিয়োগ: “রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন” এবং “ডুপিটলা-১নং কূপ ও কৈলাশটলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন” শীর্ষক প্রকল্পসমূহের আওতায় উল্লেখিত কূপসমূহ খননের লক্ষ্যে Turn-key ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে ১৫-০২-২০২৫ তারিখে খসড়া চুক্তিপত্রের ওপর আইনি মতামতের জন্য আইন বিশেষজ্ঞ-এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও কারিগরি মূল্যায়নে উত্তীর্ণ দু’টি দরদাতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আর্থিক মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য ও সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান CNPC Chuangqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC)-এর সাথে ২৭-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০-০৫-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ: “সিলেট-১২ নং কূপ (তেল কূপ) খনন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় তেল কূপটি খননের লক্ষ্যে দরপত্র প্রণয়নের কাজে ড্রিলিং সুপারভাইজার ক্যাটাগরীতে এবং “সিলেট-১২ নং কূপ (তেল কূপ) খনন”, “সিলেট-১১ নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন” ও “ডুপিটলা-১ ও কৈলাশটলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন” শীর্ষক প্রকল্পসমূহের আওতায় ৫টি কূপ খনন কাজে বৈদেশিক পরামর্শক [(খনন সুপারভাইজার, পেট্রোলিয়াম জিওলজিস্ট এবং পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার (কমপ্লিশন)] সেবা গ্রহণের নিমিত্ত আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে আগ্রহী আবেদনকারীদের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়নের নিমিত্ত প্রণীত আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ সম্বলিত Request for Expression of Interest (REOI) ০৯-০১-২০২৫ তারিখে চারটি দৈনিক পত্রিকা এবং এসজিএফএল, পেট্রোবাংলা ও বিপিপিএ-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত REOI এর বিপরীতে ৩০-০১-২০২৫ তারিখে মোট ০৯(নয়)টি EOI পাওয়া যায়। EOI মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও প্রণীত RFP Document ১৫-০৩-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির বোর্ড সভায় অনুমোদিত হলে কমিটির মূল্যায়নে Shortlisted ০৬(ছয়)টি প্রতিষ্ঠানের নিকট ১৮-০৩-২০২৫ তারিখে RFP Document প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরিত RFP Document অনুযায়ী ২৯-০৪-২০২৫ তারিখে দাখিল ও উন্মুক্ত করা হলে ৩টি দরপ্রস্তাব পাওয়া যায়, যার মূল্যায়ন কাজ শেষ হয়েছে। কারিগরি মূল্যায়নে উত্তীর্ণ ০৩টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রস্তাব ২৯-০৬-২০২৫ তারিখে খোলা হয়েছে এবং ৩০-০৬-২০২৫ তারিখে আর্থিক মূল্যায়ন শেষ করা হয়েছে। চুক্তি সম্পাদনের জন্য ২৩-০৭-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালক পর্যদের অনুমোদন নেয়া হয়েছে।
--	--	---

(চ) রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রশিদপুর স্ট্রাকচারে ২৯০০ (±১০০) মিটার গভীরতায় একটি অনুসন্ধান কূপ (রশিদপুর-১১) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে ২৯.৪৯ বিসিএফ গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি করা এবং প্রথম ৩ বছরে দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।	
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা	৭৫১৮.০০
		:	বৈদেশিক মুদ্রা	১৯৬৬৯.০০
		:	মোট	২৭১৮৭.০০
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২৪ সমাপ্তি: জুন ২০২৬	
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১৪-০১-২০২৫	

— ২৬ —

৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি					
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন' ২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ-বছরের জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	
			৩১.০০	০.১৩%	৮৩৮৪.০০	-	১০.৫৮%	৩১.০০ ১০.৭১%
৭	জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ভূমি অধিগ্রহণ: প্রকল্পের কাজে ৮.৩৮৭ একর ভূমি অধিযাচনের লক্ষ্যে অধিযাচন সংক্রান্ত সকল নথি ২৭-০২-২০২৫ তারিখে জেলা প্রশাসক হবিগঞ্জের এলএ শাখা কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ২৩-০৩-২০২৫ তারিখে ভূমি মালিকদের পাওনা অর্থ পরিশোধের শর্তে ২ বছরের জন্য হকুম দখলের নিমিত্তে অনুমোদন পাওয়া যায়। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ২৩-০৪-২০২৫ তারিখে এল শাখার সার্ভেয়ার কর্তৃক নির্ধারিত ভূমির সীমানা ২ (দুই) বছরের জন্য বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজ: প্রকল্পে ২৯-০৫-২০২৫ তারিখ থেকে ভূমি উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। চলতি বর্ষা মৌসুমে প্রকল্প এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে ভূমি উন্নয়ন কাজ কিছুটা ব্যাহত হয়। বর্তমানে ভূমি উন্নয়নের কাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে। প্রায় ৭০০ মিটার এইচবিবি রোড নির্মাণ শেষ হয়েছে। তাছাড়া, কাল-ভার্ট নির্মাণ, মাঠের চারপাশে সারফেস ড্রেইন ও ফেলিং নির্মাণ, মাড-পিট খনন ইত্যাদি কাজ চলমান আছে। খনন ঠিকাদার নিয়োগ: “রশিদপুর-১১নং কুপ (অনুসন্ধান কুপ) খনন” এবং “ডুপিটিলা-১নং কুপ ও কৈলাশটিলা-৯নং কুপ (অনুসন্ধান কুপ) খনন” শীর্ষক প্রকল্পসমূহের আওতায় উল্লিখিত কুপসমূহ খননের লক্ষ্যে Turn-key ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদনের লক্ষে ১৫-০২-২০২৫ তারিখে খসড়া চুক্তিপত্রের ওপর আইনি মতামতের জন্য আইন বিশেষজ্ঞ-এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও কারিগরি মূল্যায়নে উত্তীর্ণ দু'টি দরদাতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আর্থিক মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য ও সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC)-এর সাথে ২৭-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০-০৫-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত Rich Spread Group Limited, China এর সাথে ৭-১১-২০২১ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তির মেয়াদ ৩১-১২-২০২৫ তারিখে উত্তীর্ণ হবে। তাই ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সংশোধন করে মেয়াদ ৩০-০৬-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইআইএ/আইইই, ডিওআই ক্লিয়ারেন্স/পরিবেশ ছাড়পত্র: পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের অনুকূলে ১১/০৬/২০২৪ তারিখে এক বছরের জন্য Site Clearance ছাড়পত্র পাওয়া গেছে, যার মেয়াদ ১১-০৬-২০২৫ তারিখে উত্তীর্ণ হয়েছে। পরিবেশ ছাড়পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য ২৯-০৪-২০২৫ তারিখে পুনরায় আবেদন করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের অনুকূলে ইস্যুকৃত Site Clearance এর মেয়াদ ১০/০৬/২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।					

(ছে) সিলেট-১২ নং কুপ খনন (তেল কুপ)।








১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	তেল উৎপাদনের লক্ষ্যে সিলেট স্ট্রাকচারের নর্দান ক্রোজারে ২৪৯১ (± ৫০) মিটার গভীরতায় ২৪ মাসে একটি তেল কুপ (সিলেট-১২) খনন করা; সিলেট-১২নং তেল কুপ খনন করত: ১০ বছর দৈনিক প্রায় ৮০০ ব্যারেল হারে তেল উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।	
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা	: ৫৭৪৩.০০
			বৈদেশিক মুদ্রা	: ১৯৭৮২.০০
			মোট	: ২৫৫২৫.০০
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: জানুয়ারি ২০২৫ সমাপ্তি: ডিসেম্বর ২০২৬	

— ২৭ —

৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২২-০২-২০২৫						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
			-	৬.০৭%	২১৪.০০	১৩.৯২	১.০২%	১৩.৯২	৭.০৯%
৭	জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	বৈদেশিক পরামর্শক সেবা : তিন ক্যাটাগরির বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে কিউসিবিএস পদ্ধতিতে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ২৪-০৬-২০২৫ তারিখে এসজিএফএল বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ২৯-০৬-২০২৫ তারিখে আর্থিক প্রস্তাব খোলা হয়েছে এবং ৩০-০৬-২০২৫ তারিখে আর্থিক মূল্যায়ন শেষ হয়েছে। চুক্তি সম্পাদনের জন্য ২৩-০৭-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এসজিএফএল-এর পরিচালক পর্যদের অনুমোদন পাওয়া যায়। ভূমি অধিগ্রহণ: প্রকল্পের আওতায় ২.০০ (দুই) একর ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসমূহ প্রস্তুত করা হয় এবং প্রকল্প অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ প্রাপ্তির সাথে সাথেই ২৩-০২-২০২৫ তারিখে পূর্ণাঙ্গ অধিগ্রহণ প্রস্তাব সিলেট ডিসি অফিসে প্রেরণ করা হয়। পেট্রোবাংলার ১০০টি কুপ খনন সংক্রান্ত কমিটির সিদ্ধান্ত/ সুপারিশ এর প্রেক্ষিতে বাপেক্স এর সহায়তায় রিভিউতে হালনাগাদকৃত প্রস্তাবিত ১ লোকেশনে খননস্থান সরেজমিনে চিহ্নিত করায় নতুনভাবে প্রায় ৯.০ একর ভূমি অধিগ্রহণ অনুমোদনের লক্ষ্যে ৩০-০৬-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পিআইসি সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় পূর্বের তুলনায় অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়টি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC)-এর ২৭-০৫-২০২৫ তারিখের সভায় এবং প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি (PSC)-এর ৩০-০৬-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদিত হয়েছে। গত ১৩-০৭-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত এসজিএফএল পরিচালক পর্যদের ৬৬০ তম সভায় “সিলেট-১২নং কুপ খনন (তেল কুপ)” শীর্ষক প্রকল্পের জন্য পূর্বের ২ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব বাতিলপূর্বক সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলাধীন খাগড়া হাওড় ১ম খন্ড মৌজায় ৯ (নয়) একর ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণের নিমিত্ত পেট্রোবাংলায় পত্র প্রেরণের অনুমোদন দেওয়া হয়। সে অনুযায়ী পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পরিবেশগত ছাড়পত্র: প্রকল্পের অনুকূলে ২০-০৮-২০২৪ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া গিয়াছে। কুপ খননের লোকেশন চিহ্নিতকরণ: পেট্রোবাংলার ১০০টি কুপ খনন সংক্রান্ত কমিটির সিদ্ধান্ত/ সুপারিশ এর প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত ১ লোকেশনে যাচাইপূর্বক খননস্থান সরেজমিনে চিহ্নিতকরণের অনুরোধ জানিয়ে ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে বাপেক্স বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বাপেক্স কর্তৃক ১৫-০৫-২০২৫ তারিখে সরেজমিনে খনন লোকেশন চিহ্নিত করা হয়েছে। জিটিও প্রণয়ন: কুপ-এর হালনাগাদকৃত খনন লোকেশন সরেজমিনে চিহ্নিত করার পর বাপেক্স হতে কুপ খননের চূড়ান্ত জিটিও প্রণয়ন কাজ চলমান রয়েছে। খনন ঠিকাদার নিয়োগ : সিলেট-১২নং কুপ খনন (তেল কুপ) প্রকল্পের আওতায় টার্ন-কি ভিত্তিতে কুপ খনন অপারেশন, মালামাল সরবরাহ, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র দলিল প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শকের মাধ্যমে উক্ত দরপত্র দলিল চূড়ান্ত করে দরপত্র আহ্বান করা হবে।						

— ২৮ —

কোম্পানির চলমান প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত

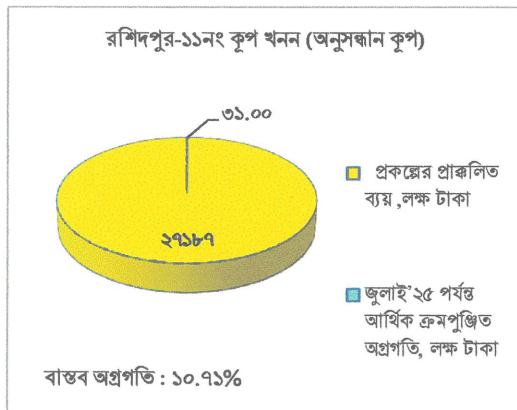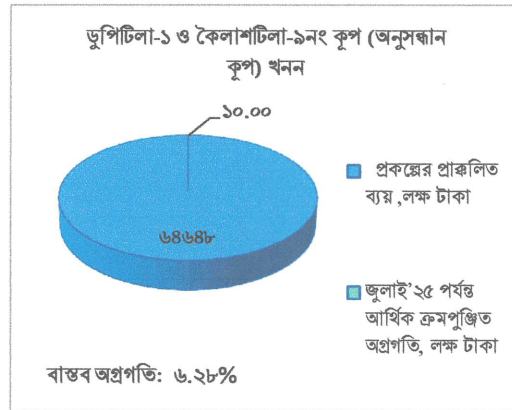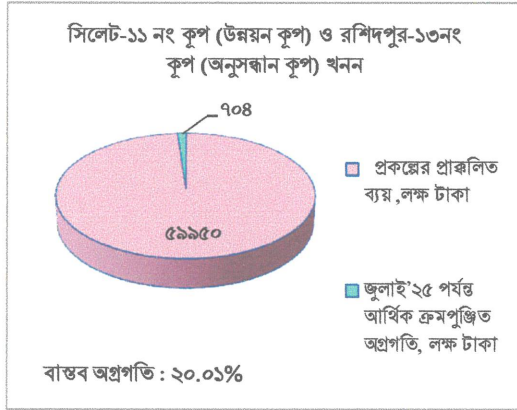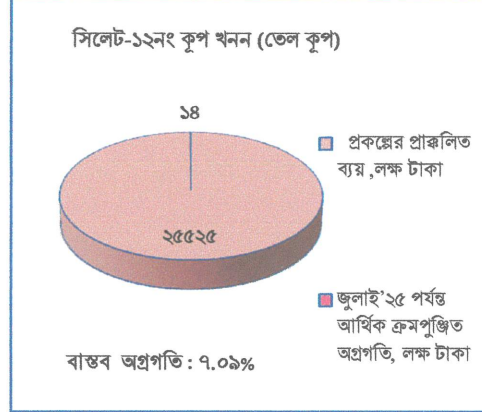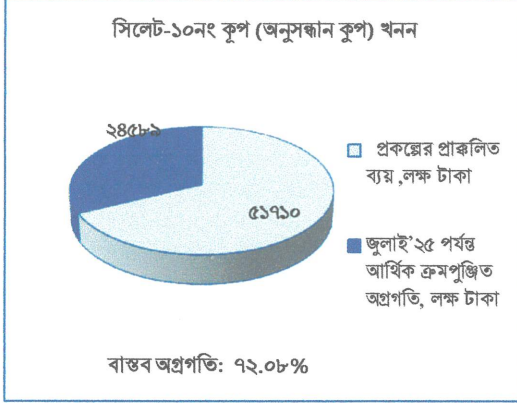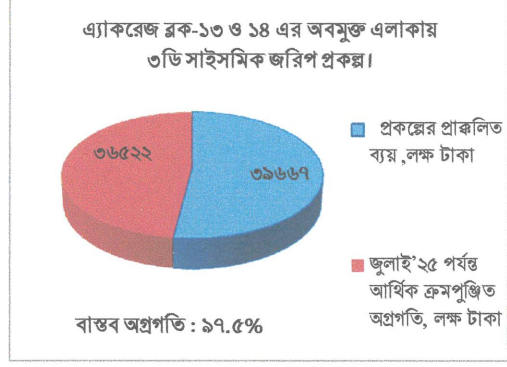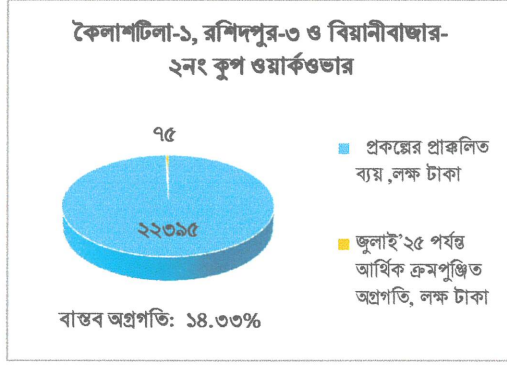

উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট

জুলাই ২০২৫

উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট :

- ক) উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড : ১) ২৭/০৭/২০২৫ তারিখে সিলেট-১০এক্স নং কৃপ খননের স্পাড ইন করা হয়েছে।
- খ) আগামী দুই মাসে সম্পাদিতব্য গুরুত্বপূর্ণ : নাই।
কাজের তালিকা।
- গ) আগামী দুই মাসে বড় রকমের কোন : নাই।
সমস্যা/সংকটের আশঙ্কা করা হলে তার
বিবরণ



— ৬০ —



জনবলের পরিসংখ্যান

মাসের নাম : জুলাই ২০২৫

জনবলের পরিসংখ্যান :

১। কর্মকর্তা

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫	কর্মরত পদের সংখ্যা
১।	৭৮০০০ (নির্ধারিত)	-
২।	৬৬০০০-৬৮৪৮০-৭১০৫০-৭৩৭২০-৭৬৪৯০	-
৩।	৫৫৫০০-৫৮৭৬০-৬১১২০-৬৩৫৭০-৬৬১২০-৬৮৭৭০-৭১৫৩০-৭৪৪০০	৯
৪।	৫০০০০-৫২০০০-৫৪০৮০-৫৬২৫০-৫৮৫০০-৬০৮৪০-৬৩২৮০-৬৫৮২০-৬৮৪৬০-৭১২০০	৭০
৫।	৪৩০০০-৪৪৯৪০-৪৬৯৭০-৪৯০৯০-৫১৩০০-৫৩৬১০-৫৬০৩০-৫৮৫৬০-৬১২০০-৬৩৯৬০-৬৬৮৪০-৬৯৮৫০	৬৫
৬।	৩৫৫০০-৩৭২৮০-৩৯১৫০-৪১১১০-৪৩১৭০-৪৫৩৩০-৪৭৬০০-৪৯৯৮০-৫২৪৮০-৫৫১১০-৫৭৮৭০-৬০৭৭০-৬৩৮১০-৬৭০১০	৪৮
৭।	২৯০০০-৩০৪৫০-৩১৯৮০-৩৩৫৮০-৩৫২৬০-৩৭০৩০-৩৮৮৯০-৪০৮৪০-৪২৮৯০-৪৫০৪০-৪৭৩০০-৪৯৬৭০-৫২১৬০-৫৪৭৭০-৫৭৫১০-৬০৩৯০-৬৩৪১০	-
৮।	২৩০০০-২৪১৫০-২৫৩৬০-২৬৬৩০-২৭৯৭০-২৯৩৭০-৩০৮৪০-৩২৩৯০-৩৪০১০-৩৫৭২০-৩৭৫১০-৩৯৩৯০-৪১৩৬০-৪৩৪৩০-৪৫৬১০-৪৭৯০০-৫০৩০০-৫২৮২০-৫৫৪৭০	২
৯।	২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০	৯৮
১০।	১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০	৩৮
মোট কর্মকর্তা :		৩৩০

২। কর্মচারী

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫	কর্মরত পদের সংখ্যা
১।	২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০	০০
২।	১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০	০০
৩।	১২৫০০-১৩১৩০-১৩৭৯০-১৪৪৮০-১৫২১০-১৫৯৮০-১৬৭৮০-১৭৬২০-১৮৫১০-১৯৪৪০-২০৪২০-২১৪৫০-২২৫৩০-২৩৬৬০-২৪৮৫০-২৬১০০-২৭৪১০-২৮৭৯০-৩০২৩০	০৭
৪।	১১৩০০-১১৮৭০-১২৪৭০-১৩১০০-১৩৭৬০-১৪৪৫০-১৫১৮০-১৫৯৪০-১৬৭৪০-১৭৫৮০-১৮৪৬০-১৯৩৯০-২০৩৬০-২১৩৮০-২২৪৫০-২৩৫৮০-২৪৭৬০-২৬০০০-২৭৩০০	২৪
৫।	১১০০০-১১৫৫০-১২১৩০-১২৭৪০-১৩৩৮০-১৪০৫০-১৪৭৬০-১৫৫০০-১৬২৮০-১৭১০০-১৭৯৬০-১৮৮৬০-১৯৮১০-২০৮১০-২১৮৬০-২২৯৬০-২৪১১০-২৫৩২০-২৬৫৯০	৬৫
৬।	১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০-২১৩১০-২২৩৮০-২৩৫০০-২৪৬৮০	২৯
৭।	৯৭০০-১০১৯০-১০৭০০-১১২৪০-১১৮১০-১২৪১০-১৩০৪০-১৩৭০০-১৪৩৯০-১৫১১০-১৫৮৭০-১৬৬৭০-১৭৫১০-১৮৩৯০-১৯৩১০-২০২৮০-২১৩০০-২২৩৭০-২৩৪৯০	০৩
৮।	৯৩০০-৯৭৭০-১০২৬০-১০৭৮০-১১৩২০-১১৮৯০-১২৪৯০-১৩১২০-১৩৭৮০-১৪৪৭০-১৫২০০-১৫৯৬০-১৬৭৬০-১৭৬০০-১৮৪৮০-১৯৪১০-২০৩৯০-২১৪১০-২২৪৯০	৪৭
৯।	৯০০০-৯৪৫০-৯৯৩০-১০৪৩০-১০৯৬০-১১৫১০-১২০৯০-১২৭০০-১৩৩৪০-১৪০১০-১৪৭২০-১৫৪৬০-১৬২৪০-১৭০৬০-১৭৯২০-১৮৮২০-১৯৭৭০-২০৭৬০-২১৮০০	০১
১০।	৮৮০০-৯২৪০-৯৭১০-১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০	০
১১।	৮৫০০-৮৯৩০-৯৩৮০-৯৮৫০-১০৩৫০-১০৮৭০-১১৪২০-১২০০০-১২৬০০-১৩২৩০-১৩৯০০-১৪৬০০-১৫৩৩০-১৬১০০-১৬৯১০-১৭৭৬০-১৮৬৫০-১৯৫৯০-২০৫৭০	০
১২।	৮২৫০-৮৬৭০-৯১১০-৯৫৭০-১০০৫০-১০৫৬০-১১০৯০-১১৬৫০-১২২৪০-১২৮৬০-১৩৫১০-১৪১৯০-১৪৯০০-১৫৬৫০-১৬৪৪০-১৭২৭০-১৮১৪০-১৯০৫০-২০০১০	০২
মোট কর্মচারী :		১৭৮
মোট কর্মকর্তা এবং কর্মচারী (৩৩০+১৭৮) :		৫০৮ জন

১ জন কর্মকর্তা ও ২ জন কর্মচারীর অবসরজনিত কারণে গত মাসের প্রতিবেদনের সাথে প্রতিবেদনাবীন মাসে জনবলের সংখ্যার তারতম্য হয়েছে।

— ৬২ —
