



বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২৫-২৬

বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত



**২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির
বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত**

- মোট প্রকল্প সংখ্যা : ৩৮টি
- বিনিয়োগ প্রকল্প : ৩৫টি
- কারিগরি সহায়তা প্রকল্প : ০৩টি

(কোটি টাকায়)

	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	২০২৫-২৬ অর্থ বছরে বরাদ্দের তুলনায় সেপ্টেম্বর ২০২৫ মাস পর্যন্ত অগ্রগতির হার
মোট	৩৫৩৩.৫৩	১১৭৭.৮২	২৯৭.৯৬	৮.৪৩%
জিওবি	১৪৪৬.৮৯	৩৪৬.৮১	২১১.৮৫	১৪.৬৪%
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	২০৮৬.৬৪	৮৩১.০১	৮৬.১১	৪.১৩%

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প।
মেয়াদ কাল:	:	(জানুয়ারি ১৮ খ্রিঃ - ডিসেম্বর'২৫ খ্রিঃ)।
প্রকল্প পরিচালক:	:	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মিয়া।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিবেশগত স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ৩২টি পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	৬৩২৭৯.৫২০
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ (অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	গ্রাউন্ড ওয়াটার ড্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট - ৮ টি পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন-১৬২ টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন-৭৬ টি গ্রাউন্ড ওয়াটার ড্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট -৮ টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ-১৬২ টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ-৪৫৮ টি
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি -১২.০০
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি -৮২.৫০

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।
মেয়াদ কাল:	:	(০১ জুলাই ২০১৯খ্রিঃ - ডিসেম্বর'২৬ খ্রিঃ)।
প্রকল্প পরিচালক:	:	মুন্সী মোঃ হাচানুজ্জামান।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে, নিরাপদ পানি সরবরাহ, নিশ্চিত করার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন পানি পরীক্ষাগারের সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	১৭৮৫৬.১৪।
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ (অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	নতুন পরীক্ষাগার এর নিমিত্ত বিদ্যমান ভবন সম্প্রসারণ- ৫২ টি পরীক্ষাগার এর যন্ত্রপাতিক্রয় -৫২ সেট
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি -১৫.০০
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি -৯০.০০

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প।
মেয়াদ কাল:	:	(জানুয়ারি ২০ খ্রিঃ – জুন ২০২৬ খ্রিঃ)।
প্রকল্প পরিচালক:	:	মোঃ হানিফ।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	সমগ্রদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগনের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন।
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	৮৮৫০৭৩.৮৭।
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ (অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	অগভীর নলকূপ-৮৫১৭০ টি গভীর নলকূপ-১৫৮৫৮৫ টি সাবমার্সিবল পাম্প ও জলাধার সহ গভীর নলকূপ-২৩৭৭৬২ টি রেইন ওয়াটার হারভেসটিং ইউনিট-২০৬১৯ টি আর্সেনিক আয়রন রিমুভাল প্লান্ট-২৯৫৭০ টি কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট-১০৬১০ টি
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি -৩০.০০
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি -৭৬.২০

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	কুলাউড়া ও গোপালগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প।
মেয়াদ কাল:	:	(জানুয়ারি ২০ খ্রিঃ – জুন ২৫ খ্রিঃ)।
প্রকল্প পরিচালক:	:	মুহাম্মদ শেখ সাদী রহমতুল্লাহ।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্প এলাকা দুটিতে পাইপবাহিত নিরাপদ পানি ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	৪৬০৮.১১
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ (অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	পাইপ লাইন (বিভিন্ন মি.মি.) – ৩৬ কি.মি. মিটার সহ গৃহ সংযোগ -১০০০ টি পাবলিক টয়লেট-৪ টি ফিক্যুঅল স্ল্যাজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ও সলিড ওয়েস্ট ল্যান্ডফিল সিস্টেম নির্মাণ- ২ টি
বাস্তব অগ্রগতি	:	এডিপি অগ্রগতি – ০.০০
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি -২২.০০

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	বান্দরবান পৌরসভা এবং বান্দরবান জেলার ৩টি উপজেলা সদরসহ পাশ্চবর্তী এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
মেয়াদ কাল:	:	(জুলাই'২০খ্রিঃ - জুন'২৬খ্রিঃ)।
প্রকল্প পরিচালক:	:	জনাব অনুপম দে।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন।
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	৪৪২৫.০০
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ (অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	বিতরন পাইপ লাইন স্থাপন- ২১ কি.মি. গৃহ সংযোগ-৩০০০ টি পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন-৮ টি পাবলিক টয়লেট-১৫
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি-৪০.০০
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি-৮৪.৯৮

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	টাঙ্গাইল পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।
মেয়াদ কাল:	:	(জানুয়ারি'২০২১-ডিসেম্বর'২০২৫)
প্রকল্প পরিচালক:	:	জনাব মোঃ ইবনে মাজাজ প্রামানিক
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	উৎপাদক নলকূপ ও গ্রাউন্ড ওয়াটার ড্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ করে পৌরসভার পাইপলাইন ভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে টাঙ্গাইল পৌরসভার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	৪৯০২.২০
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ (অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	পরীক্ষামূলক নলকূপ-২০ টি উৎপাদন নলকূপ-১০ টি গ্রাউন্ড ওয়াটার ড্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ-২ টি গৃহ সংযোগ-২০০০ টি
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি- ৫.০০
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি- ৮.৫০

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	ঠাকুরগাঁও পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।
মেয়াদ কাল:	:	(অক্টোবর'২০২১-জুন'২০২৫)
প্রকল্প পরিচালক:	:	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও পৌরসভায় বসবাসরত জনগনের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়নে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	৪৯৯৮.৯০
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ(অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন-৮ টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন- ৪ টি গৃহ সংযোগ-২০০০ টি
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি-০.০০
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি-৯৫

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।
মেয়াদ কাল:	:	(অক্টোবর'২১খ্রিঃ-ডিসেম্বর'২০২৫) (প্রস্তাবিত)
প্রকল্প পরিচালক:	:	পঙ্কজ কুমার সাহা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার পল্লী এলাকার বসবাসরত জনগনের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	৪৪৩৫.২১
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ(অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	কমিউনিটি ল্যাট্রিন – ৯৮ টি অফসেট টুইনপিট ল্যাট্রিন -৯০৪ টি সাবমার্সিবল পাম্প ও জলাধারসহ অগভীর নলকূপ-৪৫০ টি ৬ নং গভীর নলকূপ-১৮০ টি
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি- ৩৭.২৪
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি-৮৪.৫৭

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	মাদারীপুর জেলার শিবচর পৌরসভা এবং শিবচর উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।
মেয়াদ কাল:	:	(জানুয়ারি'২২খ্রিঃ-ডিসেম্বর'২৫) (প্রস্তাবিত)।
প্রকল্প পরিচালক:	:	জনাব সরদার শামসুল ইসলাম।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে মাদারীপুর জেলার শিবচর পৌরসভা ও উপজেলায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	৪৫১৪.০৯
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ(অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন – ৪ টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন-২ টি গৃহ সংযোগ-১০০০ টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ-৫টি সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা-১ টি
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি -০.০০।
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি – ৮৮.০০।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	খুলনা জেলার পাইকগাছা ও কয়রা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।
মেয়াদ কাল:	:	((জানুয়ারি' ২২খ্রিঃ-জুন' ২৫খ্রিঃ))।
প্রকল্প পরিচালক:	:	জনাব মোঃ মঈনুল হাসান।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	১. গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে এলাকাসীরা সুপেয় পানির চাহিদা পূরণ। ২. রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে হাউজহোল্ড ভিত্তিক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ। ৩. রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণকে লবনমুক্ত নিরাপদ পানি সহায়তা করা। ৪. প্রকল্প এলাকার বাজার ও সাময়িক প্রতিষ্ঠানসমূহে পাবলিক টয়লেট স্থাপনের মাধ্যমে স্যানিটেশন ব্যবস্থা সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন।
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	৩৪৭৯.৫৬০
প্রধান প্রধান অংকা সমূহ(অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	গভীর নলকূপ-৪৫০ টি পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন-৩৪ টি রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং-৫২৫০ টি পাবলিক টয়লেট-১৪ টি
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি – ১০০.০০
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি - ১০০.০০

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ, মদন ও খালিয়াজুরী উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।
মেয়াদ কাল:	:	(জানুয়ারি ২২ খ্রিঃ - ডিসেম্বর'২৫ খ্রিঃ)।
প্রকল্প পরিচালক:	:	(জানুয়ারি'২২খ্রিঃ - ডিসেম্বর'২৫খ্রিঃ)
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) হাওর এলাকার পরিবেশগত স্যানিটেশন সুবিধার মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। খ) নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানি বাহিত রোগ ব্যাধি কমিয়ে আনা।
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	২১৮১.৩২
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ (অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	গভীর নলকূপ-৩০০ টি সাবমার্সিবল পাম্প ও জলাধারসহ গভীর নলকূপ-৪০০ টি পাবলিক টয়লেট-১০ টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন-২২ টি
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি – ৮০.০০
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি – ৯০.০০

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	নরসিংদী জেলার মনোহরদী পৌরসভা ও উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।
মেয়াদ কাল:	:	(এপ্রিল'২২খ্রিঃ-ডিসেম্বর'২৫খ্রিঃ)।
প্রকল্প পরিচালক:	:	জনাব মোহাম্মদ রেজওয়ান হোসেন।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও সামগ্রিক স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে নরসিংদী জেলার মনোহরদী পৌরসভা ও উপজেলায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	৪৯৭৫.০০
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ (অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	পাবলিক টয়লেট- ১১ টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন- ২০ টি ড্রেন নির্মাণ – ৬.৮ কি.মি. গৃহ সংযোগ-১০০০ টি সাবমার্সিবল পাম্প ও জলাধারসহ গভীর নলকূপ-৭২০ টি ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক-১টি
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি – ৩.৯৪২
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি – ২৯.১৫৮

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	উপকূলীয় জেলাসমূহের বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প
মেয়াদ কাল:	:	(জুলাই'২২খ্রিঃ-ডিসেম্বর'২৫খ্রিঃ)।
প্রকল্প পরিচালক:	:	মোঃ বাদশাহ মিয়া
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) উপকূলীয় ১০ জেলার ৪৪ টি উপজেলার ২৪০ টি ইউনিয়নে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্পাধীন এলাকাসমূহকে পানি সরবরাহ করা। খ) প্রকল্পের আওতায় ২০৬৮৭২ টি রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং নির্মাণ করা। গ) প্রকল্পাধীন এলাকাসমূহে সেফলি ম্যানেজড পানি সরবরাহের কভারেজ ২০৩০ সাল নাগাদ ৬০.১ এ উন্নীতকরণ।
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	১০০১১৮.৬৮
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ (অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং নির্মাণ – ২০৬৮৭২ টি
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি – ৭.২৭
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি – ৮১.৪২

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।
মেয়াদ কাল:	:	(এপ্রিল'২২খ্রিঃ-জুন'২৬খ্রিঃ)।
প্রকল্প পরিচালক:	:	মোঃ ফয়েজ আহমেদ।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভার বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। পৌরসভায় পাইপলাইন ভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ ৭০% থেকে ১০০% এ উন্নীত করা। প্রকল্প এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	৪৪৫৬.৪৫
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ (অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	সঞ্চালন পাইপ লাইন – ৩ কি.মি. গৃহ সংযোগ – ১২০০ টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ-৪ টি
বাস্তব অগ্রগতি	:	এডিপি অগ্রগতি – ১৮.০০
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি – ৬৮.০০

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	মাগুরা জেলার সদর উপজেলা ও শ্রীপুর উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।
মেয়াদ কাল:	:	(জুলাই'২২খ্রিঃ-জুন'২৫খ্রিঃ) (প্রস্তাবিত জুলাই'২২খ্রিঃ - জুন'২০২৬)।
প্রকল্প পরিচালক:	:	জনাব আবু বকর সিদ্দিক।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	“মাগুরা জেলার সদর উপজেলা ও শ্রীপুর উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন” প্রকল্পের মাধ্যমে জনগনের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন।
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	৩৭৬৪.১৪
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ (অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	সাবমার্সিবল পাম্প সহ গভীর নলকূপ-১৬৩০ টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন -৪০ টি
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি – ৯০.০০
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি – ৯০.০০

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	মেহেরপুর জেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।
মেয়াদ কাল:	:	(আগস্ট'২২খ্রিঃ-জুন'২৬খ্রিঃ) (প্রস্তাবিত)।
প্রকল্প পরিচালক:	:	জনাব মোহাম্মদ মোসলেহ উদ্দিন।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	মেহেরপুর জেলার পল্লী অঞ্চলে জনগণের মধ্যে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রদানের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	৩৪৪৯.৩১০
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ (অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	সাবমার্সিবল পাম্প সহ গভীর নলকূপ-৫০০ টি কমিউনিটি ভিত্তিক আর্সেনিক আয়রন রিমুভাল প্লান্ট-১৮ টি পরীক্ষামূলক নলকূপ-১৮ টি
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি – ১.০০
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি – ৮৬.০০

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	কক্সবাজার জেলায় ঈদগাঁও উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প।
মেয়াদ কাল:	:	(এপ্রিল'২৩খ্রিঃ-ডিসেম্বর'২৫ খ্রিঃ)
প্রকল্প পরিচালক:	:	জনাব মোঃ ইবনে মায়াজ প্রামানিক
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়নের মাধ্যমে কক্সবাজার জেলার ঈদগাঁও উপজেলার বসবাসকারী জনগনের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা। খ) নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানি বাহিত রোগব্যাধি কমিয়ে আনা।
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	১৫৯৫.৩০
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ(অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	সাবমার্সিবল পাম্প সহ জলাধার যুক্ত গভীর নলকূপ- — ১৩৬ টি হস্তচালিত গভীর নলকূপ -৪০০ টি পাবলিক টয়লেট- ২টি
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি — ২৫.০০
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি — ৮০.০০

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা ও জুড়ী উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।
মেয়াদ কাল:	:	(জুলাই'২৩খ্রিঃ-ডিসেম্বর'২৫খ্রিঃ)।
প্রকল্প পরিচালক:	:	জনাব মোঃ খালেদুজ্জামান।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা ও জুড়ী উপজেলায় সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্য ও জীন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	২০৯৪.৮৫
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ (অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	অফসেট টুইনপিট হাউসহোল্ ল্যাট্রিন- ৫২৫ টি পাবলিক টয়লেট-১৬ টি সাবমার্সিবল পাম্প সহ জলাধার যুক্ত গভীর নলকূপ- ৫০০ টি
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি – ৫৯.২০
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি – ৯১.৮৯

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	শরীয়তপুর পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।
মেয়াদ কাল:	:	(এপ্রিল' ২০২৫-জুন' ২০২৬)
প্রকল্প পরিচালক:	:	জনাব মোঃ ফজলুল হক।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানি বাহিত রোগব্যাধি কমিয়ে আনা। খ) এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন করা।
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	৪৪৫২.৩২
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ (অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	গৃহসংযোগ-২৩০০ টি পাবলিক টয়লেট-৩ টি
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি – ১.৩৮
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি – ৩৯.৬৫

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	স্বরূপকাঠি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।
মেয়াদ কাল:	:	(সেপ্টেম্বর'২৩খ্রিঃ-জুন'২৬খ্রিঃ)।
প্রকল্প পরিচালক:	:	জনাব এস এম সহিদুল ইসলাম।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানি বাহিত রোগব্যধি কমিয়ে আনা। খ) এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন করা।
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	৩০৬৫.৫৩
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ (অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	বিতরন পাইপ লাইন- ৮ কি.মি. ৩ তলা টয়লেট ভবন নির্মাণ- ১ টি পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন-৮ টি গৃহ সংযোগ-২২৫ টি ওযুখানা নির্মাণ-৪ টি
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি – ২২.০০
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি – ৬৫.০০

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	সাজেক পর্যটন এলাকাসহ রাঙামাটি জেলায় বিভিন্ন উপজেলার পাথুরে এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।
মেয়াদ কাল:	:	(অক্টোবর'২৩খ্রিঃ-ডিসেম্বর'২৬খ্রিঃ)।
প্রকল্প পরিচালক:	:	জনাব মোঃ জহির উদ্দিন দেওয়ান।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে সাজেক পর্যটন এলাকাসহ রাঙামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই করা।
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	৪৮২৫.৬০
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ (অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	সঞ্চালন পাইপ লাইন- ১২ কি.মি. বিতরন পাইপ লাইন- ৬ কি.মি. গৃহ সংযোগ – ৩৫০ টি ড্রেন নির্মাণ- ৩ কি.মি. পাবলিক টয়লেট- ১০ টি
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি – ৩০.০০
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি – ৪৩.৮৭

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ ও লাকসাম উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।
মেয়াদ কাল:	:	(জানুয়ারি'২৪খ্রিঃ-জুন'২৬খ্রিঃ)।
প্রকল্প পরিচালক:	:	জনাব মোঃ আলী আজগর।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করা প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ ও লাকসাম উপজেলার পল্লী এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	৩৪৯৬.৭০
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ (অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	সাবমার্সিবল পাম্প ও উচ্চজলাধার সহ গভীর নলকূপ- ১৬০৫ টি পাবলিক টয়লেট-৬ টি গভীর নলকূপ-১০০ টি কমিউনিটি টয়লেট-২০ টি
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি – ৪০.০০
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি – ৭৫.০০

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটা পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ, ড্রেনেজ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।
মেয়াদ কাল:	:	(জানুয়ারি'২৪খ্রিঃ-ডিসেম্বর'২৬খ্রিঃ)।
প্রকল্প পরিচালক:	:	জনাব এস এম সহিদুল ইসলাম।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ, ড্রেনেজ ও বর্জ্য ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে কুয়াকাটা পৌরসভায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	৪৮৯৩.৯২
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ (অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	পরীক্ষামূলক নলকূপ-৮ টি গৃহসংযোগ-১০০০ টি ৬নং গভীর নলকূপ-২০ টি
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি – ০.০০
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি – ১.০০

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	বাংলাদেশের ২৩ টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-আইডিবি)।	
মেয়াদ কাল:	:	(জুলাই '১৭খ্রিঃ - অক্টোবর '২৫খ্রিঃ)	
প্রকল্প পরিচালক:	:	জনাব মোঃ ওয়াজেদ আলী।	
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সূচনা করা। খ) এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। গ) পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য পৌরসভার মাধ্যমে Sustainable পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি ডেভেলপ করা।	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	৯৯১৭৩.৪৭	জিওবি-২৯৩১৬.৭৩ প্রকল্প সাহায্য-৬৯৮৫৬.৭৪
সহযোগী সংস্থার নাম	:	আইডিবি।	
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ (অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটম্যান্ট প্লান-১০ টি স্ল্যাজ ট্রিটম্যান্ট প্লান-২১টি সলিড ওয়েস্ট কমপোস্টিং সিস্টেম-২১টি গৃহসংযোগ-৬৬০৫৬	
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি – ১০.০০	
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি – ৬৫.৬০	

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প।	
মেয়াদ কাল:	:	(জুলাই'১৮খ্রিঃ - জুন ২৬ খ্রিঃ)।	
প্রকল্প পরিচালক:	:	জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তাদির	
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	<p>কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার ৩২টি ক্যাম্পে বসবাসরত মিয়ানমার হতে জোরপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর নেমে আসা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিরসন কল্পে নিরাপদ সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।</p> <p>ক্যাম্পে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।</p> <p>ক্যাম্পসমূহে ফিক্যাল স্ল্যাজ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।</p> <p>প্রকল্প এলাকার কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।</p>	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	৫৮৫৩৩.০১	জিওবি- ২০৪০৫.৪১ প্রকল্প সাহায্য- ৭৩৬১৪.১৬
সহযোগী সংস্থার নাম	:	এডিবি।	
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ (অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	<p>রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের জন্য গোসলখানা নির্মাণ -৫০০ টি</p> <p>ইন্টিগ্রেটেড ওয়াস ফ্যাসিলিটি-২০০ টি</p> <p>মিনি পাইপড ওয়াটার সিস্টেম-১৫ টি</p>	
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি – ১৬.০০	
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি – ৯৩.০০	

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি সেক্টর প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)।	
মেয়াদ কাল:	:	(ডিসেম্বর ১৮ খ্রিঃ - ডিসেম্বর'২৫ খ্রিঃ)।	
প্রকল্প পরিচালক:	:	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম।	
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার ৩২টি ক্যাম্পে বসবাসরত মিয়ানমার হতে জোরপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ নিরসনকল্পে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	৭৬৯০২.৯০	জিওবি- ৬০০.৯০ প্রকল্প সাহায্য-৭৬৩০২
সহযোগী সংস্থার নাম	:	আইডিএ, বিশ্বব্যাংক।	
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ (অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	পরীক্ষামূলক নলকূপ-২৮ টি পানির উৎস স্থাপন -২৬২০ টি রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং-২০০ টি বসতবাড়িতে বায়োফিল টয়লেট স্থাপন – ২৫০০ টি	
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি – ২০.০০	
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি – ৯৫.০০	

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	বাংলাদেশের ৩০ টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	
মেয়াদ কাল:	:	(জুলাই ২০১৯খ্রিঃ-জুন' ২৬খ্রিঃ)।	
প্রকল্প পরিচালক:	:	জনাব সোহরাব উদ্দিন আহমেদ।	
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	<p>প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পভুক্ত নির্বাচিত ৩০টি পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং এরূপ পরিষেবা নিশ্চিতকরণের সুবিধার্থে পৌরসভা ও অধিদপ্তরের স্বক্ষমতা শক্তিশালীকরণ। তবে প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ</p> <p>ক) নির্বাচিত ৩০ টি পৌরসভায় ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন করা।</p> <p>খ) পৌরসভাসমূহের ডেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন।</p> <p>গ) দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সংগঠিত ক্ষতি মোকাবেলার ওয়াটার ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে পৌরসভাসমূহকে জরুরী সহায়তা প্রদান।</p> <p>ঘ) পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিচালনা স্বক্ষমতা অব্যাহত রাখার জন্য উন্নয়ন সহায়তা প্রদান।</p> <p>ঙ) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ইউনিট পরিচালনা জন্য পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক স্বক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং পৌরসভার ওয়াটার সাপ্লাই ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার উপ ভূমিকা রাখার সুবিধার্থে অধিদপ্তরের স্বক্ষমতা বৃদ্ধি করা।</p>	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	১৭৫০৭০.০০	জিওবি- ৬২৯০.০০ প্রকল্প সাহায্য-১৬৮৭৮০.০০
সহযোগী সংস্থার নাম	:	আইডিএ (বিশ্বব্যাংক), এ আই আইবি	
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ (অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	<p>পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা নির্মাণ-৩০ টি</p> <p>ল্যান্ড্রিন নির্মাণ-২২৫০০ টি</p> <p>পাবলিক টয়লেট নির্মাণ-৯০ টি</p>	
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি – ২০.০০	
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি – ৭৭.০০	

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প।	
মেয়াদ কাল:	:	(জানুয়ারি'২১খ্রিঃ - ডিসেম্বর'২৫খ্রিঃ)।	
প্রকল্প পরিচালক:	:	জনাব মোঃ তবিবুর রহমান তালুকদার	
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	<p>আর্সেনিক ও আয়রনের সমস্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে নির্বাচিত গ্রামগুলিতে কমিউনিটি ও স্থানীয় সরকারের সহযোগিতার পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের স্কীম বাস্তবায়ন করা।</p> <ul style="list-style-type: none"> • হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নত ল্যাট্রিন নির্মাণ। • স্কুল এবং কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে ওয়াশ পরিষেবাগুলির ব্যবস্থা ও ব্যবহার বৃদ্ধি। • কোভিড-১৯ এর মত সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় স্কুল ও গণজমায়েত হওয়া স্থানে হাত-ধোয়ার স্টেশন নির্মাণ। • উন্নত স্বাস্থ্যকর আচরণ অনুশীলন বিশেষত জনগণের মধ্যে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। • টেকসই বিকেন্দ্রীকরণকৃত ওয়াশ পরিষেবাদি পরিচালনা ও পরীক্ষণের জন্য এর সাথে সম্পর্কিত সরকারী সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। 	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	১৮৮২৫৯.২৭	জিওবি- ৫০৮২.৯৪ প্রকল্প সাহায্য-১৮৩১৭৬.৩৩
সহযোগী সংস্থার নাম	:	বিশ্বব্যাংক।	
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ (অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	<p>টয়লেট স্থাপন-২২০৮৭৪ রিভাস ওসমোসিস ফিল্টার সহ পান সরবরাহের কমিউনিটি স্কিম-৪০ টি পাবলিক স্যানিটেশন ও হাইজিন সুবিধা-৩৫২ টি</p>	
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি -২.০০	
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি -৬২.৫০	

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	বাংলাদেশের ১০টি (দশ) অগ্রাধিকার ভিত্তিক শহরে সমন্বিত স্যানিটেশন ও হাইজিন (সমন্বিত কঠিন ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) প্রকল্প	
মেয়াদ কাল:	:	(জানুয়ারি '২২খ্রিঃ - ডিসেম্বর '২৬খ্রিঃ)	
প্রকল্প পরিচালক:	:	এস এম শামীম আহমেদ।	
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	To ensure good quality lives and livelihoods through safe, adequate, equitable sustainable sanitation, hygiene facilities and services with a special focus on the urban poor women and children, guided by City-wide Inclusive Sanitation (CWIS) Approach.	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	৫৯৮৯৮.০০	জিওবি- ১২৪১০ প্রকল্প সাহায্য-৪৭৪৮৮
সহযোগী সংস্থার নাম	:	ইসলামীক উন্নয়ন ব্যাংক।	
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ (অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	সেপ্টিক ট্যাংক নির্মাণ-৭৭০৭৭ টি গৃহসংযোগ-১৫০০ টি পানির উৎস সাধাপন- ৬৫ টি কমিউনিটি টয়লেট-৬৩ টি মানব ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা-২০ টি	
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি – ২২.০০।	
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি – ২০.০০।	

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	বাংলাদেশের ২৫ টি শহরে অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন প্রকল্প।
মেয়াদ কাল:	:	(অক্টোবর ২২ খ্রিঃ – জুন ২০২৭ খ্রিঃ)।
প্রকল্প পরিচালক:	:	জনাব মাহমুদ কবীর চৌধুরী।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) ২৫টি জেলা শহরে (পৌরসভা) বিভিন্ন ধরনের উন্নত ও নিরাপদ টেকসই স্যানিটেশন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সেফলি ম্যানেজড স্যানিটেশন কভারেজ বৃদ্ধি। খ) প্রকল্প এলাকায় হাউজহোল্ড, কমিউনিটি, পাবলিক টয়লেট ও কন্টেনমেন্ট সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন। গ) পয়ঃ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তি স্থাপনের মাধ্যমে বর্জ্য হতে সম্পদ সৃষ্টি পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সার্বিক পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে এলডিজি ৬.২ এর লক্ষ্য অর্জন। ঘ) পৌরসভা লেভেলে CWIS ফ্লোমার্ক এবং গাইডলাইন তৈরির মাধ্যমে জবাবদিহিতা জোরদার করা।
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	২২১০৭০.৭৪
		জিওবি- ৩২৮৪৯.৪০ প্রকল্প সাহায্য-১৮৮২২১.৩৪
সহযোগী সংস্থার নাম	:	এ আই আই বি।
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ(অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ-১৩০ টি হাউসহোল্ড টয়লেট নির্মাণ-১২৩১২ টি পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন-৩০ টি পাইপ লাইন-১০০ কি.মি.
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি – ৮.৩৩
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি – ০.৫৭

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পুননির্মাণে জরুরী সহায়তা প্রকল্প (জিওবি-এডিবি)।	
মেয়াদ কাল:	:	(এপ্রিল'২৩খ্রিঃ-ডিসেম্বর'২৫খ্রিঃ)।	
প্রকল্প পরিচালক:	:	জনাব মোঃ আরিফ আনোয়ার	
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	<ul style="list-style-type: none"> নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বন্যাকবলিত এলাকার মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ভ্রাম্যমান ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এবং বিভিন্ন ধরনের নলকূপ স্থাপন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে জনগণকে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা যা বন্যা পরবর্তী প্রভাব এবং ভবিষ্যৎ বন্যার প্রভাব মোকাবিলায় সহায়ক হবে। বন্যা দুর্গত মানুষের মধ্যে গৃহস্থলি ও কমিউনিটি স্যানিটেশন সুবিধার ব্যবস্থা করা। বন্যাকালীন ও বন্যা পরবর্তী সময়ে জরুরি সহায়তা প্রদান। 	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	৩৪৩৯০.৫৬	জিওবি- ৫৪৮৮.৮১ প্রকল্প সাহায্য-২৮৯০১.৭৫
সহযোগী সংস্থার নাম	:	এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)	
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ (অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	ডাবল প্লাটফর্ম সহ গভীর নলকূপ-১৮০০ টি উট্টু প্লাটফর্ম সহ সাবমার্সিবল যুক্ত গভীর নলকূপ-৯১০০ টি পাবলিক টয়লেট-১২৬ টি	
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি – ২০.৫৫।	
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি – ১৬.২৫।	

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	পার্বত্য চট্টগ্রামে সমন্বিত ও টেকসই পৌর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	
মেয়াদ কাল:	:	(জুলাই ২৪ খ্রিঃ - ডিসেম্বর'২৮ খ্রিঃ)	
প্রকল্প পরিচালক:	:	মোঃ শফিকুল হাসান।	
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প এলাকায় নিরাপদ , টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করন এবং সেইফ ওয়াটার ম্যানেজ পরিষেবার উন্নয়ন।	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	১১৯৬২৮.৯৯	জিওবি- ১৮৩৬২.৪৯ প্রকল্প সাহায্য- ১০১২৬৬.৫
সহযোগী সংস্থার নাম	:	এডিবি	
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ (অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	জলাধার নির্মাণ-১১ টি টয়লেট নির্মাণ-১৬৩৫ টি	
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি – ৩০.০০	
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি – ২৬.০০	

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	বাংলাদেশের জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং হাইজিন প্রকল্প।	
মেয়াদ কাল:	:	(এপ্রিল ২৩ খ্রিঃ – জুন ২৭ খ্রিঃ)	
প্রকল্প পরিচালক:	:	মোঃ সাইফুর রহমান	
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:		
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	২৭৪৪৭.৯৫	জিওবি- ৫৩৫১.১৫ প্রকল্প সাহায্য- ২২০৯৬.৮০
সহযোগী সংস্থার নাম	:	ইউনিসেফ	
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ (অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	অগভীর নলকূপ-১৪২ টি গভীর নলকূপ-৯৪৪ টি হাউসহোল্ড রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং-২৬৬ টি শেয়ারড লেট্রিন-১৫০০ টি কমিউনিটি লেট্রিন-৬৮৫ টি	
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি -১৮.২৪	
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি – ২০.৭৩	

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প।	
মেয়াদ কাল:	:	(জুলাই ২৪ খ্রিঃ – জুন ২৮ খ্রিঃ)	
প্রকল্প পরিচালক:	:	নূর আহম্মদ।	
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) ক্যাম্পে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও কক্সবাজার জেরতর সকল উপজেলার সাধারণ জনগোষ্ঠীর জন্য পাইপড এবং নন পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা উন্নয়ন। খ) ক্যাম্পসমূহে ফিক্যাল স্ল্যাজ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাসহ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন। গ) নারী পুরুষের সমতায়নের ভিত্তিতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	১২১৮১৮.৮৬	জিওবি- ৮১৮.৮৬ প্রকল্প সাহায্য- ১২১০০০
সহযোগী সংস্থার নাম	:	বিশ্বব্যাংক (আইডিএ)	
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ সমূহ (অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:		
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি – ৮.৩৫	
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি – ৩.৭০	

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন সেক্টর শক্তিশালীকরণ ও স্যানিটেশন বিপন্নন পদ্ধতি (স্যানমার্কস) উন্নয়ন প্রকল্প।	
মেয়াদ কাল:	:	(এপ্রিল ২৩ খ্রিঃ – জুন ২৭ খ্রিঃ)	
প্রকল্প পরিচালক:	:	মোঃ সাইফুর রহমান।	
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল প্রকল্প এলাকার ১২০ লক্ষ পরিবারে বসবাসকারী আনুমানিক ও ৫৪ লক্ষ মানুষের স্বাস্থ্যগত মান উন্নত করা, পানি সরবরাহ ও পরিচ্ছন্ন স্যানিটেশন সুবিধার গুনগতমান, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সিস্টেম শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে ব্যবহারের চাহিদা বৃদ্ধি করে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার মান বন্টন নিশ্চিত করা।	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	১৫৬২৪.৭০	জিওবি- ২৬২৪.৭০ প্রকল্প সাহায্য- ১৩০০০.০০
সহযোগী সংস্থার নাম	:	ইউনিসেফ	
প্রধান প্রধান অংশ সমূহসমূহ (অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	অফসেট টয়লেট-১০৪০০০ টি	
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি – ১.০০	
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি – ১৪.০০	

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	কক্সবাজারে ভূভস্থ পানি অনুসন্ধানে কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।	
মেয়াদ কাল:	:	(অক্টোবর ২২খ্রিঃ - ডিসেম্বর'২৬ খ্রিঃ)	
প্রকল্প পরিচালক:	:	মোঃ সাইফুর রহমান।	
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো ডিপিএইচই এর চলমান ড্রিলিং কার্যক্রমের পাশাপাশি এই প্রকল্পের সাহায্য প্রকল্প এরাকায় কক্সবাজার জেলায় যথাযথভাবে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির গবীর উৎস সমূহ খুঁজে বের করা।	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	৪৭৯৪.৫০	জিওবি- ৯৫৮.৫০ প্রকল্প সাহায্য- ৩৮৩৬.০০
সহযোগী সংস্থার নাম	:	জাপান সরকার।	
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ	:	Test Drilling for observation production tube well-১টি	
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি – ০.০	
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি – ৩৫.০০	

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প।	
মেয়াদ কাল:	:	(ফেব্রুয়ারি ২০২২- জুন ২০২৬)	
প্রকল্প পরিচালক:	:	মোহাম্মদ আনোয়ার ইউসুফ।	
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	<ul style="list-style-type: none"> গ্রামীণ ও পৌরসভা পানি সরবরাহের জন্য প্রস্তুতকৃত সমন্বিত কারিগরি গাইডলাইন () টি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের তাদের পানি সরবরাহ প্রকল্পের কাজে ব্যবহার করা। পানি সরবরাহের উৎসগুলি নির্বাচন করার জন্য প্রস্তুতকৃত সম্ভবনাময় পানি সম্পদ ম্যাপ ব্যবহার করা এবং তা হালনাগাদ করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় এবং জেলা পর্যায় অফিসসমূহের পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা। 	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	৩৩২১.৪১	জিওবি-২৯১.৪১ প্রকল্প সাহায্য-৩০৩০.০০
সহযোগী সংস্থার নাম	:	জাইকা	
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ সমূহ (অনুমোদিত টিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	বিদেশে প্রশিক্ষণ-২২০ জন / দিন দেশে প্রশিক্ষণ-৩৩৩৫ জন প্রশিক্ষণ উপকরণ-৬০০ কপি	
বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	এডিপি অগ্রগতি – ২২.০০	
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি -৭২.০০	

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রকল্পের নাম:	:	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ডসেটেলমেন্ট প্রজেক্ট -৪।	
মেয়াদ কাল:	:	(জানুয়ারি’২০২১-জুন’২০২৬) (প্রস্তাবিত)	
প্রকল্প পরিচালক:	:	জনাব মোঃ আব্দুল হালিম খান।	
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) টেকসই ভিত্তিতে চর এলাকার জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়ন। খ) প্রকল্পভুক্ত চর এলাকার জনগণের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সহজলভ্য করা। গ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও পানিবাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা। ঘ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে চর এলাকার জনগণের জীবন মান উন্নয়ন। ঙ) টেকসই পানি সরবরাহ ও এনভাইরনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	৩৪২০.১৫	জিওবি-১০৯০.৭৮ প্রকল্প সাহায্য-২৩২৯.৩৭
সহযোগী সংস্থার নাম	:	IFAD	
প্রধান প্রধান অংশ সমূহ সমূহ (অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা)	:	গভীর নলকূপ- ১৯৬৫ টি পিট ল্যাট্রিন নির্মাণ- ২২১৫০ টি	
বাস্তব অগ্রগতি	:	এডিপি অগ্রগতি – ০.০০	
	:	সামগ্রিক অগ্রগতি – ৯০.৮৫	

40

সদ্য অনুমোদিত প্রকল্পের তথ্যাদি (০২টি):

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)			অনুমোদনের তারিখ
		মোট	জিওবি	পিএ	
১	বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় জনসমাজের সমন্বিত সেবা ও জীবন-জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্প জুলাই ২০২৫ - জুন ২০২৮	৬৫২.৫৫	১১২.৭৮	৫৩৯.৭৭	২৪/০৬/২০২৫
২	গ্রামীণ স্যানিটেশন প্রকল্প জুলাই ২০২৫ - জুন ২০২৮	১৯৮৯.৮২	১৯৮৯.৮২	০.০০	২৭/০৭/২০২৫

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজের চিত্র



বসুরহাট পৌরসভায় নির্মিত গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট



শায়েস্তাগঞ্জ পৌরসভায় নির্মিত গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজের চিত্র



মনিরামপুর পৌরসভায় নির্মিত ওয়াটার পয়েন্ট



শিবগঞ্জ পৌরসভায় প্রাইমারী ড্রেন নির্মাণ কাজ

বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পাবলিক টয়লেট




পাবলিক টয়লেট



সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্ট




সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্ট

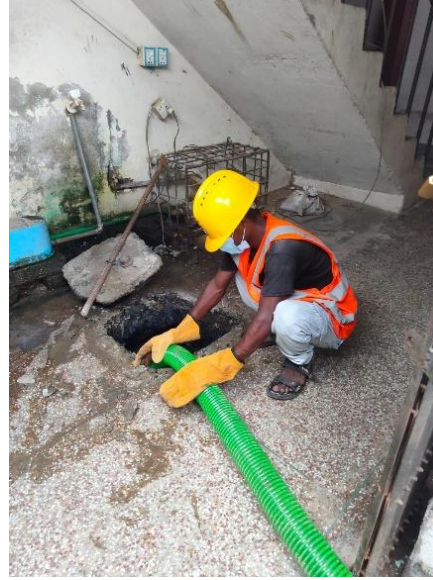

সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় চলমান কার্যক্রম



নাটোর জেলার সদর উপজেলার
৬নং পাম্পযুক্ত নলকূপ

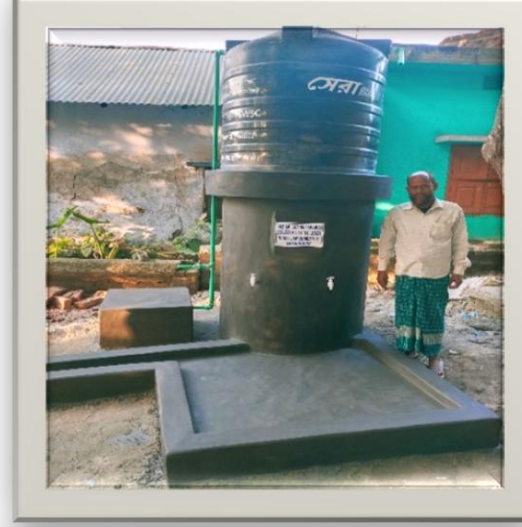

রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলার
সাবমার্সিবল পাম্প যুক্ত নলকূপ



সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার
রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং ইউনিট

সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় চলমান কার্যক্রম



সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার রুরাল
পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম



পাবনা সদর উপজেলায় নির্মিত উপজেলা অফিস ভবন

চৌগাছা পৌরসভায় নির্মিত ওভোরহেড ট্যাংক ও পানিশোধনাগার





সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম ভবন



রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নির্মিত কমিউনিটি ল্যাট্রিন
