

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

রংপুর।

www.lged.gov.bd

"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি"

স্মারক নং- ৪৬.০২.৮৫০০.০০০.৯৯.০২২.১৭- ২৬৪৬

তারিখ : ০৬/৬/২৪ ইং

প্রতি,

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মনিটরিং ও মূল্যায়ন)

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর


এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

বিষয় : জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক রিপোর্ট (এপ্রিল/২০২৪-জুন/২০২৪ পর্যন্ত) এবং প্রমানক প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক রিপোর্ট (এপ্রিল/২০২৪-জুন/২০২৪ পর্যন্ত) এবং প্রমানক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসহ প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : রিপোর্ট -০১(এক) সেট।


(মোহাম্মদ শাহজাহান আলী)
নির্বাহী প্রকৌশলী

ফোন নং-০২৫৮৯-৯৬২৭৩০

ই-মেইল : xen.rangpur@lged.gov.bd

অনুলিপি :

- অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
- তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর অঞ্চল, রংপুর।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪, ৪র্থ ত্রৈমাসিক রিপোর্ট (এপ্রিল'২৪-জুন'২৪)

জেলা কার্যালয়ের নাম: নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, এলজিইডি, রংপুর।

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২৩-২০২৪					মন্তব্য		
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা.....													
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	২	সংখ্যা	নির্বাহী প্রকৌশলী/ সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী	৪	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১	১	১	১			
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৪	%	নির্বাহী প্রকৌশলী/ সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	৪	সংখ্যা	নির্বাহী প্রকৌশলী/ সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী	৪	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১	১	১	১			
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণ আয়োজিত	২	সংখ্যা	নির্বাহী প্রকৌশলী/ সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী	১০০	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	-	৫০	-	৫০			
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (টিওএডইউজ অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ/নাথি বিনষ্টকরণ/ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি/ মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ইত্যাদি)	উন্নত কর্ম-পরিবেশ	৩	সংখ্যা ও তারিখ	নির্বাহী প্রকৌশলী/ সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী	২৩-০৭-২৩ ৩১-১২-২৩ ৩১-০৩-২৪ ৩০-০৬-২৪	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	২৩-০৭-২৩	৩১-১২-২৩	৩১-০৩-২৪	৩০-০৬-২৪			
২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন.....													
২.১ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত কর্ম-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	৩	তারিখ	নির্বাহী প্রকৌশলী/ সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী	৩১/০৭/২০২৩	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	৩১/০৭/২০২৩	-	-	-			

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২৩-২০২৪					মন্তব্য		
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৩. শুল্কচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম..... (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১ নং সহ ন্যূনতম চারটি কার্যক্রম)													
৩.১ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রেজিস্টারে প্রদেয় সেবার বিবরণ ও সেবাগ্রহীতার মতামত সংরক্ষণ	রেজিস্টার হালনাগাদকৃত	৭	%	নির্বাহী প্রকৌশলী/ সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
						অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
৩.২ সম্পাদিত পূর্ত কাজের চূড়ান্ত বিলের সাথে স্থির চিত্র সংযোজন	স্থির চিত্র	৭	%	নির্বাহী প্রকৌশলী/ সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
						অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
৩.৩ ০৩(তিন) কোটি টাকার উর্ধ্বে কাজ সমূহের চূড়ান্ত বিল প্রদানের পূর্বে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কর্তৃক প্রত্যয়ন প্রদান	প্রত্যয়ন প্রদান	৭	%	নির্বাহী প্রকৌশলী/ সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			৪র্থ কোয়ার্টারে ০৩ কোটি টাকার উর্ধ্বে কোন চূড়ান্ত বিল প্রদান করা হয়নি।
						অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
৩.৪ পরিদর্শন টিম কর্তৃক প্রাপ্ত ত্রুটিপূর্ণ কাজ সংশোধন	প্রাপ্ত প্রতিবেদন	৭	%	নির্বাহী প্রকৌশলী/ সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			পরিদর্শন রিপোর্ট সংযুক্ত
						অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			

২০/০৪/২৪
(মোহাম্মদ শাহজাহান আলী)
নির্বাহী প্রকৌশলী

ও

সভাপতি

নৈতিকতা কমিটি,

জেলাঃ রংপুর

১.১ নৈতিকতা কমিটির সভার কার্য বিবরণী ৪


"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি।"

নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, রংপুর মহোদয়ের সভাপতিত্বে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলীগণ এবং সম্মানিত অংশীজনের সম্মুখে আলোচনা সভা :

সভায় উপস্থিত সদস্য গনের নামের তালিকা :

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	স্বাক্ষর
০১।	জনাব মোঃ বাদশা আলমগীর সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
০২।	জনাব জয়া সান্যাল সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
০৩।	জনাব মোঃ নাফিউর রহমান সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
০৪।	জনাব আহমেদ হায়দার জামান উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, সদর, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
০৫।	জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, মিঠাপুকুর, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
০৬।	জনাব মোঃ মশিউর রহমান উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, পীরগঞ্জ, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
০৭।	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান জেমি উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, কাউনিয়া, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
০৮।	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, পীরগাছা, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
০৯।	জনাব মোঃ মজিদুল ইসলাম উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, গংগাচড়া, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
১০।	জনাব মোহাম্মদ আলী উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, তারাগঞ্জ, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
১১।	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান বাপ্পী উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, বদরগঞ্জ, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
১২।	জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম সহকারী প্রকৌশলী, SSWRDP-2, এলজিইডি, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
১৩।	জনাব মোঃ নাসিফ রাব্বি সহকারী প্রকৌশলী, IRIDP-3, এলজিইডি, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
১৪।	জনাব মোঃ মোহাইমিনুল ইসলাম মহান সহকারী প্রকৌশলী, supRB, এলজিইডি, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
১৫।	জনাব মোঃ সোহেল রানা সহকারী প্রকৌশলী, RIVER, এলজিইডি, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
১৬।	জনাব মোঃ আল হোজায়ফা জনি সহকারী প্রকৌশলী, RDRIIP-2, এলজিইডি, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
১৭।	জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
১৮।	জনাব মোঃ আনারুল ইসলাম উপ-সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
১৯।	জনাব মোঃ আশেকুল আলম মেকানিক্যাল ফোরম্যান, এলজিইডি, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
২০।	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান ল্যাব টেকনিশিয়ান, এলজিইডি, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
২১।	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম সহকারী লাইভলিহুড অফিসার, প্রভাতী, এলজিইডি, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
২২।	জনাব স্বাধীনা পারভীন ট্রেনিং অফিসার, আরইআরএমপি-৩, এলজিইডি, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
২৩।	জনাব লুৎফা খাতুন বুবলী সোসিওলোজিস্ট, SSWRDP-2, এলজিইডি, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
২৪।	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম হিসাব রক্ষক, এলজিইডি, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
২৫।	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান উচ্চমান সহকারী, এলজিইডি, রংপুর।	স্বাক্ষরিত

(চলমান পাতা-০২)



(পাতা-০২)

২৪/০৪/২০২৪ইং তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি রংপুর সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে নৈতিকতা সম্পর্কিত সভার কাজ শুরু করেন।

১.১ সভাপতি উপস্থিত সকলকে নৈতিকতা সম্পর্কিত জেলা পর্যায়ের কার্যালয়ের কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং সকলকে এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আরো মনোযোগ ও সহযোগিতা প্রদান করার ব্যাপারে বিশেষ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

নির্দেশনাসমূহ

- ক) সঠিক সময়ে (সকাল ৯.০০ ঘটিকা) অফিসে উপস্থিত হয়ে সকাল ৯.৪০ মিনিট পর্যন্ত নিজ নিজ কক্ষে উপস্থিত থেকে তথ্য নিতে আসা নাগরিকদের তথ্য প্রদান করা।
- খ) সেবা গ্রহীতা ও সকল সহকর্মীদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন এবং সহযোগিতামূলক আচরণ করা।
- গ) কালক্ষেপন না করে যথাসময়ে নিজের উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা।


(মোহাম্মদ শাহজাহান আলী)

সভাপতি

ও

নির্বাহী প্রকৌশলী

ফোন নং-০৫২১-৬২৩৬২


ই-মেইল : xen.rangpur@lged.gov.bd

স্মারক নং- ৪৬.০২.৮৫০০.০০০.০৬.০০২.২০-

তারিখ : _____ ইং

অনুলিপি :

- ০১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ০২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
- ০৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন/পরিকল্পনা/প্রশিক্ষণ/প্রকল্প), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ০৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর অঞ্চল, ধাপ, রংপুর।
- ০৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর অঞ্চল, রংপুর।
- ০৬। সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর।
- ০৭। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা-....., জেলা-রংপুর।
- ০৮। সহকারী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী (e-GP), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর।
- ০৯। সোসিওলোজিস্ট, PSSWRSP, রংপুর।
- ১০। উপ-সহকারী প্রকৌশলী ১/২, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জেলা- রংপুর।
- ১৫। উপ-সহকারী প্রকৌশলী, PSSWRSP, রংপুর।
- ১২। ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান, অত্র দপ্তর।
- ১৩। ম্যাকানিক্যাল ফোরম্যান, এলজিইডি, রংপুর।
- ১৪। অফিস কাপ।


(মোহাম্মদ শাহজাহান আলী)

সভাপতি

ও

নির্বাহী প্রকৌশলী

ফোন নং-০৫২১-৬২৩৬২

ই-মেইল : xen.rangpur@lged.gov.bd

২০২৪ সালের

নথি নং ইডি/ওএওএম (সমস্বয়) এসাইন-১০৮/৭৯ মোতাবেক

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	নির্দিষ্ট			১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
		স্বঃ	আঃ	প্রঃ															
১।	জনাব মোঃ বাদশাহ আলম মৌব (ফিনিশিয়র সহকারী প্রজেক্টঃ)																		
২।	জনাব মোঃ জয়ন হান্নান (সহকারী প্রজেক্টঃ)																		
৩।	জনাব মোঃ নাদিউর রহমান (সহকারী প্রজেক্টঃ)																		
৪।	জনাব মোঃ হামিদুর রহমান (উপ-সহকারী প্রজেক্টঃ)																		
৫।	জনাব মোঃ আলোয়ারুল ইসলাম (উপ-সহকারী প্রজেক্টঃ)																		
৬।	জনাব মোঃ আলোক আলম (উপ-সহকারী প্রজেক্টঃ)																		
৭।	জনাব মোঃ আলমুল্লাহ আলম (আলম ডেপুটি ম্যানেজার)																		
৮।	জনাব মোঃ মোজাম্মদুল হক (উপ-সহকারী প্রজেক্টঃ)																		
৯।	জনাব মোঃ মোজাম্মদুল আলম (ফিনিশিয়র সহকারী প্রজেক্টঃ)																		
১০।	আবু বকর সিদ্দিক (উপ-সহকারী প্রজেক্টঃ)																		

উদ্ভূতন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

নেমিত্তিক ছুটি					বিশেষ হাজিরা
প্রাপ্য	চলতি মাসে নেওয়া	বিলম্ব হাজিরা হেতু কতন	কতদিন জমা আছে		
১৪					১৪
১৫					১৫
১৬					১৬
১৭					১৭
১৮					১৮
১৯					১৯
২০					২০
২১					২১
২২					২২
২৩					২৩
২৪					২৪
২৫					২৫
২৬					২৬
২৭					২৭
২৮					২৮
২৯					২৯
৩০					৩০
৩১					৩১

২০.২৪ সালের ডিসে

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	জাগমন প্রস্থান	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১১।	জনাব বাকী মোহন বাচ (সেনো - চৌহদ্দী)	স্বাঃ আঃ প্রঃ	২	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
১২।	মোদাঃ মোজা মোন মোব (আদম মহল্লাই হক - ডেপুটি সেক্রেটারী)	স্বাঃ আঃ প্রঃ	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
১৩।	মোঃ সাদ - আলম (সাজী মোদাঃ)	স্বাঃ আঃ প্রঃ	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
১৪।	মোঃ দিকোজ উদ্দিন (সাজী মোদাঃ)	স্বাঃ আঃ প্রঃ	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
১৫।	মোঃ সুজাত দেবী (সাজী মোদাঃ)	স্বাঃ আঃ প্রঃ	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
১৬।	মোঃ মহম্মদ (সাজী মোদাঃ)	স্বাঃ আঃ প্রঃ	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
১৭।	মোঃ মোদাঃ ইয়াসীন (সাজী মোদাঃ)	স্বাঃ আঃ প্রঃ	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
১৮।	মোঃ নূর আলম (সাজী মোদাঃ)	স্বাঃ আঃ প্রঃ	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
১৯।	মোঃ মজিবুল হক (সাজী মোদাঃ)	স্বাঃ আঃ প্রঃ	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
২০।	মোঃ আতি কুর বহমান (আদম মহল্লাই)	স্বাঃ আঃ প্রঃ	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১

নৈমিত্তিক ছুটি			
প্রাপ্য	চলতি মাসে নেওয়া	বিলম্ব হাজিরা হেতু কতন	কতদিন জমা আছে
১	১		
২	২		
৩	৩		
৪	৪		
৫	৫		
৬	৬		
৭	৭		
৮	৮		
৯	৯		
১০	১০		
১১	১১		
১২	১২		
১৩	১৩		
১৪	১৪		
১৫	১৫		
১৬	১৬		
১৭	১৭		
১৮	১৮		
১৯	১৯		
২০	২০		
২১	২১		
২২	২২		
২৩	২৩		
২৪	২৪		
২৫	২৫		
২৬	২৬		
২৭	২৭		
২৮	২৮		
২৯	২৯		
৩০	৩০		
৩১	৩১		

১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা



RM

অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী)
প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ক ম্যানেজমেন্ট মিটিং এর কার্য বিবরণীঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, রংপুর মহোদয়ের সভাপতিত্বে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলীগণ, প্রকল্পের পরামর্শকবৃন্দ এবং সম্মানিত অংশীজনের সমন্বয়ে আলোচনা সভা :

সভায় উপস্থিত সদস্য গনের নামের তালিকা :

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	স্বাক্ষর
০১।	জনাব বাদশাহ আলমগীর সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
০২।	জনাব জয়া সান্যাল সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
০৩।	জনাব মোঃ নাফিউর রহমান সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
০৪।	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান জেমি উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, কাউনিয়া, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
০৫।	জনাব মোঃ মজিদুল ইসলাম উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, গংগাচড়া, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
০৬।	জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
০৭।	জনাব মোঃ আনারুল ইসলাম উপ-সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
০৮।	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান, এলজিইডি, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
০৯।	জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন নিয়াজ মাহমুদ পরামর্শক, প্রভাতী প্রকল্প, এলজিইডি, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
১০।	ঠিকাদার মেসার্স রাঙ্গা কন্সট্রাকশন ধাপ, শিমুলবাগ, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
১১।	ঠিকাদার মেসার্স তাহিতী এন্টারপ্রাইজ কামাল কাছনা, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
১২।	ঠিকাদার মেসার্স ডালিয়া ট্রেডার্স গুণ্ডাপাড়া, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
১৩।	ঠিকাদার মোঃ খায়রুল ইসলাম রোমান ঠাকুরগাঁও।	স্বাক্ষরিত
১৪।	ঠিকাদার এইচ এস এন্টারপ্রাইজ হাতিবান্ধা, লালমিরহাট।	স্বাক্ষরিত
১৫।	ঠিকাদার সিনথিয়া-এসী-জেসমিন (জেভি) কামাল কাছনা, রংপুর।	স্বাক্ষরিত
১৬।	ঠিকাদার কেজেড-এইচএসসি (জেভি) মিঠাপুকুর, রংপুর।	স্বাক্ষরিত

১৮/০৪/২০২৪ইং তারিখ বিকাল ৩:৩০ ঘটিকায় জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি রংপুর সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী)" প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ক ম্যানেজমেন্ট মিটিং এর কাজ শুরু করেন।

টিং এর আলোচ্য বিষয় :-

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	বর্তমান অবস্থা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা	বাস্তবায়নে
১।	অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী)" প্রকল্প	এই প্রকল্পের আওতায় অত্র জেলায় স্কীম সংখ্যা ৩০টি, চলমান ১৭টি। ১১টি ভৌত অবকাঠামো কাজ চলমান ও LCS দ্বারা ৬টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। যাহার গড় অগ্রগতি যথাক্রমে ২৩% ও ৮০% এবং নতুন করে ৪টি হাটের প্যাকেজ অনুমোদনের অপেক্ষায়।	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, রংপুর। সিনিঃ সহঃ প্রকৌঃ, সহকারী প্রকৌঃ, এলজিইডি, রংপুর। উপজেলা প্রকৌশলী, গংগাচড়া/কাউনিয়া, রংপুর

টিং এর সভাপতি মহোদয় ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এর সহিত মত বিনিময়সহ বর্তমান চলমান কাজের অগ্রগতি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন এবং সকল কাজের গুণগতমান ও সঠিক পরিমাণ বজায় রেখে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করেন এবং সকল ঠিকাদারের নিকট হতে ফিডব্যাক গ্রহণ করেন।

(মোহাম্মদ শাহজাহান আলী)
সভাপতি

ও
নির্বাহী প্রকৌশলী

ফোন নং-০২৫৮৯-৯৬২৭৩০

ই-মেইল : xen.rangpur@lged.gov.bd

তারিখ : ০৮/০৮/২৪ ইং

স্মারক নং- ৪৬.০২.৮৫০০.০০০. ০৬,০০২.২২-২২২৭

অনুলিপি :

- ০১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ০২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
- ০৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর অঞ্চল, রংপুর।
- ০৪। প্রকল্প পরিচালক, অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী)" প্রকল্প, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ০৫। সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর।
- ০৬। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা-....., জেলা-রংপুর।
- ০৭। সহকারী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী (e-GP), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর।
- ০৮। উপ-সহকারী প্রকৌশলী ১/২, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জেলা- রংপুর।
- ০৯। জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন নিয়াজ মাহমুদ, পরামর্শক, প্রভাতী প্রকল্প, এলজিইডি, রংপুর।
- ১০। অফিস কপি।

(মোহাম্মদ শাহজাহান আলী)
সভাপতি

ও
নির্বাহী প্রকৌশলী

ফোন নং-০২৫৮৯-৯৬২৭৩০

ই-মেইল : xen.rangpur@lged.gov.bd

০৮/০৮/২৪

অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে যুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতি) প্রকল্পের
কাজের অগ্রগতি বিষয়ক ম্যানেজমেন্ট মিটিং এর আলোচ্য বিষয় :

ক্রমিক নং	প্র্যাক্জ বিবরণী	ঠিকাপত্রের নাম ও ঠিকানা	মুক্তিমূল্য	মুক্তির তারিখ	মুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	আগোচনা	সিদ্ধান্ত
০১।	Improvement of Bituminous carpeting Road on Sarai UP- Bhahishwler More bazar via Naira Pry.School Road at Ch: 1412m- 3412m including Construction of 1Nos (0.625x0.625) m U-Drain at Ch: 1775m,2247m, 2537m, 2590m & 3155m and 1Nos 3 x 4.50m x4.00 m RCC Box Culvert at Ch: 2127m and 1Nos 1x2.00m x2.00 m RCC Box Culvert at Ch: 2901m Under Upazila:Kaunia, District: Rangpur, Package No. PRO/RAN/KAU/UNR/19-20/W-74	KZ-AHC (IV) Kashimpur, Mithapukur, Rangpur	২২১৯১৪৬৩.৫১	০৩/২৫/২০২০	০৪/০৩/২০২১	৯০%	বর্নিত কাজটি নির্ধারিত ড্রইং ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন মোতাবেক গুণগতমান বজায় রেখে জুন/২০২৪ইং মাসের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত করবেন মর্মে ঠিকাদার ম্যানেজমেন্ট মিটিং-এ অঙ্গিকার করেছেন।	জুন/২০২৪ইং তারিখের মধ্যে কাজটি ১০০% সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০২।	Construction of Three Storied Azamkha Govt. Primary School cum Flood Shelter under Upazila : Kaunia District: Rangpur, Package No. PRO/RAN/KAU/FS/ 23-24/W-391	M/s. Ranga Construction, Dhap, Shimulbag, Rangpur.	২৫,৩৪৬,৪৫৯.১২	১০.১০.২৩	১৬.০১.২৫	৩০%	বর্নিত কাজটি নির্ধারিত ড্রইং ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন মোতাবেক গুণগতমান বজায় রেখে জুন/২০২৪ইং মাসের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত করবেন মর্মে ঠিকাদার ম্যানেজমেন্ট মিটিং-এ অঙ্গিকার করেছেন।	জুন/২০২৪ইং তারিখের মধ্যে কাজটি ১০০% সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০৩।	Construction of Three Storied Pollimari Govt. Pry. School cum Flood Shelter under Upazila : Kaunia District: Rangpur, Package No. PRO/RAN/KAU/ FS/21-22/W- 295	Md. Khairul Islam Roman, Thakurgoan	২৩,৯২৮,৬৩০.২২	১৬.০২.২২	৩১.১২.২২	৯৮%	অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
০৪।	Improvement of Sarai UP - Bhahishwler more Bazar via Naira Pry. School Road at Ch:3412m- 4342m. Road ID:185423013 [Salvage Cost Tk : 1,65,848.00] [Kaunia] Package No. PRO/RAN/KAU/UNR/23-24/W- 413	M/s. Ranga Construction, Dhap, Shimulbag, Rangpur.	১২,৬৪৪,৫৮২.০৬৭	০১/৩০/২০২৪	১২/২৮/২০২৪	২০%	বর্নিত কাজটি নির্ধারিত ড্রইং ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন মোতাবেক গুণগতমান বজায় রেখে জুন/২০২৪ইং মাসের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত করবেন মর্মে ঠিকাদার ম্যানেজমেন্ট মিটিং-এ অঙ্গিকার করেছেন।	জুন/২০২৪ইং তারিখের মধ্যে কাজটি ১০০% সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রমিক নং	প্যাকেজ বিবরণী	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	বুজি মূল্য	বুজির তারিখ	বুজি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের তৈতি অগ্রগতি (%)	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
০৫।	Improvement of Gangachara Degree Collage to Nagorbond pucca Road via Giripar Madrasa Road at Ch:0.00-2175m. Road ID:185274035 [Gangachara] Package No. PRO/RAN/GAN/VR/23-24/W-411	M/S. Ranga Construction, Dhap, Shimulbag, Rangpur.	১৬,৮১৫,৭৪৬.৬১৩	০১/৩০/২০২৪	১২/২৮/২০২৪	৪০%	বর্ণিত কাজটি নির্ধারিত ড্রইং ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন মোতাবেক গুণগতমান বজায় রেখে জুন/২০২৪ইং মাসের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত করবেন মর্মে ঠিকাদার ম্যানেজমেন্ট মিটিং-এ অঙ্গিকার করেছেন।	জুন/২০২৪ইং তারিখের মধ্যে কাজটি ১০০% সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০৬।	Improvement of Anur Bazar-Sillernir bazar Road at Ch:00m-1713m. Road ID:185275021 [Gangachara] Package No. PRO/RAN/GAN/VR/23-24/W-412	M/S. Ranga Construction, Dhap, Shimulbag, Rangpur.	১৬,৮৮৩,১৭৫.২২	০১/৩০/২০২৪	১২/২৮/২০২৪	৪০%	বর্ণিত কাজটি নির্ধারিত ড্রইং ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন মোতাবেক গুণগতমান বজায় রেখে জুন/২০২৪ইং মাসের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত করবেন মর্মে ঠিকাদার ম্যানেজমেন্ট মিটিং-এ অঙ্গিকার করেছেন।	জুন/২০২৪ইং তারিখের মধ্যে কাজটি ১০০% সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০৭।	Improvement of Buddir Baza-Mahila Bazar at Ch:0.00 - 1900m. Road ID:185425054 [Kaunia] Package No. PRO/RAN/KAU/VR/23-24/W-424	M/S. Tahity Enterprise Kamal Kachna, Rangpur.	১৮,১৩৬,৪৪০.৫৭	০৩/০৪/২০২৪	২৪/০৩/২০২৫	০%	কালভার্ট, প্যালাসাইডিং পর্যন্ত করা যেতে পারে মর্মে ঠিকাদার অঙ্গিকার করেছেন।।	জুন/২০২৪ইং তারিখের মধ্যে কাজটি ৩০% সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০৮।	Improvement of Bhajiarhat-Azamkha Road at Ch:58m-2200m. Road ID:185425047 [Kaunia] Package No. PRO/RAN/KAU/VR/23-24/W-425	Oishi & Jesmin (V) Rahim Supurmarket, Rangpur.	২০,২০০,০০০.০০	২৭/০৩/২০২৪	০২/০২/২০২৫	১০%	প্যালাসাইডিং এবং কালভার্ট শেষ হবে এবং WBM পর্যন্ত করতে পারবেন মর্মে ঠিকাদার অঙ্গিকার করেছেন।	জুন/২০২৪ইং তারিখের মধ্যে কাজটি ৬০% সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০৯।	Improvement of Bukultola bazar-Mora Testa Bridge via Patowary tari GPS at Ch:0.00m-740m. Road ID:185424074 [Kaunia] Package No. PRO/RAN/KAU/VR/23-24/W-426	M/S. Dalia Traders Guptapara, Rangpur	৭,৩৭১,৫৫৪.৫০	১৮.০৩.২৪	১২.১২.২৪	৫%	প্যালাসাইডিং-এর কাজ বরিবর হতে শুরু হবে। জুন/২০২৪ইং Sub-base পর্যন্ত হবে মর্মে ঠিকাদার অঙ্গিকার করেছেন।	জুন/২০২৪ইং তারিখের মধ্যে কাজটি ৪০% সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১০।	Improvement of Haregach UP-Haquear hat Via Jantiole More & Patwarary Madrasa at Ch:0.00-3900m. Road ID:185423017 [Kaunia] Package No. PRO/RAN/KAU/UNR/23-24/W-427	M/S Ranga Construction Dhap Shimul Bag, Rangpur	৪১,৭১৫,৩৫৮.৭৩	১৮.০৩.২৪	১১.১১.২৪	১০%	বর্ণিত কাজটি নির্ধারিত ড্রইং ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন মোতাবেক গুণগতমান বজায় রেখে জুন/২০২৪ইং মাসের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত করবেন মর্মে ঠিকাদার ম্যানেজমেন্ট মিটিং-এ অঙ্গিকার করেছেন।	জুন/২০২৪ইং তারিখের মধ্যে কাজটি ৯০% সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রমিক নং	প্যাকেজ বিবরণী	ঠিকাদানের নাম ও ঠিকানা	বুজি মূল্য	বুজির তারিখ	বুজি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের ভৌত অগ্রগতি (%)	অলোচনা	সিদ্ধান্ত
১১।	Improvement of Ekatar Bazar- Pollimari GPS via Bacharkura Bridge. at Ch:0.00-2610m . Road ID:185425139 [Kaunia] Package No. PRO/RAN/KAU/VR/23-24/W- 428	Oishi & Jesmin (JV) Rahim Supurmarket, Rangpur.	২৩,৯৯৯.৪৩৫.৫৪	২৭/০৩/২০২৪	০২/০২/২০২৫	০%	বর্ণিত কাজটি নির্ধারিত ড্রইং ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন মোতাবেক জনগতমান বজায় রেখে জুন/২০২৪ইং মাসের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত করবেন মর্মে ঠিকাদার ম্যানেজমেন্ট মিটিং-এ অঙ্গিকার করেছেন।	জুন/২০২৪ইং তারিখের মধ্যে কাজটি ১০০% সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(০২৫)

২৫/৭/২৪

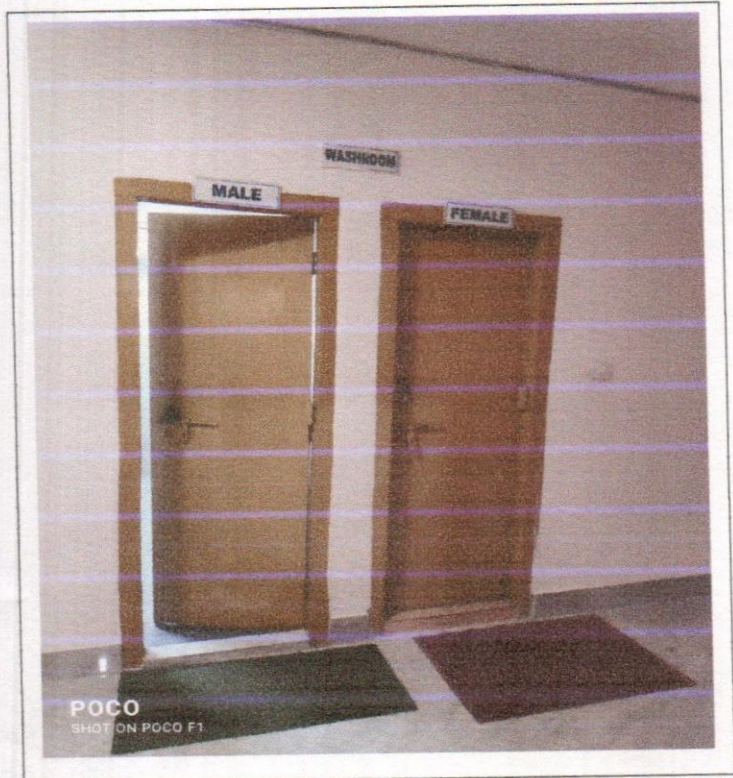
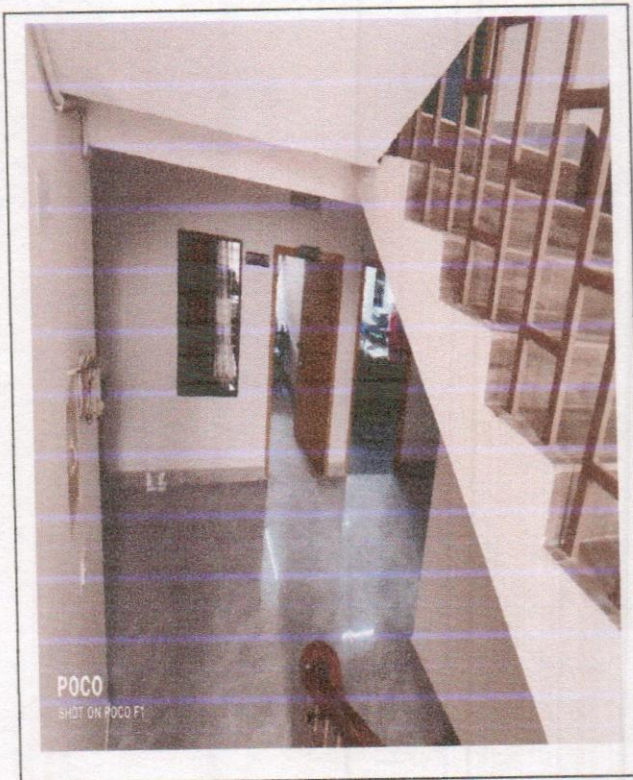
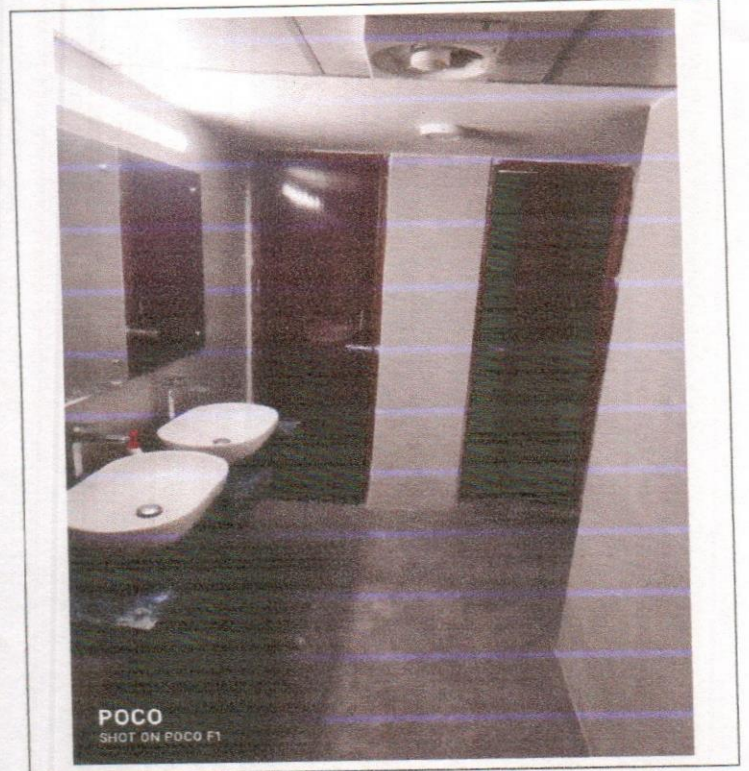
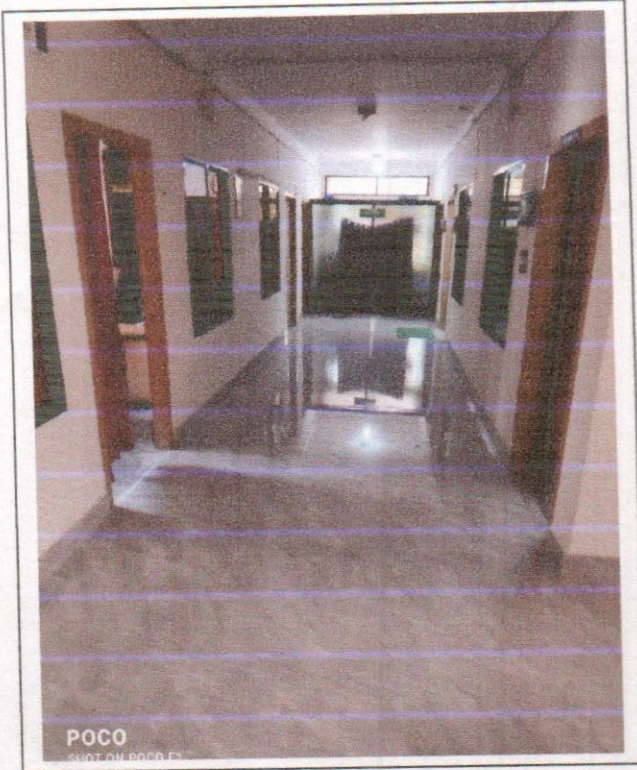
আব্দুল হান্নান শাহজাহান আলী
নির্বাহী প্রকৌশলী
জিওসিভিলিটি, রংপুর,

১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহন



✓

১.৫ কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন প্রমানক



Handwritten signature or mark.

স্বাস্থ্য-সেবা-প্রদান-কেন্দ্র-প্রমাণপত্র

স্বাস্থ্য-সেবা-প্রদান-কেন্দ্র-প্রমাণপত্র /

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

রংপুর।

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এলজিইডি'র আওতায়
ঠিকাদারী লাইসেন্স নবায়ন রেজিস্টার

রেজিঃ নং- ৪৬.০২.৮৫০০.০০০.৯৯.০১৩.২৩

রেজিঃ খোলার তারিখ : ০৫/০৭/২০২৩ইং

মনোয়ারা বুক বাইন্ডিং

বাংলাদেশ।

৬০৫ মোঃ কামাল হোসেন
জি.আঃ. ৬০২৬-২০২৬
শ্রমিক শ্রম, শ্রমিক শ্রম
০১৭১৭-২৪৪৫৬৭.

৭৩
২১/১০/২৬
৬১-৪৪৪০/-

৭৭
২১/১০/২৬
৬১-৪৪৪০/-

[Signature]
মোঃ কামাল হোসেন
নিবাসী মোঃ কামাল হোসেন
এমজিইডি, ১২৭৭৭

৬০৬ মোঃ হামিদ আলী হামিদ
জি.আঃ. ৬০২৬-২০২৬
০১৭১৩-৭৬৬৫১৮
২০২২-২০২৬
২০২৬-২০২৮

৩৭
২১/১০/২৬
৬১-২২৪৪০/-

২৮
২১/১০/২৬
৬১-২২৪৪০/-

২৬
২১/১০/২৬
৬১-৪৪৪০/-

২০
২১/১০/২৬
৬১-৪৪৪০/-

৬০৭ মোঃ হোসেন আলী হোসেন
জি.আঃ. ৬০২৬-২০২৬
০১৭১৭-২৩৬৭৩৭

২২
২১/১০/২৬
৬১-৪৪৪০/-

২১
২১/১০/২৬
৬১-৪৪৪০/-

[Signature]
মোঃ হোসেন আলী হোসেন
নিবাসী মোঃ হোসেন আলী হোসেন
এমজিইডি, ১২৭৭৭
০১৭১৭-২৩৬৭৩৭
৫৬

৬০৮ মোঃ হামিদ আলী হামিদ
জি.আঃ. ৬০২৬-২০২৬
০১৭২৩-২৭১৩৪০

৪৭
২১/১০/২৬
৬১-৪৪৪০/-

৪০
২১/১০/২৬
৬১-৪৪৪০/-

[Signature]

৬০৯ মোঃ হামিদ আলী হামিদ
জি.আঃ. ৬০২৬-২০২৬
০১৭১৭-০৩৫৭৩৭

৪৬
২১/১০/২৬
৬১-৪৪৪০/-

৪১
২১/১০/২৬
৬১-৪৪৪০/-

[Signature]
মোঃ হামিদ আলী হামিদ
নিবাসী মোঃ হামিদ আলী হামিদ
এমজিইডি, ১২৭৭৭
০১৭১৭-০৩৫৭৩৭

৬১০ মোঃ হামিদ আলী হামিদ
জি.আঃ. ৬০২৬-২০২৬
০১৭৩২-০৬২৪৪৭

০১
২১/১০/২৬
৬১-৪৪৪০/-

০৫
২১/১০/২৬
৬১-৪৪৪০/-

[Signature]
মোঃ হামিদ আলী হামিদ
নিবাসী মোঃ হামিদ আলী হামিদ
এমজিইডি, ১২৭৭৭
০১৭৩২-০৬২৪৪৭

1409 =

अमान जोरवट विभागाध्यक्ष
प्रा: प्रा: बाबू रामानुजाम्
बाउमन रावे, गोरगमरा
01880-020610

५९
२४/१/७६
६१-२०००f

५६
२४/१/७६
६१-७०००f

26.12.23

৬১৮ হামিন বিন্দুপাত্রিক 36 37
 প্রাঃ ভাঃ মোঃ জেদ আলম চক্ৰ২২২০ চক্ৰ২২২০
 মদচ কল্পচ চ-৪৫০৭ চ-৭৫০৭
 ০১৭১১-৯২৭৪৬৭.

[illegible]

୧୨୦) ଜମାଦାର ମାଧବସିଂହ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 38
 = ଜମା: ଜମା: ମାଧବସିଂହ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ୦୭/୧୨/୨୩ 36
 ମାଧବସିଂହ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ୦୮-୦୮୦୦/ ୦୮-୦୮୦୦/=
 ୦୧୭/୧୨-୫୫୨୪୩୧

[Handwritten signature]

U20 (স্বামী নারায়ণ) এড (কল্লু)
 প্রঃ নারায়ণ (আশ্রম)
 নিউ জার্সি, ইউ.এস.
 ০১/১২-০৭৭২৩৬.

37
 ০৭/১২/২৩
 ০১-০০০০/

35
 ০৭/১২/২৩
 ১০.৯০০০/

27/12/2024

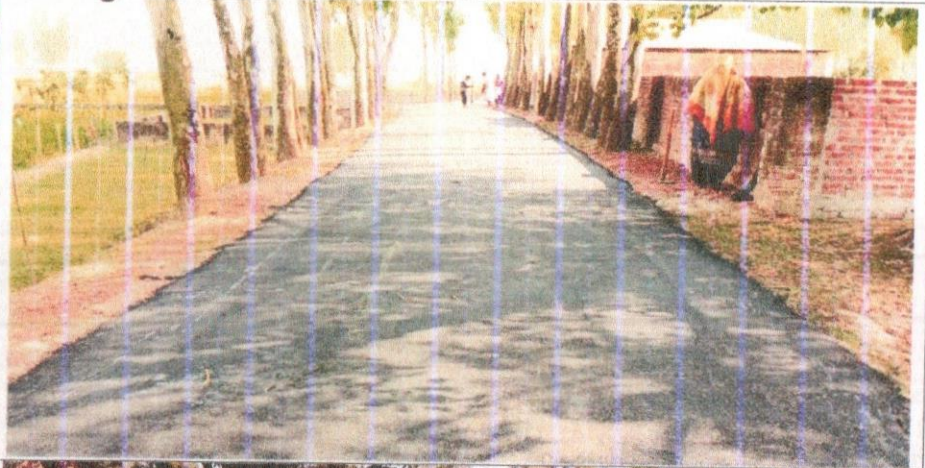
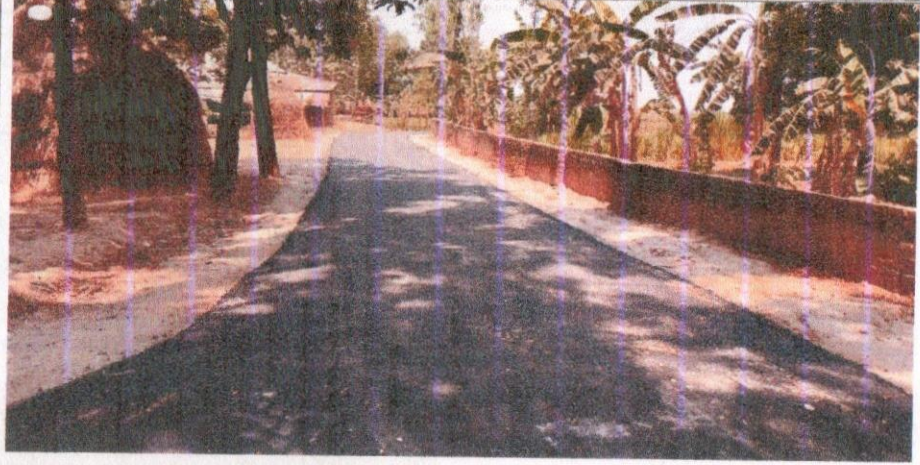
୬୨୨ ମୁକ୍ତମାନ ବିକ୍ରୟରେ ୦୧ ୦୨
 ଶ୍ରୀ: ଶ୍ରୀ: ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଯୋଗୀ ୨୫/୦୨/୨୦
 ମାଧ୍ୟମେ ମାନ୍ୟତା, ବୃତ୍ତ, ୫୫-୫୦୦୫ ୫୫-୫୦୦୫
 ୦୧୭୨-୫୫୨୬୫୬

[illegible]

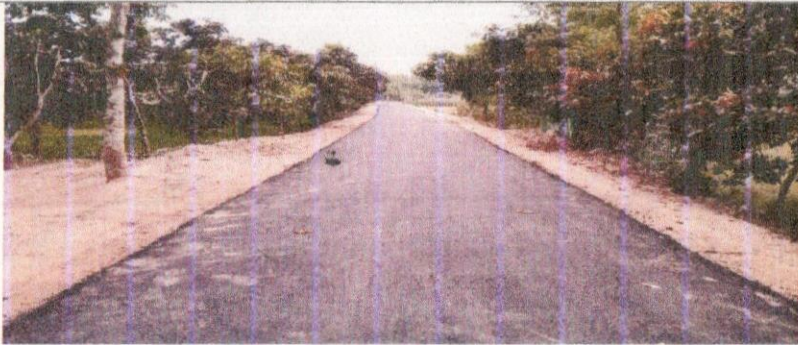
1422 ಹಂಪಿಯ ಪ್ರತಿಮೆ $\frac{01}{25/06/28}$ $\frac{02}{25/06/28}$
 - ಶ್ರೀ: ಸಾ: ಹಂಪಿಯ ವಿಭಾಗ
 ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯ: ಸಂಪನ್ಮೂಲ - ರೂ- 6000/- ರೂ- 2200/=

১৬

৩.২ (সম্পাদিত পূর্ত কাজের চূড়ান্ত বিলের সাথে স্থির চিত্র)

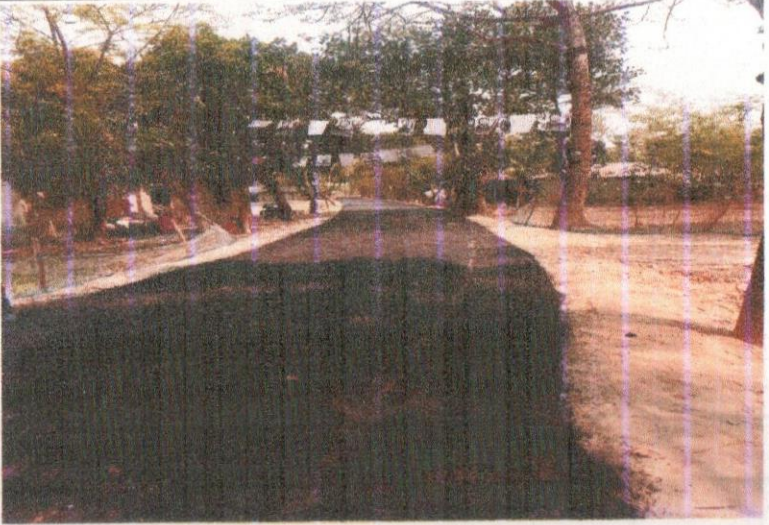
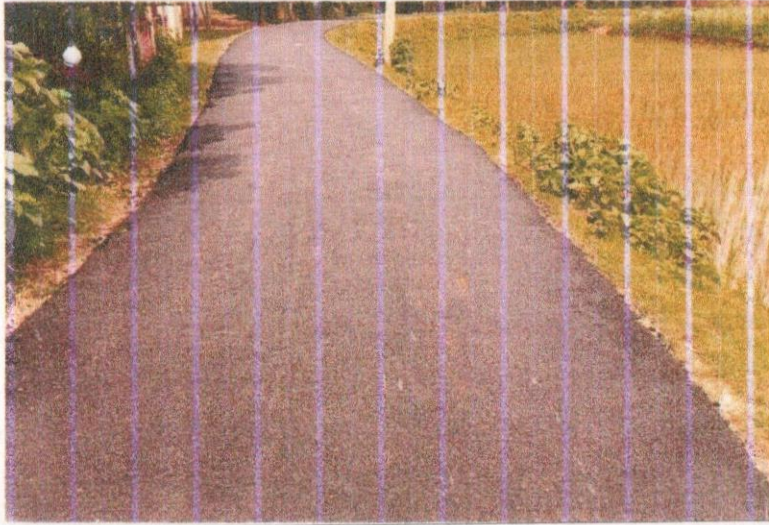
ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	কাজের বিবরণ	চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকায়)	চূড়ান্ত বিল (লক্ষ টাকায়)	স্থির চিত্র
০১।	IRIDP-3/ RNG/DW- 117	Improvement of Rautpara R&H-Sanerhat Road at Ch.2338-2788m. [R.ID.1857654004]	৪২.৬৪	৪০.৫১	
০২।	IRIDP-3/ RNG/DW- 139	Improvement of NHW(Mozidpur) Gura Doctor shop to Boterhat Road Ch.00- 1000m. [R.ID.185765171]	১০০.৯৩	৯৫.৮৮	

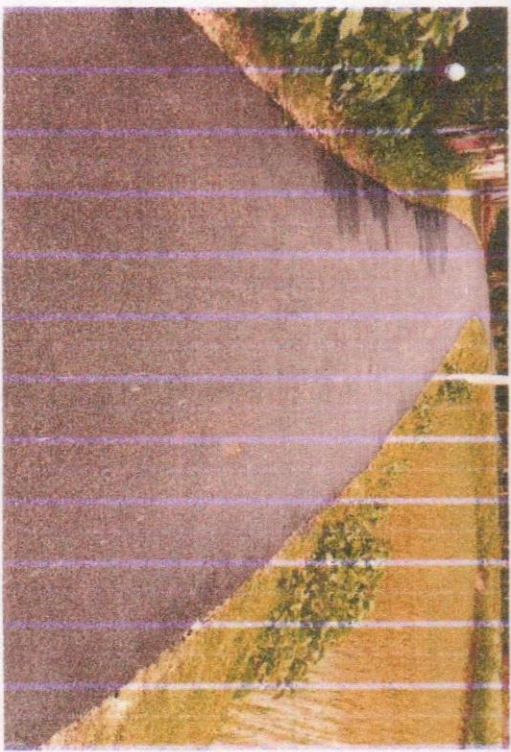
✓

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	কাজের বিবরণ	চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকায়)	চূড়ান্ত বিল (লক্ষ টাকায়)	স্থির চিত্র
০৩।	RDRIP-2/W- UNR-250	Improvement of Mominpur UHQ - Lahirirhat via Mutakpur Road (Ch.2100-3100m), ID NO. 185493017.	১০৯.২৮	১০৩.৮১	
০৪।	RDRIP-2/ W-SCH-105	Improvement of Kutubpur Balua Para Govt. Primary School Connecting Road .Ch: 00 - 1.000 km . School Code -105060503. [Badarganj]	৯৭.৬৯	৯২.৮০	

✓

ক্রমিক সং	প্রকল্পের নাম	কার্যের বিবরণ	পরিচালনা (সহ পরিচালক)	প্রাপ্তি তারিখ (সহ পরিচালক)	স্থান
০৫।	RDRIP-2M- HAT-007	Improvement of Joybangla Rural Hat under Taraganj Upazila.	২৫.৫৮	২৪.৩০	
০৬।	RDRIP-2M- SCH-106	Improvement of Mossal Mari Girls Govt. Primary School Connecting Road .Ch: 00 - 0.850 km . School Code -105061007. [Badarganj]	৭৮.২৬	৭৪.৩৫	

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	কাজের বিবরণ	চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকায়)	চূড়ান্ত বিল (লক্ষ টাকায়)	স্থির চিত্র
০৭।	RDRIIP-2/RW- UZR-032	Remaining work of Mominpur G.C - Harkali NHW Via Munsirhat Road (Ch.2328 -3753m), ID NO. 185492027 [Sadar]	৬৭.৫১	৬৪.১৩	
০৮।	RDRIIP-2/ W-VRB-225	Remaining work of Nachimonpur Bottola at Bhandabari to Khalaspir Falia Road Ch. 00- 760m.ID No-185765114	১১৫.০২ 	১০৯.২৭	

ক্রমিক ক নং	প্যাকেজ নং	কাজের বিবরণ	ইতিমধ্যে (লক্ষ টাকায়)	ইউত্তর বিল (লক্ষ টাকায়)	স্থির চিত্র
০৯।	UTMDP/RAN G/TARAWR- 380	Improvement of Adarsha School - Zigantai via Kader Masters House at Ch. 600-1210 of Kursha Union under Taraganj Upazila, Dist: Rangpur.	৫৩.৫৪	৪৮.৯৯	
১০।	LGED/RANG/ VRRP/Re- hab/23-24/W- 43	Rehabilitation work of Kalabagan RHD- Gurzipara hat Road from Ch. 3370 -4370m at Pirganj	৪৫.৯৪	৪৩.৬৪	

পরিদর্শন প্রতিবেদন

বিভাগ : রংপুর

অঞ্চল : রংপুর

জেলা : রংপুর

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্কিমের বিবরণ	পরিদর্শনকৃত স্কিমসমূহের পরিমাপিত ত্রুটি/সমস্যাসমূহের বর্ণনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নির্মাণ সামগ্রীর গুণগতমান ও পরিমাণ ইত্যাদি)			স্কিমটি নির্দিষ্ট সময়ে সমাপ্ত না হলে সময় বর্ধন যথাযথ কর্তৃপক্ষ হতে গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? (হ্যাঁ/না)	Frequency অনুযায়ী Lab test সম্পাদন করা হয়েছে কিনা? (হ্যাঁ/না)	ত্রুটি সংশোধনে সুপারিশমালা/ গৃহীত ব্যবস্থাাদি ও মন্তব্য
				Item	Design Specification	Field Observation			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	২১.০৫.২০২৪	গংগাচড়া	Widening of Burirhat GC- Kakina RHD Road (Gangachara Part) Road from ch. 4370m-5900m. [Gangachara](185272012)	Edging	125mm	কাজটি ১০০% সমাপ্ত দেখা যায়। চেইনেজ 4560m, 5032m, 5543m, 5810m এ dense Carpeting এর পুরুত্ব যথাক্রমে mm, 104mm, 103mm, 100mm 102mm পাওয়া গেল। রাস্তার প্রশস্ততা সঠিক পাওয়া গেল।	প্রযোজ্য নহে	হ্যাঁ	সড়কের মাটির কাজ Specification মোতাবেক করার জন্য বলা হলো।
			Completion Date : 15/02/2024	Dense Carpeting	100mm				
			Physical Progress : 100%	Stone Aggregate Base Course	225mm				
			Name of Project : GOBM	Road Safty work	Kilo meter post-5 Nos, Guide Post 104 nos. Name Plate 2 no.				
			বাস্তবায়নে নিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী :						
			নির্বাহী প্রকৌশলী : মোহাম্মদ শাহজাহান আলী						
			উপজেলা প্রকৌশলী : মোঃ মজিদুল ইসলাম						
২	৫/২১/২০২৪	সদর	Rehabilitation (Widening) of Shyampur GC-Keranirhat GC Road from Ch.3000m-6200m [Rangpur-S](185492007)e-Tender/ LGED/ Rang/GOBM/23-24/RW-23	Edging	125mm	কাজটি ১০০% সমাপ্ত দেখা যায়। চেইনেজ 3105m, 3479m, 6195m এ Carpeting এর পুরুত্ব যথাক্রমে 42mm, 44mm, 45mm পাওয়া গেল। রাস্তার প্রশস্ততা সঠিক পাওয়া গেল।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			Completion Date :	Dence Carpetint	40mm				
			Physical Progress : 100%	Overlay	75mm				
			Name of Project : GOBM	Road Safty work	U-Drain-1 (0.625x0.625mm)				
			বাস্তবায়নে নিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী :		Guide Post-100				
			নির্বাহী প্রকৌশলী : মোহাম্মদ শাহজাহান আলী		Name Plate-1				
			উপজেলা প্রকৌশলী : আহমেদ হায়দার জামান		Kilometer Post-4				
			উপ-সহকারী প্রকৌশলী : মোঃ আলিমুজ্জামান		Traffic Sign-18 Nos				
			কার্য সহকারী : মোঃ আশিকুর রহমান						

