পরিকল্পনা বিভাগের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক **সার-সংক্ষপঃ**

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	পরিকল্পনা বিভাগ	০২টি	০২টি	০টি	০০টি	০২টি	২টি	১৫ মাস (৩১.৯১%)	০২টি	২১৫.৯৫ (২.১০%)
								১২ মাস (৮৫.৭১%)		-৯৩.৪৬ (-৩২.২৬%)

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা :** ০২টি

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকাল :**

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
১।	"পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের আবাসিক ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" প্রকল্প	১০০৪৮.৫৮	আগস্ট, ২০১৫ হতে সেপ্টে, ২০১৯ পর্যন্ত
২।	"Impact Assessment and coping up strategies of Graduation From LDC Status For Bangladesh" প্রকল্প	১৯৬.১৭	মে, ২০১৮ হতে জুন,২০২০ পর্যন্ত

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ :**

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
১) পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের আবাসিক ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	১ম সংশোধনীতে প্রকল্প মেয়াদ আগস্ট,২০১৫ হতে জুন,২০১৯ মেয়াদে নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি পায় ১২ মাস বা ২৫.৫৩%। নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ না হওয়ায় পরবর্তীতে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ৩মাস বৃদ্ধি করে আগস্ট,২০১৫ থেকে সেপ্টেম্বর,২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। এ প্রকল্পের ২ বারে সময় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫ (পনের) মাস বা ৩১.৯১%।
Impact Assessment and coping up strategies of Graduation From LDC Status For Bangladesh প্রকল্প।	**প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিঃ** সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে Impact Report প্রণয়নপূর্বক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন করে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য পরামর্শক সভা , সেমিনার, ওয়ার্কশপ আয়োজন এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য প্রকল্পের মেয়াদ মে,২০১৮ হতে জুন/২০১৯ এর পরিবর্তে প্রকল্প মেয়াদ ৬মাস বৃদ্ধি করে মে,২০১৮ হতে ডিসেম্বর,২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৪/০৪/২০১৯ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। **প্রকল্প সংশোধনঃ** সমীক্ষা প্রতিবেদনটি চূড়ান্তকরি সরকারি কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমবাস্তবায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করে মুদ্রণ, প্রকাশ ও বিতরণ কার্যক্রম

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
	সম্পাদন এবং প্রয়োজনীয়তার আলোকে প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয়ের হ্রাস/বৃদ্ধিকরণের ফলে প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৬৬.৩৫ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে প্রকল্প মেয়াদ মে,২০১৮ হতে জুন,২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৩/০২/২০২০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

সংযুক্তি-১

৪। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ :**

ক্রমিক নং	পর্যবেক্ষণ ও সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
১.	১.১) **Time Over run:** মূল ডিপিপিতে প্রকল্পটি আগস্ট,,২০১৫ হতে জুন,২০১৮ মেয়াদে গত ২৯/১০/২০১৫ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছিল। ১ম সংশোধনীতে প্রকল্প মেয়াদ আগস্ট,২০১৫ হতে জুন,২০১৯ মেয়াদে নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি পায় ১২ মাস বা ২৫.৫৩%। নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ না হওয়ায় পরবর্তীতে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ৩মাস বৃদ্ধি করে আগস্ট,২০১৫ থেকে সেপ্টেম্বর,২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। এ প্রকল্পের ২ বারে সময় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫ (পনের) মাস বা ৩১.৯১%। প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতার ফলে উপকারভোগীদের প্রকল্পের সুফল পেতে বিলম্ব ঘটেছে। ১.২) **Cost Over run**: প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১০২৬৪.৫৩ লক্ষ টাকা নির্ধারিত থাকলেও ১ম সংশোধনীতে প্রকল্পটির ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ১০৪১১.২৮ লক্ষ টাকা। মূল অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা প্রকল্প ব্যয় ১৪৬.৭৫ লক্ষ টাকা বা ১.৪২% বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১০০৪৮.৫৮ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মূল অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা ২১৫.৯৫ লক্ষ টাকা কম (২.১০%) ব্যয় হয়েছে। প্রকল্প প্রণয়নকালে যথাযথ পরিকল্পনা ও ব্যয় প্রাক্কলনে ঘাটতি ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়। ১.৩) **ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনঃ** এ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন ৬ জন প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পরিকল্পনা বিভাগ হতে জারিকৃত "সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি" বিষয়ক পরিপত্র অনুসারে ৫০ কোটি টাকার উর্দ্ধে প্রকল্পের ক্ষেত্রে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দিতে হয়। এ প্রকল্পটির প্রাক্কলন ছিল ১০৪১১.২৮ লক্ষ টাকা । কিন্তু পরিপত্র অনুযায়ী পূর্ণকালীন প্রকল্প পারিচালক পদায়ন না করায় পরিপত্রের বিধান লংঘন করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। ১.৫) **পিসিআর প্রণয়নে দুর্বলতাঃ** মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনায় নিম্নবর্ণিত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়ছেঃ -পিসিআর এর পৃষ্ঠা-১০ এ ৩, ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদে প্রকল্প পরিচালক, সংস্থা প্রধান ও মন্ত্রণালয়/ বিভাগের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তার মন্তব্য উল্লেখ না থাকায় তা সংশোধন করে পুনরায় আইএমইডিতে প্রেরণের জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু প্রকল্প পরিচালক ও সংস্থা প্রধানের মন্তব্য ছাড়াই নির্বাহী প্রকৌশলী, শেরে বাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-৩ স্বাক্ষর সম্বলিত পিসিআর আইএমইডিতে ০৮ ফ্রেব্রুয়ারি,২০২১ প্রেরণ করা হয়। -প্রকল্প পরিচালকগণের দায়িত্ব পালনের সুনির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। -আরএডিপিতে প্রকল্পের মেয়াদ ছিল আগস্ট,২০১৫ হতে জুন,২০১৯ পর্যন্ত। পরবর্তীতে পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প মেয়াদ ৩মাস বৃদ্ধি করে আগস্ট,২০১৫ হতে সেপ্টেম্বর,২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব আইএমইডিতে প্রেরণ করে। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্পের মেয়াদ আগস্ট,২০১৫ হতে সেপ্টেম্বর,২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাবে আইএমইডি সম্মতি প্রদান করে। অর্থাৎ প্রকল্পের মেয়াদ নির্ধারিত হয় আগস্ট,২০১৫ হতে	১.১) প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের চুক্তির মেয়াদের মধ্যে কাজ সম্পন্ন হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের চুক্তির মেয়াদ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রয় কাজে মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার চলমান প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম যথাসম্ভব ডিপিপি'র সিডিউল অনুসরণ করতে হবে এবং চুক্তি মেয়াদের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে হবে; ১.২) প্রকল্পের আওতায় ভবনে সংযোজিত লিফটগুলো নিয়মিত সার্ভিসিং করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এছাড়া ভবনের ইলেকট্রিক লাইন (ডাক), রান্নাঘরের পাইপ দিয়ে পানি পড়া , জানালার থাই গ্লাসের সমস্যা এবং বিল্ডিং (জুঁই) এর টপ ফ্লোরের ছাদ লিক করে পানি পড়া বন্ধ করাসহ ভবনের অন্যান্য ত্রুটিসমূহ দূর করতে হবে। পিডব্লিউডি এবং পরিকল্পনা বিভাগ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ; ১.৩) প্রকল্পটি নির্ধারিত মেয়াদে শেষ হয়নি, মূল ডিপিপি অনুয়ায়ী মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫ মাস বা ৩১.৯১% । প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে প্রকল্পের ডিজাইন/প্রাক্কলন/ পরিকল্পনা যথাযথভাবে প্রণয়ন করতে হবে। মন্ত্রণালয়/ বাস্তবায়নকারী সংস্থার পরবর্তী প্রকল্পের ক্ষেত্রে নির্ধারিত মেয়াদ ও প্রাক্কলনের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো ; ১.৪) এ প্রকল্পে ৬ জন প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক ভবিষ্যতে পরবর্তী প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বিভাগের পরিপত্রের বিধান অনুসরণ করে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য জনবল নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ; ১.৫) ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৩টি অভ্যন্তরীণ অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। এ আপত্তিগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করে আইএমইডিতে প্রমাণক পাঠাতে হবে।

ক্রমিক নং	পর্যবেক্ষণ ও সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
	সেপ্টেম্বর,২০১৯ পর্যন্ত। কিন্ত প্রেরিত পিসিআর-এ প্রকল্পের মেয়াদ দেখানো হয়েছে আগস্ট,২০১৫ হতে জুন,২০১৯ পর্যন্ত।	
২.	২.১) **Time Over Run**: প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল ছিল মে,২০১৮ হতে জুন,২০১৯ পর্যন্ত। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০৬ মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর,২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধনপূর্বক প্রকল্পের মেয়াদ আরো ০৬ মাস বৃদ্ধি করে প্রকল্প ময়াদ মে, ২০১৮ হতে জুন,২০২০ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল ১ বছর ২মাস নির্ধারিত থাকলেও প্রকল্প সমাপ্ত হতে সময় ব্যয় হয়েছে ০২ বছর ০২মাস। ফলে প্রকল্পের টাইম ওভাররান হয়েছে ১ বছর যা মূল অনুমোদিত সময়ের ৮৫.৭১%। এ জাতীয় ছোট একটি প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনার জন্য প্রকল্পটির ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক টাইম ওভার রান (১ বছর) হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। ২.২) **প্রকল্প মনিটরিং :** নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক গত ১৯/০৬/২০১৯ তারিখে পরিদর্শনপূর্বক ০৪টি সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন পরিকল্পনা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তবে আইএমইডি'র সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি। তাছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তাগণ প্রকল্পটি পরিদর্শন করেননি। ২.৩) **অসম্পূর্ণ পিসিআর প্রেরণঃ** মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত আলোচ্য প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনান্তে কিছু অসম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হওয়ায় (যেমন -পিসিআরএর ২৯ নং পৃষ্ঠায় ৬, ৭ ও ৮ নং অনুচ্ছেদে প্রকল্প পরিচালক, সংস্থা প্রধান ও বিভাগের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তার মন্তব্য উল্লেখ ছিল না) । তা সংশোধন করে পুনরায় আইএমইডিতে প্রেরণের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশোধিত পিসিআর ১৪ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয় ।	২.১) নিম্ন আয়ের দেশের ক্যাটাগরী (এলডিসি) হতে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশের উপর যে সম্ভাব্য প্রভাব পড়তে পারে তা নিরুপণ এবং এ সকল প্রভাব মোকাবেলায় কৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে এই সমীক্ষা প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর এবং প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়েছে এবং সমীক্ষার মাধ্যমে সম্ভাব্য প্রভাবসমূহ নির্ধারণসহ তা মোকাবেলায় যথাযথ কর্মকৌশল সুপারিশ করা হয়েছে। এ সকল সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক কি ধরনের উদ্যোগ/কর্মকান্ড গ্রহণ করছে বা করবে সে বিষয়ে গবেষণা পরিচালন করা যেতে পারে। বাস্তবায়নকারী সংস্থা /প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে উদ্যোগ গহণ করবে; ২.২) প্রকল্প থেকে সঠিক সময়ে সুফল প্রাপ্তি এবং বিনিয়োগকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিজাইন/পরিকলপনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে প্রকল্পে Time over run না ঘটিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করা যায় ; ২.৩) আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শিতব্য অন্যান্য প্রকল্প পরিদর্শনের সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে এবং সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং জোরদার করতে হবে ; ২.৪) প্রকল্প সমাপ্তির পর পিসিআর প্রণয়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে যত্নশীল হতে হবে এবং ভবিষ্যতে পিসিআর প্রেরণের ক্ষেত্রে নির্ভুল এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। ২.৫) আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত আসবাবপত্র/যন্ত্রাংশ ও মালামালগুলো কোনটি কোথায় ব্যবহৃত হচ্ছে তার একটি ডাটাবেইজ সংরক্ষণ করতে হবে। যাতে পরবর্তীকালে প্রয়োজনে আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও যন্ত্রপাতি/সামগ্রীর অবস্থান নিশ্চিত করা যায় ।

পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের আবাসিক ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক **প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: সেপ্টেম্বর,২০১৯)

১। প্রকল্পের নাম : পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের আবাসিক ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)।

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পরিকল্পনা বিভাগ/ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

৩ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : গণপূর্ত বিভাগ (পিডব্লিউডি)।

৪। প্রকল্পের অর্থায়ন : বাংলাদেশ সরকারের জিওবি অর্থে বাস্তবায়িত।

৫। প্রকল্পেরঅবস্থান : আগারগাঁও, তালতলা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

০৬। **প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত :** (লক্ষটাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০২৬৪.৫৩	১০৪১১.২৮	১০০৪৮.৫৮	আগস্ট,২০১৫ হতে জুন,২০১৮	আগস্ট,২০১৫ হতে জুন,২০১৯	আগস্ট, ১৫ হতে সেপ্টে, ২০১৯	আগস্ট,১৫ হতে সেপ্টে, ২০১৯	-২১৫.৯৫ বা (২.১০%)	১৫ মাস বা +(৩১.৯১%)

খ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ব্যয় হ্রাসের হার : ২.১০%

(গ) মূল প্রাক্কলনের সাথে মেয়াদ বৃদ্ধির হার: ৩২%

০৭। **প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়া:** পরিকল্পনা কমিশন/বিভাগের ২য় ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আবাসনের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী একটি আবাসন প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ঢাকাস্থ শেরে বাংলা নগরের তালতলায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১১৮.০৫ ডেসিমেল জমির উপর ৬৫০ বর্গফুট আয়তনের ০২টি এবং ৮০০ বর্গফুট আয়তনের ২টি মোট ৪টি ভবনে ২২৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য মূল প্রকল্পটি মোট ১০২৬৪.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আগস্ট,২০১৫ হতে জুন,২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৯/১০/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ভবনসমূহের প্লিন্থ এরিয়া বৃদ্ধি, পাইলিং এর সংখ্যা বৃদ্ধি, স্লাবের পুরুত্ব পরিবর্তন, বীমের সাইজ পরিবর্তন, রডের পরিমাণ বৃদ্ধি, ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৫তলা মসজিদ নতুনভাবে অন্তর্ভুক্তিসহ আনুষংঙ্গিক কারণে প্রকল্পটি সংশোধন করে ১০৪১১.২৮ লক্ষ টাকা (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১.৪৩%) নির্ধারণপূর্বক আগস্ট,২০১৫ হতে জুন,২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৮/০৬/২০১৮ তারিখে ভৌত অবকাঠামো কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ৭/৫/২/২০১৯ তারিখে সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কতিপয় অংগের আন্তঃখাত সমন্বয় প্রস্তাব মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৫/৫/২০১৯তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ আগস্ট,২০১৫ হতে সেপ্টেম্বর,২০১৯ পর্যন্ত (মূল বাস্তবায়নকালের ৩২%) বৃদ্ধি করা হয় যা ৩০/০৭/২০১৯ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।

০৮। **প্রকল্পেরউদ্দেশ্য :**

- পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসিক সমস্যার সমাধান করা ;
- ভূমির কার্যকরি ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- সরকারী ভূমিতে অবৈধ প্রবেশ প্রতিরোধ করা;
- সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা ।

৯। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :**

(ক) ১৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৬৫০ বর্গফুট আয়তনের ২টি ভবন নির্মাণ;

(খ) ১৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৮০০ বর্গফুট আয়তনের ২টি ভবন নির্মাণ;

(গ) ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ১১১০ বর্গমিটার আয়তনের ১টি মসজিদ নির্মাণ;

(ঘ) সীমানা প্রাচীর ও গেট নির্মাণ;

(ঙ) অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ওয়াকওয়ে ও ড্রেন এপ্রোন

(চ) জলাধার ও পাম্প হাউজ

(ছ) বহিঃস্থ পানি সরবরাহ

(জ) বহিঃস্থ বিদ্যুতায়ন

ক্রঃ নঃ	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(রাজস্বখাত)						
১	স্টেশনারি ক্রয়	থোক	৮.০০	থোক	১.৭২ (২১%)	১০০%
২	স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং	সংখ্যা	৫.০০	১টি	৪.৫৪ (৯০%)	১টি (১০০%)
৩	টেন্ডার ডকুমেন্ট	সংখ্যা	৪.০০	১টি	২.০২ (৫০%)	১টি (১০০%)
৪	বিজ্ঞাপন	সংখ্যা	৫.০০	১টি	২.১১ (৪২%)	১টি (১০০%)
৫	আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং	সংখ্যা	৭.০০	১টি	৫.০০ (৭১.৪২%)	১টি (১০০%)
৬।	সম্মানী টিইসি,পিআইসি, পিএসসি)	থোক	২৪.০০	থোক	১৮.৪১ (৭৬.৭০%	থোক (১০০%)
৭	প্রকল্প পরিচালকের জন্য পরিদর্শন যান ভাতা	থোক	৮.০০	থোক	০০	প্রয়োজন হয়নি
৮	প্রকল্পের উদ্বোধনী	থোক	৬.০০	থোক	০০	প্রয়োজন হয়নি
৯	ভিত্তি স্থাপন	থোক	১০.০০	থোক	০০	প্রয়োজন হয়নি
১০	কম্পিউটার, প্রিন্টার, সফটওয়্যার	থোক	৩.০০	থোক	১.৮৬ (৬২%)	থোক (১০০%)
১১	তিতাস ফিসহ বহি: গ্যাসলাইন	সংখ্যা	৪০.০০	২২৪টি ফ্ল্যাট	০০	২২৪টি ফ্ল্যাট (১০০%)
১২	ডিপিডিসি/ডেসকো চার্জ	সংখ্যা	৩৫.০০	২২৪টি ফ্ল্যাট	১২.৭৬ (৩৬.৪৫%)	২২৪টি ফ্ল্যাট (১০০%)
১৩	কন্টিনজেন্সি চার্জ	থোক	১৬.০০	থোক	৯.২০ (৫৭.৫০%)	থোক (১০০%)
১৪	অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ	থোক	১৫.০০	থোক	১৩.০৯ (৮৭%)	থোক (১০০ঁ%)
উপমোট : (রাজস্ব)			১৮৬.০০		৭০.৭১ (৩৮%)	থোক (১০০%)
১৫ তলা ভিতের উপর ১৫ তলা ভবনের অভ্যন্তরীণ স্যানিটারি, পানি, সরবরাহ, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ						
১৫	ভবন নং-১ (৬৫০ বর্গফুট)	বঃমিঃ	১৭৭২.০৭	৫৬৮২.৯০	১৭৫৫.০০ (৯৯%)	৫৬৮২.৯০ (১০০%
১৬	ভবন নং-২ (৬৫০ বর্গফুট)	বঃমিঃ	১৭৭২.০৭	৫৬৮২.৯০	১৭৫৩.৬০ (৯৯%)	৫৬৮২.৯০ (১০০%)
১৭	ভবন নং-১ (৮০০ বর্গফুট)	বঃমিঃ	১৮৯৯.০৫	৫৯৯৬.৪০	১৮৭৪.৩৯ (৯৯%)	৫৯৯৬.৪০ (১০০%)
১৮	ভবন নং-২ (৮০০ বর্গফুট)	বঃমিঃ	১৮৯৯.০৫	৫৯৯৬.৪০	১৮৮৩.৩৪ (৯৯%)	৫৯৯৬.৪০ (১০০%)
১৯	৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫ তলা মসজিদ	বঃমিঃ	৪৬০.০০	১১১০.০০	৪৫৫.৬২ (৯৯%)	১১১০.০০ (১০০%)
২০	ভূ:গর্ভস্থ অগ্নি নির্বাপণ জলাধার ও পাম্প হাউজ	গ্যালন	৭৫.৩৬	৫০০০০	৬৫.৬৬ (৮৭%)	৫০০০০ (১০০%)
২১	বহিঃস্থ গ্যাস সংযোগ	সংখ্যা	৩০.০০	২২৪টি ফ্ল্যাট	২৪.০৭ (৮০%)	২২৪টি ফ্ল্যাট (১০০%)
২২	বহিঃস্থ পানি সরবরাহ	সংখ্যা	২৪০.২০	২২৪টি ফ্ল্যাট	১৬৩.৮৮ (৬৮%)	২২৪টি ফ্ল্যাট (১০০%)
External Electrification						
২৩	১২৫০ কেভিএ সাবস্টেশনের সাথে HT,LT Switchgear,PFI, HT,LT Cable	সংখ্যা	৬৩.৭৯	৪টি	৬৩.৭৯ (৯৯%)	৪টি (১০০%)
২৪	(ক) ৪টি ভবনের জন্য ডিস্ট্রিবিউশন ক্যাবল (খ) ক্যাবল টিভি, টেলিফোন, ইন্টারকমের জন্য পিভিসি পাইপ (গ) ৪টি ভবনের জন্য বিশেষ আর্থিং এবং আলোক সুরক্ষা ব্যবস্থা	সংখ্যা	৯৮.৩২	৪টি ভবন	৯৭.৮৮ (৯৯.৫৫%)	৪টি ভবন (১০০%)

২৫	৩০০ কেভিএ ইমার্জেন্সি জেনারেটর	সংখ্যা	৭৭.০০	৪টি	৭৫.৬৯ (৯৮%)	৪টি (১০০%)
২৬	লিফট ক্যাবল কন্ট্রোল ও সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৪৫৫.৫৭	৪টি	৪৫৪.১৭ (১০০%)	৪টি (১০০%)
২৭	পানি সরবরাহের জন্য পাম্প মটর (৩০ অশ্বশক্তি ও ৪১ অশ্বশক্তি)	সংখ্যা	৮০.০০		৪টি (৯৩.৫৩%)	৪টি (১০০%)
২৮	৪টি ভবনের জন্য অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র	সংখ্যা	৪০৫.৩২	৪টি ভবন	৪০৫.০০ (১০০%)	৪টিভবন (১০০%)
২৯	কম্পাউন্ড ও সিকিউরিটি প্যানেল লাইটের সাথে ক্যাবল কন্ট্রোল ডিভাইস।	সংখ্য	২০.০০	৪টি ভবন	১৮.০৪ (৯০%)	৪টিভবন (১০০%)
৩০	৪টি ভবনের জন্য ইন্টারকম	সংখ্য	৩৫.০০	৪টি ভবন	৩৪.৪৮(৯৮.৫০%)	৪টি ভবন (১০০%)
৩১	৪টি ভবনের জন্য ৪০ কিলোওয়াট সোলার প্যানেল	সংখ্যা	৩৩.০০	৪টি ভবন	৩৩.০০ (১০০%)	৪টি ভবন (১০০%)
৩২	২য় তলা ভিত ভিত বিশিষ্ট ১ তলা সাবষ্টেশন ভবনের ১ম তলা	বঃমিঃ	৬৩.০০	১৪৩ ব:মি:	৬৩.০০(১০০%)	১৪৩ব:মি: (১০০%)
৩৩	২য় তলা ভিত ভিত বিশিষ্ট ১ তলা সাব-শ্টেশন ভবনের উর্ধমূখী সম্প্রসারণ	বঃমিঃ	১২.০০	১৪৩ ব:মি:	১১.০৯ (৯২%)	১৪৩ ব:মি: (১০০%)
৩৪	সীমানা প্রাচীর ও নান্দনিক গেইট নির্মাণ।	মিঃ	৫৯.১৩	৩০০মিঃ	৫৮.৯৩ (১০০%)	৩০০মিঃ (১০০%)
৩৫	অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ওয়াকওয়ে ও ড্রেন নির্মাণ	বঃমিঃ	৪০.০০	৬৩২.০০	৪০.৩৬ (১০০%)	৬৩২.০০ (১০০%)
৩৬	ভূমি উন্নয়ন	ঘঃমিঃ	৯.৪৫	১০০৭.০০	৯.৩১ (৯৮.৫১%)	১০০৭.০০ (১০০%)
৩৭	অভ্যর্থনা ও গার্ডরুম	বঃমিঃ	২০.৩০	২৮.০০	১৭.৯৮(৮৮.৫৭%)	২৮.০০ (১০০%)
৩৮	কিচেন কেবিনেট, ওয়াল কেবিনেট ও কমন এরিয়ার ডেকোরেটিভ।	ভবন	৪০০.০০	৪টি ভবন	৩৫৪.৭৪ (৮৮.৬৮%	৪টিভবন (১০০%)
৩৯	নিরাপত্তা ব্যবস্থা, প্যালাসাইডিং, ব্রেসিং, শোর প্রোটেকশন	ভবন	২০০.০০	৪টি ভবন	১৮৬.৫৭ (৯৩%)	৪টি ভবন (১০০%)
৪০	ল্যান্ড স্কেপিং	থোক	৫.০০	থোক	৪.৭৫ (৯৫%)	থোক (১০০%)
মূলধনখাত :			১০২২৫.২৮		৯৯৭৭.৮৭ (৯৯%)	
সর্বমোট (রাজস্ব + মূলধন)			১০৪১১.২৮		১০০৪৮.৫৮ (৯৬.৫১%)	১০০%

১০। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি :

প্রাপ্ত পিসিআর অনুযায়ী

১১। **বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় :**

অর্থবছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়			বাস্তব অগ্রগতি
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাঃ		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাঃ	
২০১৫-২০১৬	৬৬৭.০০	৬৬৭.০০	--	৪১৪.৩৯	৪১৪.৩৯	৪১৪.৩৯	--	৪.৭১%
২০১৬-২০১৭	১৯০৫.০০	১৯০৫.০০	--	২০৪৯.৫০	২০৪৯.৫০	২০৪৯.৫০	--	২৩.৩১%
২০১৭-২০১৮	৪২০৭.০০	৪২০৭.০০	--	৩৯২৭.৭১	৩৯২৭.৭১	৩৯২৭.৭১	--	৩৮.৯৬%
২০১৮-২০১৯	৪০১৭.০০	৪০১৭.০০	--	৩৬৫৬.৯৮	৩৬৫৬.৯৮	৩৬৫৬.৯৮	--	৩৩.০২%
মোট:	১০৭৯৬.০০	১০৭৯৬.০০	--	১০০৪৮.৫৮	১০০৪৮.৫৮	১০০৪৮.৫৮	--	১০০%

প্রাপ্ত পিসিআর অনুযায়ী

১২। **প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:**

সংশোধিত অনুমোদিত ১০৪১১.২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আগস্ট,২০১৫ হতে সেপ্টেম্বর,২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১০৭৯৬.০০ লক্ষ টাকা এবং অর্থ অবমুক্তির পরিমাণ ১০০৪৮.৫৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১০০৪৮.৫৮ লক্ষ টাকা যা সংশোধিত অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৬.৫১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। অব্যয়িত অর্থ ছাড় হয়নি, একারণে সরকারি কোষাগারে জমা করার প্রয়োজন হয়নি মর্মে পরিদর্শনকালে জানা যায়।

১৩। **প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) :** প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়:

(ক) প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য ;
(খ) প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি ও পিসিআর পর্যালোচন;
(গ) প্রকল্পের নথি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং
(ঘ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৪। **প্রকল্প বাস্তবায়নে মনিটরিং কার্যক্রমঃ** প্রাপ্ত পিসিআর ও নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা বিভাগের সচিব কর্তৃক ০৩/১২/২০১৭ তারিখে প্রকল্পটি সরেজমিন পরিদর্শন করেছেন। প্রকল্প চলাকালিন সময়ে প্রকল্প পরিচালক বা মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন সম্পর্কে তথ্য জানা যায়নি। আইএমইডি'র তৎকালীন পরিচালক জনাব মোঃ শামীমুল হক ১৮/০১/২০১৭ তারিখে, জনাব নাসরিন সুলতানা, উপ-পরিচলক ০৯/১১/২০১৭ তারিখে এবং পরিচালক জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন গত ২১/০৭/২০১৯ তারিখে পরিদর্শন করেছেন।

১৫। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কি তথ্য :**

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী		পূর্ণকালীন	দায়িত্বের ধরণ	যোগদানের তারিখ	বদলির তারিখ
১	জনাব শফিকুজ্জামান, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), পরিকল্পনা বিভাগ।	না	আতিরিক্ত দায়িত্ব	জুন,২০১৫	নভেম্বর,২০১৫
২	জনাব এস.এম.ফয়সল আলম, উপসচিব (পিটি), পরিকল্পনা বিভাগ	না	আতিরিক্ত দায়িত্ব	ডিসেম্বর,১৫	মার্চ,২০১৬
৩	জনাব ফৌজিয়া জাফরিন, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), পরিকল্পনা বিভাগ	না	আতিরিক্ত দায়িত্ব	এপ্রিল,২০১৬	ডিসেম্বর,২০১৬
৪	জনাব খলিলুর রহমান খান, উপসচিব (প্রশাসন-১), পরিকল্পনা বিভাগ	না	আতিরিক্ত দায়িত্ব	জানুয়ারি,২০১৭	সেপ্টেম্বর,২০১৮
৫	ড. আসমা আক্তার জাহান, যুগ্মসচিব (প্রশাসন-৪), পরিকল্পনা বিভাগ	না	আতিরিক্ত দায়িত্ব	অক্টোবর,২০১৮	মার্চ,২০১৯
৬	জনাব এ বি এম মাহবুব আলম, উপপ্রধান, পরিকল্পনা বিভাগ।	না	আতিরিক্ত দায়িত্ব	এপ্রিল, ২০১৯	জুন,২০১৯

১৬। **প্রকল্পের জনবল নিয়োগঃ** প্রকল্পের কাজ পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা বিভাগ হতে একজন প্রকল্প পরিচালক, একজন কম্পিউটার অপারেটর ও একজন অফিস সহায়ক প্রকল্পে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে কাজ করেছেন। এ কারণে প্রকল্পে কোন জনবল নিয়োগের প্রয়োজন হয়নি।

১৭। **প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ**

ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত উদ্দেশ্য		অর্জন	
(ক)	পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসিক সমস্যার সমাধান করা।	(ক)	প্রকল্পের মাধ্যমে ২২৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণের ফলে পরিকল্পনা কমিশনের ২য় ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসন সমস্যার সমাধান হয়েছে। ২২৪ জন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারির আবাসিক চাহিদা পূরণ হওয়ায় সরকারের বাড়িভাড়া খাতে ব্যয় হ্রাস পাওয়াসহ রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে। আবাসিক এলাকাটি যথেষ্ট খোলামেলা এবং মনোরম পরিবেশ হয়েছে। ভবনগুলোর ডিজাইন এবং ফ্ল্যাটগুলোর অভ্যন্তরীণ ডিজাইন খুবই সুন্দর। ঢাকা মহানগরীর সরকারি কর্মকর্তা –কর্মচারিদের নবনির্মিত ভবনে উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে। তাছাড়া আবাসন ক্যাম্পাসে একটি ৫তলা বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণের ফলে মুসল্লিগণ স্বাচ্ছন্দে নামাজ আদায় করতে পারছেন। প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নত অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির ফলে তাঁদের জীবনমান উন্নত হয়েছে।
(খ)	ভূমির কার্যকরি ব্যবহার নিশ্চিত করা;	(খ)	সরকারী অব্যবহৃত জমি ব্যবহারের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর সরকারি কর্মকর্তা / কর্মচারিদের উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে। এতে সরকারের রাজস্ব আদায়ে ভূমিকা রাখবে।
(গ)	সরকারী ভূমিতে অবৈধ প্রবেশ প্রতিরোধ করা;	(গ)	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সরকারী জমি অবৈধ দখলমুক্ত হয়েছে। তাছাড়া উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান নিশ্চিত করার মাধ্যমে সরকারি চাকুরিজীবীদের কাছ থেকে আরো উন্নত সেবা প্রাপ্তিসহ সরকারি জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে।

১৮। **<u>প্রকল্প পরিদর্শন :</u>** প্রকল্পটির কার্যক্রম আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক কর্তৃক ২৯/০৬/২০২১ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগ বাস্তবায়নকারী সংস্থা হলেও প্রকল্পটির নির্মাণ কাজের ড্রইং ডিজাইন ও নির্মাণ কাজ ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে গণপূর্ত বিভাগ -৬ এর উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), উপসহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত বিভাগ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের আওতায় ১৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৬৫০ বর্গফুট আয়তনের ২টি ভবনে ১১২টি এবং ৮০০ বর্গফুট আয়তনের ২টি ভবনে ১১২টি মোট ৪টি ভবনে ২২৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় ৫তলা ভিতের উপর ৫তলা মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৯। **প্রকল্পের <u>প্রধান প্রধান ভৌত কাজ সংক্রান্ত:</u>** প্রকল্পের আওতায় ১৫ তলা ভিতের উপর মোট ৪টি ভবনে ২২৪টি ফ্লাট নির্মিত হয়েছে এবং ৫তলা ভিতের উপর ১টি মসজিদ নির্মাণসহ অন্যান্য সমুদয় নির্মাণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নির্মাণ কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ভবন নির্মাণ, ৫০০০০ গ্যালন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ভূ:গর্ভস্থ অগ্নি নির্বাপন জলাধার ও পাম্প হাউজ, গ্যাস সংযোগ, পানি সরবরাহ, ১২৫০ কেভিএ সাবস্টেশন, ডিস্ট্রিবিউশন ক্যাবল, টিভি, টেলিফোন, ইন্টারকমের জন্য পিভিসি পাইপ, ৪টি ভবনের জন্য বিশেষ আর্থিং এবং আলোক সুরক্ষা ব্যবস্থা, ৩০০ কেভিএ ইমার্জেন্সি জেনারেটর, ক্যাবল কন্ট্রোল ও সরঞ্জামাদি, ৮টি লিফট (প্যাসেঞ্জার লিফট ৪টি ও প্যাসেঞ্জার কাম স্ট্র্যাচার লিফট ৪টি), পানি সরবরাহের জন্য পাম্প মটর, অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র, কম্পাউন্ড ও সিকিউরিটি প্যানেল, ইন্টারকম ব্যবস্থা, সোলার প্যানেল, সাবস্টেশন ভবন, সীমানা প্রাচীর ও ১টি দৃষ্টিনন্দন গেইট, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ওয়াকওয়ে, কিচেন কেবিনেট, অভ্যর্থনা ও গার্ডরুমসহ আনুষঙ্গিক ভৌত কাজ রয়েছে। ভবনগুলো সুপারস্ট্রাকচার মান অনুসরণ করে Precast Pile Foundation পদ্ধতিতে নির্মাণ করা হয়েছে।

২০। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	আর ডিপিপি অনুয়ায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	চুক্তি মূল্য	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির তারিখ	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	কার্যাদেশের তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ	মেয়াদ বৃদ্ধি (দিন)	ভেরিয়েশনসহ চুক্তি মূল্য	প্রকৃত ব্যয়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
WD-1	৬৫০ বঃফুঃ (ভবন নং-১)	১৭৭২.০৭	১৩৮২.৪৯	২৫/১১/২০১৫	প্রধান প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ	১০/৫/২০১৬	৯/৫/২০১৮	৩০/৫/২০১৯	৩৮৭	১৭৯০.৭৮	১৭৫৫.০০	চুক্তির সাথে কাজ হ্রাস পাওয়ায় ব্যয় কম হয়েছে
WD-2	৬৫০ বঃফুঃ (ভবন নং-২)	১৭৭২.০৭	১৩৫২.৯৮	২৫/১১/২০১৫	প্রধান প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ	১০/৫/২০১৬	১০/৫/২০১৮	৩০/৫/২০১৯	৩৮৭	১৮০৪.৫৪	১৭৫৩.৬০	চুক্তির সাথে কাজ হ্রাস পাওয়ায় ব্যয় কম হয়েছে
WD-3	৮০০ বঃফুঃ (ভবন নং-১)	১৮৯৯.০৫	১৪৪৪.৯৭	২৫/১১/২০১৫	অপ্রধান প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ	১০/৫/২০১৬	১০/৫/২০১৮	৩০/৫/২০১৯	৩৮৭	২১১৭.০৬	১৮৭৪.৩৯	চুক্তির সাথে কাজ হ্রাস পাওয়ায় ব্যয় কম হয়েছে
WD-4	৮০০ বঃফুঃ (ভবন নং-২)	১৮৯৯.০৫	১৪৪১.৯৮	২৫/১১/২০১৫	প্রধান প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ	১০/৫/২০১৬	১০/৫/২০১৮	৩০/৬/২০১৯	৪১৭	২১৩৩.১১	১৮৭৩.৩৪	চুক্তির সাথে কাজ হ্রাস পাওয়ায় ব্যয় কম হয়েছে
WD-20	৫তলা ভিত বিশিস্ট ৫তলা মসজিদ	৪৬০.০০	৩৮১.৭৭	২/১২/২০১৮	প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ	২/১২/২০১৮	১৩/৫/২০১৯	৩০/৬/২০১৯	৪৮	--	৩৮১.৭৭	--
অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতায়ন												
WD-7	১২৫০ কেভিএ সাবস্টেশনের সাথে HT,LTSwitchgear, H/T Cable	৬৩.৭৯	৫৩,৭৯,৪০০	৫/২/২০১৮	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ই/এম	১৭/৫/২০১৮	১৬/৮/২০১৮	১৬/৮/২০১৮	--	৫৭.২৯	৫৭.২৯	--
WD-8	৪টি ভবনের জন্য LT ডিস্ট্রিবিউশন ক্যাবল, ক্যাবল টিভি, টেলিফোন,ইন্টারকমের জন্য পিভিসি পাইপ, বিশেষ আর্থিং ব্যবস্থা	৯৮.৩২	৮৮,৩২,৪০৬	২৫/৩/২০১৮	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ই/এম	২১/৫/২০১৮	৪/৮/২০১৮	৪/৮/২০১৮	--	৯৭.৮৭	৯৭.৮৭	--
WD-9	৩০০কেভিএ ইমার্জেন্সি জেনারেটরের সাথে	৭৭.০০	৫৩.৩২,০০০	২৮/১/২০১৮	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী,	২২/৫/২০১৮	৫/১০/২০১৮	৫/১০/২০১৮	--	--	৫৩.৩২	--

	ইমার্জেন্সি প্যানেল ক্যাবল কন্ট্রোল				ই/এম							
WD-10	৪টি ভবনের জন্য অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা	৪০৫.৩২	৪,৪৪,৩৭,২৯৫	১/৪/২০১৮	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ই/এম	১৯/৬/২০১৮	১৮/৮/২০১৮	১৮/৮/২০১৮	--	--	৪০৫.০০	--
WD-11	কম্পাউন্ড এবং সিকিউরিটি ফেনেল লাইটের সাথে ক্যাবল কন্ট্রোল ডিভাইস	২০.০০	১৮,০৪,০৭৪	৩০/১/২০১৯	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ই/এম	৩০/২/২০১৯	৩০/২/২০১৯	৩০/২/২০১৯	--	--	১৮.০৩	--
WD-12	৪টি ভবনের জন্য ইন্টারকম ব্যবস্থা	৩৫.০০	২৯,৪৮,৩৩০	১১/৩/২০১৮	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ই/এম	১৭/৫/২০১৮	১১/৭/২০১৮	১১/৭/২০১৮	--	--	২৯.৪৮	--
WD-13	৪টি ভবনের জন্য ৪০ কিলোওয়াট সোলার বিদ্যুৎ ব্যবস্থা	৩৩.০০	৩৩,০৪,০০০	২৪/১২/২০১৭	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ই/এম	৯/৪/২০১৮	৮/৯/২০১৮	৫/৯/২০১৯	--	--	৩৩.০০	--
WD-22	৬৫০ বর্গফুট ভবন-১ (অবশিস্ট অভন্তরীণ বৈদ্যুতিক ফিটিং ফিকচারের কাজ	৩০.০০	২২,৮৯,৮০৯	২১/৫/২০১৮	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ই/এম	১৯/৬/২০১৮	১৮/৭/২০১৮	১১/৭/২০১৮	--	২৬.০৪	২৬.০৪	--
	৬৫০ বর্গফুট ভবন-২ (অবশিস্ট অভন্তরীণ বৈদ্যুতিক ফিটিং ফিকচারের কাজ	৩০.০০	২২,১৮,০০০	৩/৫/২০১৮	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ই/এম	৩/৬/২০১৮	১৭/৭/২০১৮	১৫/৯/২০১৮	৬০	২৫.২৭	২৫.২৭	--
	৮০০ বর্গফুট ভবন--১ (অবশিস্ট অভন্তরীণ বৈদ্যুতিক ফিটিং ফিকচারের কাজ	৪৫.০০	৩৭,২২,৫৫৯	৩/৫/২০১৮	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ই/এম	২১/৫/২০১৮	২৭/৬/২০১৮	২০/৬/২০১৮	--	৪১.০৪	৪১.০৪	--
	৮০০ বর্গফুট ভবন--২ (অবশিস্ট অভন্তরীণ বৈদ্যুতিক ফিটিং ফিকচারের কাজ	৪৭.০০	৪৫,৫৭,৮৫৮	৩/৬/২০১৯	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ই/এম	২৬/৬/২০১৮	১০/৭/২০১৯	১৯/৯/২০১৯	৬০	৪৫.২৬	৪৫.২৬	--
GD-1	লিফট,-ক্যাবল, কন্ট্রোল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি (প্যাসেঞ্জার লিফট -৪ সেট ও প্যাসেঞ্জার কাম স্ট্রেচার লিফট ৪ সেট)	৪৫৫.৫৭	৪,১৫,৫৭,০০০	৪/৩/২০১৮	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ই/এম	১৫/৪/২০১৮	৪/৭/২০১৮	১৪/৭/২০১৮	--	৪৩৬.১৭	৪৩৬.১৭	--
GD-2	পানি সরবরাহের জন্য পাম্প মটর (৩০ অশ্বশক্তি ও ৪১ অশ্বশক্তি সম্পন্ন	৮০.০০	৩৩,৯৮,৩৮২	২৯/৫/২০১৯	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ই/এম	২৫/৬/২০১৯	১৫/৭/২০১৯	--	--	--	৩৩.৮৩	

২১। অংগওয়ারী ব্যয় বিশ্লেষণ :

২১.১। ৬৫০ বর্গফুট ভবন নং-১: ৬৫০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের জন্য অনুমোদিত মূল ডিপিপিতে ১৬৩১.-৬৮ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল । ইন্টারন্যাল স্যানিটারি, পানি সরবরাহ . গ্যাস সংযোগ, অভ্যন্তরীন বিদ্যুৎ সংযোগ এবং ড্রেনসহ ভবন নির্মাণ কাজের জন্য ১৩,৮২,৪৯,৫০৯ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে ১০/০৫/২০১৬ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত আরএডিপিতে এখাতে ১৭৭২.০৭ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। এ প্রেক্ষিতে দরপত্রভুক্ত কাজের পরিমাণ হ্রাস/বৃদ্ধির কারণে ৮০,১৭,১৮৮/- এবং দরপত্র বহির্ভূত আইটেম অন্তর্ভুক্তির কারণে ৩,২৮,১১,৭৪৬/-মোট=৪,০৮,২৮,৯৩৫ টাকার ভেরিয়েশেন অর্ডারসহ নির্মাণ কাজের বিপরীতে মোট চুক্তি মূল্য দাঁড়ায় (১৩,৮২,৪৯,৫০৯+৪,০৮,২৮,৯৩৫)= ১৭,৯০,৭৮,৪৪৪ (সতের কোটি নব্বই লক্ষ আটাত্তর হাজার চারশত চুয়াল্লিশ) টাকা। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের চুক্তির সাথে কাজের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় এবং ব্যয় কম হওয়ার কারণে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা হয়েছে ১৭৫৫.০০ লক্ষ টাকা। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ সমাপ্তির চুক্তির মেয়াদ ৩৮৭ দিনের বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে।

২১.২। **৬৫০ বর্গফুট ভবন নং-: ২** ৬৫০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের জন্য অনুমোদিত মূল ডিপিপিতে ১৬৩১.৬৮ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল । উক্ত অর্থে ইন্টারন্যাল স্যানিটারি, পানি সরবরাহ,গ্যাস সংযোগ, অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ সংযোগ এবং ড্রেনসহ ভবন নির্মাণ কাজের জন্য ১৩,৫২,৯৮,৭৪১.০০ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে ১০/০৫/২০১৬ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত আরএডিপিতে এখাতে ১৭৭২.০৭ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। এ প্রেক্ষিতে দরপত্রভুক্ত কাজের পরিমাণ হ্রাস/বৃদ্ধির কারণে ১,২৭,৫৬,১৯৫/-এবং দরপত্র বহির্ভূত আইটেম অন্তর্ভুক্তির কারণে ৩,২৪,০৪,৮১৭/-মোট=৪,৫১,৬১,০১৩ লক্ষ টাকার ভেরিয়েশেন অর্ডারসহ নির্মাণ কাজের বিপরীতে মোট চুক্তিমূল্য দাঁড়ায় (১৩,৫২,৯৮,৭৪১+ ৪,৫১,৬১,০১৩)= ১৮,০৪,৫৯,৭৫৪ (আঠার কোটি চার লক্ষ উনষাট হাজার সাতশত চুয়ান্ন) টাকা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের চুক্তির সাথে কাজের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় এবং ব্যয় কম হওয়ার কারণে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা হয়েছে ১৭৫৩.৬০ লক্ষ টাকা। এ ক্ষেত্রে নিয়োজিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ সমাপ্তির চুক্তির মেয়াদ ৩৮৭ দিনের বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে।

২১.৩। **৮০০ বর্গফুট ভবন নং-১ :** ৮০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের জন্য মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান ছিল ১৭১৯.৫০ লক্ষ টাকা। ইন্টারন্যাল স্যানিটারি, পানি সরবরাহ, গ্যাস সংযোগ, অভ্যন্তরীন বিদ্যুৎ সংযোগ এবং ড্রেন নির্মাণসহ ভবন নির্মাণ কাজের জন্য ১৪,৪৪,৯৭,৭২৪ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে ১০/০৫/২০১৬ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপিতে ১৮৯৯.০৫ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। এ প্রেক্ষিতে দরপত্রভুক্ত কাজের পরিমাণ হ্রাস/বৃদ্ধির কারণে ২,৪৫,৩৮,৬৭৯ এবং দরপত্র বহির্ভূত আইটেম অন্তর্ভুক্তির কারণে ৪,২৬,৬৯,৭৩০/-মোট=৬,৭২,০৮,৪০৯ লক্ষ টাকার ভেরিয়েশেন অর্ডারসহ নির্মাণ কাজের বিপরীতে মোট চুক্তিমূল্য দাঁড়ায় (১৪,৪৪,৯৭,৭২৪+৬,৭২,০৮,৪০৯)= ২১,১৭,০৬,১৩৩ (একুশ কোটি সতের লক্ষ ছয় হাজার একশত তেত্রিশ) টাকা। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের চুক্তির সাথে কাজের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় এবং ব্যয় কম হওয়ার কারণে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা হয়েছে ১৮৭৪.৩৯ লক্ষ টাকা। এ ক্ষেত্রে নিয়োজিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ সমাপ্তির চুক্তির মেয়াদ ৩৮৭ দিনের বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে।

২১.৪। **৮০০ বর্গফুট ভবন নং -২ :** ৮০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের জন্য মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান ছিল ১৭১৯.৫০ লক্ষ টাকা । ইন্টারন্যাল স্যানিটারি, পানি সরবরাহ, জ্ঞাস সংযোগ, অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ এবং ড্রেন নির্মাণসহ ভবন নির্মাণ কাজের জন্য ১৪,৪১,৯৮,৯৫৯ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে ১০/০৫/২০১৬ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপিতে ১৮৯৯.০৫ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। এ প্রেক্ষিতে দরপত্রভুক্ত কাজের পরিমাণ হ্রাস/বৃদ্ধির কারণে ২,৫৪,৫২,১৫৮/-এবং দরপত্র বহির্ভূত আইটেম অন্তর্ভুক্তির কারণে ৪,৩৪,৯৮,৫২৭/-মোট=৬,৯১,১২,২৭৬ টাকার ভেরিয়েশেন অর্ডারসহ নির্মাণ কাজের বিপরীতে মোট চুক্তিমূল্য দাঁড়ায় (১৪,৪১,৯৮,৯৫৯ + ৬,৯১,১২,২৭৬)= ২১,৩৩,১১,২৩৫ (একুশ কোটি তেত্রিশ লক্ষ এগার হাজার দুইশত পয়ত্রিশ) টাকা । ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের চুক্তির সাথে কাজের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় এবং ব্যয় কম হওয়ার কারণে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা হয়েছে ১৮৮৩.৩৪ লক্ষ টাকা। এ ক্ষেত্রে নিয়োজিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ সমাপ্তির চুক্তির মেয়াদ ৪১৭ দিনের বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে।




নির্মিত ভবনসমূহ

২১.৫। **মসজিদ নির্মাণ:** ৫ তলা ভিতের উপর ৫ তলা বিশিষ্ট ১১১০ বর্গমিটার আয়তনের ১টি মসজিদ নির্মাণের জন্য সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে ৪৬০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে প্রাক্কলিত দর ৪,২৪,১৯,৮০৪ লক্ষ টাকা। মসজিদ নির্মানের জন্য ৩,৮১,৭৭,৮২৩/- টাকা চুক্তিমূল্যে ০২/১২/২০১৮ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। মসজিদ ভবনের নিচতলায় ইউটিলিটি সেবা যেমন- এটিএম বুথ, লন্ড্রি, বার্বার শপসহ ৯টি দোকান নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত না হওয়ায় এসকল দোকানগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে কাজের মান সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে। প্রতিটি ফ্লোরে ১৪০ জন করে মোট ৫৬০ জন মুসল্লী জামায়াতে নামাজ আদায় করতে পারবেন। মসজিদটির পরিচালনা কমিটি গঠিত

না হওয়ায় নির্মিত দোকানগুলো কমিটির নিকট বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে নিয়োজিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ সমাপ্তির চুক্তির মেয়াদ ৪৮ দিনের বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে নির্মাণের স্থানে অবৈধ স্থাপনা ও রাবিস বিদ্যমান থাকায় কাজ যথাসময়ে শুরু না করার বিষয়টি বেশী যৌক্তিক কারণ হিসেবে বিবেচনা করার অবকাশ আছে বলে প্রতীয়মান হয়না।

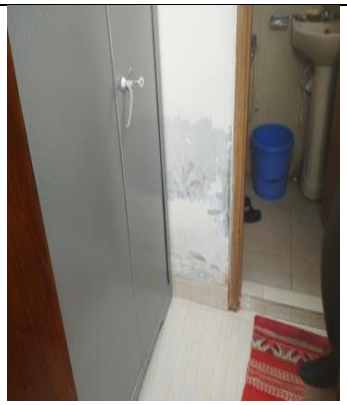
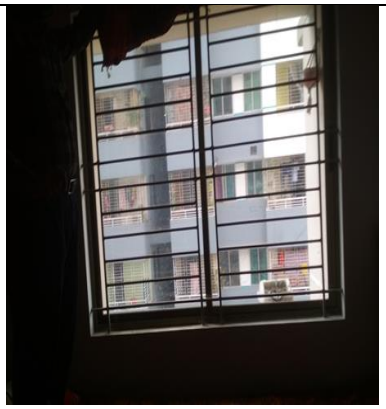


নির্মিত মসজিদ

২২। **<u>প্রকল্পের নির্মাণ কাজের গুণগত মানঃ</u>** প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শনকালে নির্মাণ সামগ্রির গুণগতমান যাচাই এর জন্য নির্মাণ সামগ্রির বিভিন্ন টেস্ট রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়। উপস্থিত উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) গণপূর্ত বিভাগ-৬, জানান নির্মাণ সামগ্রি বুয়েটের ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করে নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে এবং ইলেট্রোমেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল ফিটিংস, ম্যানুফ্যাকচারাল গাইডলাইন অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়েছে। টেস্ট রিপোর্ট হতে দেখা যায়, নির্মাণ কাজের ব্যবহৃত বিভিন্ন পণ্য (ইট, বালি, সিমেন্ট,রড, কংক্রিট) ব্যবহার করার পূর্বে টেস্ট করা হয়েছে।

২৩। **<u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার কারণঃ</u>** প্রাপ্ত পিসিআর ও পরিদর্শনকালীন সময়ে অগ্রগতির তথ্যানুযায়ী দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত অংগসমূহের বিপরীতে কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

২৪। **<u>সুবিধাভোগীদের মতামত:</u>** পরিদর্শনের সময় ভবনে বসবাসকারি ১০- ১৫ জনের সাথে মতবিনিময় হয় । তাঁদের সাথে মতবিনিময়ের সময় ভবনের বেশ কিছু সমস্যা পাওয়া যায় এবং কয়েকটি ফ্ল্যাট পরিদর্শন করে তার সত্যতা পাওয়া যায় যেমন,ভবনের ইলেকট্রিক লাইন (ডাক) এর পার্শ্ব দিয়ে পানি পড়তে দেখা যায়। ভবনের কয়েকটি ফ্ল্যাটের রান্না ঘরের পাইপ লিক করে ফলস ছাদে ময়লা পানি পড়ছে এবং পরিদর্শনকালে বিষয়টির সত্যতা মিলেছে। প্রতিটি ফ্ল্যাটে কক্ষের জানালায় স্থাপনকৃত থাই গ্লাসের দুটি অংশের একটি অংশ সম্পূর্ণ লক অবস্থায় রয়েছে। বিল্ডিং (জুঁই) এর টপ ফ্লোরের একটি ফ্ল্যাটের ছাদ লিক করে পানি পড়ে মর্মে উক্ত ফ্ল্যাটে বসবাসকারী জানান। স্থাপনকৃত লিফট সময় সময় বন্ধ/হ্যাং হয়ে যায়। এ বিষয়ে উপস্থিত লিফটম্যন জানান,লিফট এর মাদারবোর্ডে ত্রুটির কারণে এ ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। কিছু কিছু ফ্ল্যাটের ওয়াল ড্যাম অবস্থায় দেখা গেছে।

	
রান্নাঘরে পাইপ লিক করে পানি পড়ছে	বাথরুমের ফলস ছাদ ড্যাম
	
ছাদ লিক করে পানি পড়ে	**বাথরুমের সামনের ওয়াল ড্যম**
	
জানালার থাই গ্লাস ফিক্সড হয়ে আছে।	**লিফট**

২৫। **অডিট সংক্রান্ত তথ্য :** প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায়, ৩টি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে এবং অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। প্রকল্প দপ্তরের অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরুপ :

অর্থবছর এবং অডিট আপত্তির শিরোনাম	আপত্তির বিবরণ	নির্বাহী প্রকৌশলীর জবাব	অডিট নিষ্পত্তির পর্যায়
২০১৮-২০১৯ প্রকল্প সমাপ্তির পর জিওবি তহবিলর অব্যয়িত ১,৮৩,৬৫,২৯৯.০০ (এক কোটি তিরাশি লক্ষ পয়ষট্রি হাজার দুইশত নিরানব্বই) টাকা সরকারি কোষাগারে সমর্পন/ জমা প্রদান করা হয়নি।	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে "মঞ্জুরি ও বরাদ্দ ভিত্তিক হিসাবের নির্দিস্টকরণ নিরীক্ষার আওতাধীন "পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় , শেরে বাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-৩, ঢাকা -১২০৭ এর নিরীক্ষকালে আইবাস ++ রিপোর্ট, ক্যাশ বই, বিল পাশ রেজিষ্টার, সংশোধিত বাজের বরাদ্দ এবং ব্যয় বিবরণী পর্যালোচযনয় পরিলক্ষিত হয় যে, মঞ্জুরি নং -১১ এর বিপরীতে প্রকল্প সমাপ্তির পর জিওবি তহবিলের অব্যয়িত ১,৮৩,৬৫,২৯৯.০০ (এক কোটি তিরাশি লক্ষ পয়ষট্রি হাজার দুইশত নিরানব্বই) টাকা সরকারি কোষাগারে সমর্পন /জমা প্রদান করা হয়নি।	অডিট আপত্তির জবাবে জানানো যাচ্ছে যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে উক্ত প্রকল্পের কাজের বিপরীতে উল্লিখিত অর্থবছরে অত্র কার্যালয়ের চাহিদার আলোকে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ টা: ২৯,৩৩,৫৮,৭০০ টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। প্রকৃত ব্যয় হয় টা: ২৯,০০,৬০,২০০.০০টাকা। অব্যয়িত অর্থ টা: ৩২,৯৮,৫০০.০০। উল্লেখ্য, প্রচলিত স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটারাইজড "আইবাস" সিস্টেম-এ সমর্পন এর কোন সুযোগ নেই এবং যে অর্থ ব্যয় হয়না তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমর্পন হিসেবে বিবেচিত হয়। তথাপিও অব্যয়িত অর্থ অত্র দপ্তরের স্মারক নং-বি-৩/বি-২/১৬৩৩, তারিখ ৩০/০৬/২০১৯ মোতাবেক সমর্পন করা হয়। জবাবের প্রেক্ষিতে আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো।	অডিট আপত্তির জবার পাঠানো হয়েছে। নিষ্পত্তি হয়নি।
২০১৮-২০১৯ সংশোধিত বাজেট ২,৯৪,১৬,০০০.০০ (দুই কোটি চুরানব্বই লক্ষ ষোল হাজার) টাকা বরাদ্দ নিয়ে কোন অর্থ ব্যয় করা হয়নি।	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে "মঞ্জুরি ও বরাদ্দ ভিত্তিক হিসাবের নির্দিস্টকরণ নিরীক্ষার আওতাধীন "পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় , শেরে বাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-৩, ঢাকা -১২০৭ এর নিরীক্ষকালে আইবাস ++ রিপোর্ট, ক্যাশ বই, বিল পাশ রেজিষ্টার, সংশোধিত বাজের বরাদ্দ এবং ব্যয় বিবরণী পর্যালোচযনায় পরিলক্ষিত হয় যে, মঞ্জুরি নং -১১ এর বিপরীতে মূলধন খাতে ২,৬৯,৮৮,০০০.০০ এবং রাজস্ব খাতে ২৪,২৮,০০০.০০ টাকা এডিপি বরাদ্দের অনুকূলে কোন খরচ নেই। যেমন (১) যানবাহন ব্যবহার ৮,০০,০০ টাকা, (২) গ্যাস জ্বালানী -১০,৪০,০০০.০০ টাকা, (৩) মুদ্রণ ও বাধাই ২,৩৮,০০০.০০ , (৪) স্ট্যাম্প সিল ৩,৫০,০০০.০০ টাকা, (৫) নলকূপ স্থাপন ১৭,৮৫,০০০.০০ টাকা, (৬) স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ ২,৫২,০৩,০০০,০০ মোট= ২,৯৪,১৬০০০.০০ টাকা	আপত্তির জবাবে জানানে যাচ্ছে যে, আপত্তিতে উল্লিখিত (১) যানবাহন ব্যবহার, (২) গ্যাস জ্বালানী এবং (৫) নলকূপ স্থাপন খাতে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কোন বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। আপত্তিতে উল্লেখিত নম্বর (৩) মূদ্রণ ও বাধাই খাতে ২৭,৩০০০.০০ টাকা (৪) স্ট্যাম্প ও সিল খাতে ৫০,০০০.০০ টাকা এবং (৬) স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ খাতে ১,৮০,১২,০০০.০০ টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। উক্ত তিনখাতে অব্যয়িত অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমর্পন করা সত্ত্বেও অত্র কার্যালয়ের স্মারক নম্বর বি-৩/হি-২/১৬৩৩, তারিখ ৩০/০৬/২০১৯ মোতাবেক সমর্পন করা হয়। জবাবের প্রেক্ষিতে আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো।	অডিট আপত্তির জবার পাঠানো হয়েছে। নিষ্পত্তি হয়নি।
২০১৮-২০১৯ সিএও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাথে হিসাবে সাথে সঙ্গতিসাধন পূর্বক আইবাস++ রিপোর্ট ও সিএও -৪ রেজিষ্টার নিরীক্ষায় উপস্থাপন না করা প্রসংগে।	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে "মঞ্জুরি ও বরাদ্দ ভিত্তিক হিসাবের নির্দিস্টকরণ নিরীক্ষার আওতাধীন "পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় , শেরে বাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-৩, ঢাকা -১২০৭ এর নিরীক্ষাকালে আইবাস ++ রিপোর্ট, ক্যাশ বই, বিল পাশ রেজিষ্টার, সংশোধিত বাজের বরাদ্দ এবং ব্যয় বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, মঞ্জুরি নং -১১ এর বিপরীতে পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় , শেরে বাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-৩, ঢাকা -১২০৭ এবং সিএও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাথে হিসাবের সঙ্গতিসাধন পূর্বক আইবাস++ রিপোর্ট ও সিএও -৪ রেজিস্টার নিরীক্ষআয় উপস্থাপন না করায় অনুন্নয়ন বাজেটের হিসাবের সাথে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের হিসাবের সঠিকতা নিরুপন করা যায়নি।	গণপূর্ত বিভাগ এর হিসাবসমূহ সিএও গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বিধি মোতাবেক সংরক্ষণ ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করা হয়। তাই সিএও গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে হিসাবের সঙ্গতি রেখে সংরক্ষণ করা হিসাব নিরীক্ষা দলকে তাৎক্ষণিক সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া সিএও -৪ রেজিষ্টার বলতে কোন রেজিষ্টার সম্পর্কে অত্র দপ্তর অবহিত নয়। আইবাস সিস্টেমে এ ধরণের কোন সিডিউল জেনারেট হয় না। আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হলো।	অডিট আপত্তির জবার পাঠানো হয়েছে। নিষ্পত্তি হয়নি।

২৬। **বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ:**

২৬.১। **প্রকল্পের ভৌত নির্মাণ কাজ** : আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ১৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৬৫০ বর্গফুট আয়তনের ২টি ভবনে ১১২টি এবং ৮০০ বর্গফুট আয়তনের ২টি ভবনে ১১২টি মোট ৪টি আবাসিক ভবনে ২২৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণসহ ৫তলা ভিতের উপর ১টি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এছাড়া, ভূ:গর্ভস্থ অগ্নি নির্বাপন জলাধার ও পাম্প হাউজ, গ্যাস সংযোগ, পানি সরবরাহ, ১২৫০ কেভিএ সাবস্টেশন, ডিস্ট্রিবিউশন ক্যাবল, টিভি, টেলিফোন, ইন্টারকমের জন্য পিভিসি পাইপ, ৪টি ভবনের জন্য

বিশেষ আর্থিং এবং আলোক সুরক্ষা ব্যবস্থা, ৩০০ কেভিএ ইমার্জেন্সি জেনারেটর, ক্যাবল কন্ট্রোল ও সরঞ্জামাদি,লিফট ক্যাবল কন্ট্রোল ও সরঞ্জামাদি, ৫০০০ গ্যালন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ভূগর্ভস্থ জলাধার, পানি সরবরাহের জন্য পাম্প মটর, অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র, কম্পাউন্ড ও সিকিউরিটি প্যানেল লাইটের সাথে ক্যাবল কন্ট্রোল ডিভাইস ও ড্রেন নির্মাণ, ইন্টারকম ব্যবস্থা, ৪টি ভবনের জন্য ৪০ কিলোওয়াট সোলার প্যানেল, সাবস্টেশন ভবন, সীমানা প্রাচীর ও নান্দনিক গেইট নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ওয়াকওয়ে, কিচেন কেবিনেট, কেবিনেট, প্যালাসাইডিং, অভ্যর্থনা ও গার্ডরুম নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক ভৌত কাজ রয়েছে।

২৬.২। **Time Over run:** মূল ডিপিপিতে প্রকল্পটি আগস্ট,,২০১৫ হতে জুন,২০১৮ মেয়াদে গত ২৯/১০/২০১৫ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছিল। ১ম সংশোধনীতে প্রকল্প মেয়াদ আগস্ট,২০১৫ হতে জুন,২০১৯ মেয়াদে নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি পায় ১২ মাস বা ২৫.৫৩%। নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ না হওয়ায় পরবর্তীতে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ৩মাস বৃদ্ধি করে আগস্ট,২০১৫ থেকে সেপ্টেম্বর,২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। এ প্রকল্পের ২ বারে সময় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫ (পনের) মাস বা ৩১.৯১%। প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতার ফলে উপকারভোগীদের প্রকল্পের সুফল পেতে বিলম্ব ঘটেছে।

২৬.৩ **Cost Over run**: প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১০২৬৪.৫৩ লক্ষ টাকা নির্ধারিত থাকলেও ১ম সংশোধনীতে প্রকল্পটির ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ১০৪১১.২৮ লক্ষ টাকা। মূল অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা প্রকল্প ব্যয় ১৪৬.৭৫ লক্ষ টাকা বা ১.৪২% বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১০০৪৮.৫৮ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মূল অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা ২১৫.৯৫ লক্ষ টাকা কম (২.১০%) ব্যয় হয়েছে। প্রকল্প প্রণয়নকালে যথাযথ পরিকল্পনা ও ব্যয় প্রাক্কলনে ঘাটতি ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২৬.৪। **ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনঃ** এ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন ৬ জন প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পরিকল্পনা বিভাগ হতে জারিকৃত "সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি" বিষয়ক পরিপত্র অনুসারে ৫০ কোটি টাকার উর্দ্ধে প্রকল্পের ক্ষেত্রে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দিতে হয়। এ প্রকল্পটির প্রাক্কলন ছিল ১০৪১১.২৮ লক্ষ টাকা । কিন্তু পরিপত্র অনুযায়ী পূর্ণকালীন প্রকল্প পারিচালক পদায়ন না করায় পরিপত্রের বিধান লংঘন করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

২৬.৫। **পিসিআর প্রণয়নে দুর্বলতাঃ** মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনায় নিম্নবর্ণিত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়ছেঃ

- পিসিআর এর পৃষ্ঠা-১০ এ ৩, ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদে প্রকল্প পরিচালক, সংস্থা প্রধান ও মন্ত্রণালয়/ বিভাগের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তার মন্তব্য উল্লেখ না থাকায় তা সংশোধন করে পুনরায় আইএমইডিতে প্রেরণের জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু প্রকল্প পরিচালক ও সংস্থা প্রধানের মন্তব্য ছাড়াই নির্বাহী প্রকৌশলী, শেরে বাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-৩ স্বাক্ষর সম্বলিত পিসিআর আইএমইডিতে ০৮ ফ্রেব্রুয়ারি,২০২১ প্রেরণ করা হয়।
- প্রকল্প পরিচালকগণের দায়িত্ব পালনের সুনির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করা হয়নি।
- আরএডিপিতে প্রকল্পের মেয়াদ ছিল আগস্ট,২০১৫ হতে জুন,২০১৯ পর্য়ন্ত। পরবর্তীতে পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প মেয়াদ ৩মাস বৃদ্ধি করে আগস্ট,২০১৫ হতে সেপ্টেম্বর,২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব আইএমইডিতে প্রেরণ করে। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্পের মেয়াদ আগস্ট,২০১৫ হতে সেপ্টেম্বর,২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাবে আইএমইডি সম্মতি প্রদান করে। অর্থাৎ প্রকল্পের মেয়াদ নির্ধারিত হয় আগস্ট,২০১৫ হতে সেপ্টেম্বর,২০১৯ পর্যন্ত। কিন্ত প্রেরিত পিসিআর-এ প্রকল্পের মেয়াদ দেখানো হয়েছে আগস্ট,২০১৫ হতে জুন,২০১৯ পর্যন্ত।

২৭। **সুপারিশঃ**

২৭.১। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের চুক্তির মেয়াদের মধ্যে কাজ সম্পন্ন হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের চুক্তির মেয়াদ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রয় কাজে মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার চলমান প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম যথাসম্ভব ডিপিপি'র সিডিউল অনুসরণ করতে হবে এবং চুক্তি মেয়াদের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে হবে;

২৭.২। প্রকল্পের আওতায় ভবনে সংযোজিত লিফটগুলো নিয়মিত সার্ভিসিং করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এছাড়া ভবনের ইলেকট্রিক লাইন (ডাক), রান্নাঘরের পাইপ দিয়ে পানি পড়া , জানালার থাই গ্লাসের সমস্যা এবং বিল্ডিং (জুঁই) এর টপ ফ্লোরের ছাদ লিক করে পানি পড়া বন্ধ করাসহ ভবনের অন্যান্য ত্রুটিসমূহ দূর করতে হবে। পিডব্লিউডি এবং পরিকল্পনা বিভাগ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ-২৪);

২৭.৩। প্রকল্পটি নির্ধারিত মেয়াদে শেষ হয়নি, মূল ডিপিপি অনুয়ায়ী মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫ মাস বা ৩১.৯১% । প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে প্রকল্পের ডিজাইন/প্রাক্কলন/ পরিকল্পনা যথাযথভাবে প্রণয়ন করতে হবে। মন্ত্রণালয়/ বাস্তবায়নকারী সংস্থার পরবর্তী প্রকল্পের ক্ষেত্রে নির্ধারিত মেয়াদ ও প্রাক্কলনের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো (২৬.২ ও ২৬.৩);

২৭.৪। এ প্রকল্পে ৬ জন প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক ভবিষ্যতে পরবর্তী প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বিভাগের পরিপত্রের বিধান অনুসরণ করে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য জনবল নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-২৬.৪);

২৭.৫। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৩টি অভ্যন্তরীণ অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। এ আপত্তিগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করে আইএমইডিতে প্রমাণক পাঠাতে হবে (অনুচ্ছেদ-২৫)।

২৭.৬। উপর্যুক্ত সুপারিশ/মতামত অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে।

Impact Assessment and coping up strategies of Graduation From LDC Status For Bangladesh শীর্ষক **প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: জুন, ২০২০)

০১.	প্রকল্পের নাম	:	Impact Assessment and coping up strategies of Graduation From LDC Status For Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প
০২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ,
০৩	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	:	পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
০৪।	প্রকল্পের অর্থায়ন	:	বাংলাদেশ সরকারের সম্পূর্ণ জিওবি অর্থে বাস্তবায়িত।

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মুল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মুল বাস্তবায়ন কালের%)
মুল	সংশোধিত		মুল	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	সর্বশেষ সংশোধিত			
মোট টাকা প্রকল্প	মোট টাকা প্রকল্প সাঃ	মোট টাকা প্রকল্প সাঃ						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২৮৯.৬৩ ২৮৯.৬৩ --	২৬৬.৩৫ ২৬৬.৩৫ --	১৯৬.১৭ ১৯৬.১৭	মে,২০১৮ হতে জুন,২০১৯	মে, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর,২০১৯	মে, ২০১৮ হতে জুন,২০২০	মে, ২০১৮ হতে জুন,২০২০	-৯৩.৪৬ (-৩২.২৬%)	+১২ মাস +(৮৫.৭১%)

৭। **<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য :</u>**

- বাংলাদেশের এলডিসি তালিকা হতে উত্তরণ পরবর্তী প্রভাবসমূহের গুণগত ও পরিমাণগত মূল্যায়ন;
- উত্তরণ পরবর্তী প্রভাব মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট কৌশল ও কর্মপন্থা নির্ণয়;
- উত্তরণ পরবর্তী অবস্থা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় নীতিগত সংস্কার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;
- সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারকগণের জন্য বাস্তবায়যোগ কর্মপন্থা গ্রহণের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রদান এবং এ সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রচেষ্টাসমূহ নির্ধারণ ;
- ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় চলমান উন্নয়ন কর্মসূচি এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় প্রণিতব্য উন্নয়ন কর্মসূচিতে এলডিসি তালিকা হতে উত্তরণের সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবেলায় এলডিসি তালিকা হতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান;
- দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় এলডিসি স্ট্যাটাস হতে উত্তরণ পরবর্তী প্রভাব মোকাবেলা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ সমূহের প্রতিফলন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ইনপুট প্রদান ; এবং
- এলডিসি স্ট্যাটাস হতে উত্তরণ পরবর্তী অবস্থায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নীতিগত ইনপুট প্রদান।

৭.২। <u>প্রকল্পের আওতায় প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ</u>

(ক) বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ পর্যায়ে এবং উত্তরণ পরবর্তী প্রভাবসমূহ মূল্যায়নপূর্বক প্রয়োজনীয় কৌশল নির্ধারণ সম্বলিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রণয়ন, মুদ্রণ এবং বিতরণ এবং

(খ) উক্ত সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ এবং গৃহীত কর্মকৌশল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।

০৮। **<u>প্রকল্প এলাকাঃ</u>** সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

৯। **প্রকল্প অনুমোদন :** স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ফলে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, কারিগরি ও প্রযুক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে কি প্রভাব তা নিরুপণসহ যথাযথ কৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ Impact Assessment and coping up strategies of Graduation From LDC Status For Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থে ২৮৯.৬৩ টাকা ব্যয়ে মে/২০১৮ হতে জুন/২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৪/০৬/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৯.১ **প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিঃ** সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে Impact Report প্রণয়নপূর্বক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন করে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য পরামর্শক সভা , সেমিনার, ওয়ার্কশপ আয়োজন এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

সম্পাদন করার জন্য প্রকল্পের মেয়াদ মে,২০১৮ হতে জুন/২০১৯ এর পরিবর্তে প্রকল্প মেয়াদ ৬মাস বৃদ্ধি করে মে,২০১৮ হতে ডিসেম্বর,২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৪/০৪/২০১৯ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৯.২ **প্রকল্প সংশোধনঃ** সমীক্ষা প্রতিবেদনটি চূড়ান্তকরি সরকারি কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমবাস্তবায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করে মুদ্রণ, প্রকাশ ও বিতরণ কার্যক্রম সম্পাদন এবং প্রয়োজনীয়তার আলোকে প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয়ের হ্রাস/বৃদ্ধিকরণের ফলে প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৬৬.৩৫ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে প্রকল্প মেয়াদ মে,২০১৮ হতে জুন,২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৩/০২/২০২০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১০। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (লক্ষ টাকায়)

ক্রম	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্য মাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক)	রাজস্ব ব্যয়ঃ					
১।	কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বেতন	জনমাস	২০ জনমাস	৫.৫০	২০ জনমাস	৩.৭১ (৬৭%)
২।	দায়িত্বভাতা	জনমাস	৩৪ জনমাস	৪.১১	৩৪ জনমাস	৪.০৪ (৯৮%
৩।	কনসালটেন্সি ফার্ম	জনমাস	২৪ জনমাস	১৫২.৫০	২৪ জনমাস	১৪২.৪৭ (৯৩%
৪।	পরামর্শক (Independent Review	সংখ্যা	১	৯.৪০	১ (১০০%)	৯.৪০ (১০০%)
৫	মুদ্রণ ও বাঁধাই	থোক	থোক	১০.০০	১০০%	৪.৫৩ (৪৫%)
৬	স্ট্যাম্প ও সিল	থোক	থোক	৩.০০	১০০%	২.৪৯ (৮৩%
৭	বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	থোক	২.০০	১০০%	১.৪২ (৭১%)
৮	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৩টি	১০.০৬	০.০	০.০
৯	সেমিনার এবং কনফারেন্স ব্যয়	সংখ্যা	৬টি	৩০.০০	০.০০	০.০০
১০	আপ্যায়ন খরচ	থোক	থোক	৩.০০	থোক	০.৭২ (২৪%)
১১	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	থোক	থোক	১.০০	থোক	০.০৭ (৭%)
১২	সম্মানী	থোক	থোক	৩.৬০	থোক	২.৪২ (৬৭%
১৩	হায়ারিং চার্জ (মাইক্রোবাস-১টি	মাস	১৩ মাস	১৭.১৮	১৩ মাস (১০০%)	১৩.২০ (৭৭%)
উপমোট (রাজস্ব)				**২৫১.৩৫**		**১৮৪.৪৭**
(খ) মূলধন ব্যয়ঃ						
১৪	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	থোক	থোক	৬.৫০	থোক (১০০%	৪.৯৫ (৭৬%)
১৫	কম্পিউটার সফটওয়্যার	থোক	থোক	১.০০	থোক (১০০%	০.৮৮ (৮৮%)
১৬	অফিস সরঞ্জামাদি	থোক	থোক	৩.৫০	থোক (১০০%	২.৮৯ (৮২%)
১৭	আসবাবপত্র	থোক	থোক	৩.০০	থোক (১০০%	২.৮০ (৯৩%)
১৮	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	থোক	থোক	১.০০	থোক (১০০%	০.১৮ (১৮%)
	মূলধন ব্যয়			**১৫.০০**	**থোক (১০০%**	**১১.৭০ (৭৮%)**
সর্বমোটঃ (ক+ খ)				**২৬৬.৩৫**	**৯৬%**	**১৯৬.১৭**

১১। বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও বাস্তবায়ন অবস্থা (পিসিআর হতে প্রাপ্ত তথ্য)

অর্থবছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ		অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়		অব্যয়িত অর্থ	অর্থ ব্যয় না হওয়ার কারণ
	মোট	টাকা		মোট	টাকা		
২০১৮-১৯	১৩১.০০	১৩১.০০	১৩১.০০	১১৬.০৪	১১৬.০৪	১৪.৯৬	আউটর্সোসিং এর আওতায় কম্পিউটিং সেবা ও অফিস সহায়ক সেবা- এর অনুকূলে দুই (২)জন জনবলের সংস্থান ছিল। আউটসোর্সিং নীতিমালায় উপরিউক্ত কম্পিউটিং সেবা ও অফিস সহায়ক সেবার আওতায় জনবল

অর্থবছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ		অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়		অব্যয়িত অর্থ	অর্থ ব্যয় না হওয়ার কারণ
	মোট	টাকা		মোট	টাকা		
							নিয়োগের বিষয় উল্লেখ না থাকায় এ দুটি সেবার ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব না হওয়ায় ২০১৮-১৯ বছরে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়ত, এ প্রকল্পের পূর্বনির্ধারিত সেমিনার ও কনফারেন্স ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আয়োজন করা সম্ভব না হওয়ায় বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। যেহেতু প্রকল্পটি সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে সেহেতু অর্থ অবমুক্ত হলেও অবশিষ্ট ১৪.৯৬ লক্ষ টাকা প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার নিকট হতে উত্তোলন করা হয়নি মর্মে পরিদর্শনকালে জানা যায়।
২০১৯-২০	১২৫.০০	১২৫.০০	১২০.৫৬	৮০.১৩	৮০.১৩	৪০.৪৩	কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ, সেমিনার এবং কনফারেন্সসহ কতিপয় অঙ্গে ব্যয় না হওয়ায় বরাদ্দের তুলনায় প্রকৃত ব্যয় কম হয়েছে যেহেতু প্রকল্পটি সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে সেহেতু অর্থ অবমুক্ত হলেও অবশিষ্ট ৪০.৪৩ লক্ষ টাকা প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার নিকট হতে উত্তোলন করা হয়নি মর্মে পরিদর্শনকালে জানা যায়।
মোট	২৯০.০০	২৯০.০০	২৫১.৫৬	১৯৬.১৭	১৯৬.১৭	৫৫.৩৮	

তথ্য সূত্রঃ প্রকল্প কার্যালয়

১২। **<u>প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি</u> :** সংশোধিত আলোচ্য প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থে ২৬৬.৩৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মে,২০১৮ হতে জুন,২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দের পরিমাণ ২৯০.০০ লক্ষ টাকা এবং অবমুক্তির পরিমান ২৫১.৫৬ লক্ষ টাকা । প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ১৯৬.১৭ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭৩.৬৫ % এবং বাসতব অগ্রগতি ৯৬%।

১৩। **<u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে কারণ:</u>**

(ক) সমীক্ষা প্রতিবেদনটি মার্চ ২০২০ এ চূড়ান্ত করা হয়েছিল। এপ্রিল-জুন, ২০২০ সময়ে উক্ত সমীক্ষার বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজনের পরিকল্পনা থাকলেও কোভিড-১৯ এর কারণে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

(খ) সমীক্ষা প্রতিবেদনটি মার্চ ২০২০ এ চূড়ান্ত করা হয়েছিল। এপ্রিল-জুন, ২০২০ সময়ে সেমিনার এবং ওয়ার্কশপ আয়োজনের পরিকল্পনা থাকলেও কোভিড-১৯ এর কারণে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। তবে সমীক্ষা প্রতিবেদনটি আন্তমন্ত্রণালয় এলডিসি কোর গ্রুপ এর সভায় দুই দফায় উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া প্রতিবেদনটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মহোদয়ের নেতৃত্বে গঠিত এলডিসি হতে উত্তরণ সংক্রান্ত National Task Force এর সভাসহ অন্যান্য বিভিন্ন ফোরামে একাধিকবার উপস্থাপন করা হয়েছে মর্মে পরিদর্শনকালে জানানো হয়েছে।

১৪। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য**

প্রকল্প পরিচালক	পদবী ও মূল দপ্তর	দায়িত্বকাল		দায়িত্বের ধরণ
		যোগদানের তারিখ	বদলির তারিখ	
জনাব মোঃ মফিদুল ইসলাম	প্রধান সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	জানুয়ারি,২০১৯	প্রকল্প মেয়াদ পর্যন্ত	অতিরিক্ত দায়িত্ব

১৫। **প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) :** প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়:

(ক) প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য ;
(খ) প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি ও পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) প্রকল্পের নথি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং
(ঘ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিস্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৬। পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য :

(ক) পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

প্যাকেজ নং	প্যাকেজ বর্ণনা	প্রাক্কলিত মূল্য	পদ্ধতি	ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের তারিখ	বাস্তবে দরপত্রের তারিখ	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ	
							চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
GD1	অফিস সরঞ্জামাদি	৩.৫০	RFQ	০৩/০৬/২০১৮	০৬/০৫/২০১৯	২১/০৫/২০১৯ (০.৯৯ লক্ষ টাকা)	১৫/০৬/২০১৯	১৫/০৬/২০১৯
				০১/১২/২০১৯	১১/০৩/২০২০	১১/০৩/২০২০ (১.৯০ লক্ষ টাকা)	০৪/০৬/২০২০	০৪/০৬/২০২০
GD2	স্ট্যাম্প ও সীল	২.০০	RFQ	১০/০১/২০১৯	০৮/০৫/২০১৯	২২/০৫/২০১৯ (১.৯৯ লক্ষ টাকা)	১৫/০৬/২০১৯	১৫/০৬/২০১৫
GD3/ GD4	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	৬.১০	RFQ	০৩/০৬/২০১৮	২৪/১০/২০১৯	০৫/১১/২০১৯ (২.৫৫ লক্ষ টাকা)	২৫/১১/২০১৯	২৫/১১/২০১৯
				১৯/০৭/২০১৮	২৪/১১/২০১৯	০৩/১২/২০১৯ (২.৪০ লক্ষ টাকা)	১৫/১২/২০১৯	১৫/১২/২০১৯
GD4	কম্পিউটার সফটওয়্যার	১.০০	RFQ	১৯/০৭/২০১৯	২৪/১১/২০১৯	০৩/১২/২০১ (০.৮৭ লক্ষ টাকা)	১৫/১২/২০১৯	১৫/১২/২০১৯
GD5	আসবাবপত্র	৩.০০	RFQ	০৩/০৬/২০১৮	২৪/১১/২০১৯	০৩/১২/২০১৯ (২.৮০ লক্ষ টাকা)	১৫/১২/২০১৯	১৫/১২/২০১৯

(খ) সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য :

প্যাকেজ নং	প্যাকেজ বর্ণনা	একক	পদ্ধতি	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	সেবা প্রতিষ্ঠানের নাম
SD1	কনসালটেন্সি ফার্ম	LS	FBS	১৫২.৫০	২১/১০/২০১৮	২৩/১২/২০১৮	৩১/০১/২০২০	Policy Research Institute of Bangladesh (PRI)
SD2	পরামর্শক (Independent Review)	LS	SSS	৯.৪৫	২৮/০৭/২০১৯	২৯/০৭/২০১৯	১৮/০৮/২০১৯	Economic Research Group (ERG)
SD3	হায়ারিং চার্জ (মাইক্রোবাস ভাড়া-১টি)	No.	RFQ	১৭.১৮	০৪/০৪/২০১৯	২৩/০৪/২০১৯	৩০/০৬/২০২০	Mahi Enterprise
SD4	আউটসোর্সিং	No.	RFQ	৫.৫০	২৫/০৭/২০১৯ ১৮/০২/২০২০	০১/০৯/২০১৯	৩১/১২/২০১৯	M/S Remon Enterprise

প্যাকেজ নং	প্যাকেজ বর্ণনা	একক	পদ্ধতি	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	সেবা প্রতিষ্ঠানের নাম
						২৫/০৩/২০২০	৩০/০৬/২০২০	
SD5	মুদ্রণ ও বাঁধাই	LS	OTM	১০.০০	০৪/০২/২০২০	২৯/০৭/২০১৯	১৮/০৮/২০১৯	Priyanka Printing & Publication's

১৭। **প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ**

	পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
১.	বাংলাদেশের এলডিসি তালিকা হতে উত্তরণ পরবর্তী প্রভাবসমূহের গুনগত ও পরিমাণগত মূল্যায়ন।	উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।
২.	উত্তরণ পরবর্তী প্রভাব মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট কৌশল ও কর্মপন্থা নির্ণয়।	উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।
৩.	উত্তরণ পরবর্তী অবস্থা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় নীতিগত সংস্কার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান।	উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।
৪.	সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারকগণের জন্য বাস্তবায়যোগ কর্মপন্থা গ্রহণের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রদান এবং এ সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রচেষ্টাসমূহ নির্ধারণ ।	উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।
৫.	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় চলমান উন্নয়ন কর্মসূচি এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় প্রণীতব্য উন্নয়ন কর্মসূচীতে এলডিসি তালিকা হতে উত্তরণের সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবেলায় এলডিসি তালিকা হতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান।	উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।
৬.	দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় এলডিসি স্ট্যাটাস হতে উত্তরণ পরবর্তী প্রভাব মোকাবেলা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ সমূহের প্রতিফলন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ইনপুট প্রদান ।	উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।
৭	এলডিসি স্ট্যাটাস হতে উত্তরণ পরবর্তী অবস্থায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নীতিগত ইনপুট প্রদান।	

১৮। **পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণ:**

১৮.১। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮ এর সহকারী পরিচালক কর্তৃক ০৭/০২/২০২১ তারিখে প্রকল্প সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ পর্যায়ে এবং উত্তরণ পরবর্তী প্রভাব মূল্যায়নপূর্বক প্রয়োজনীয় কৌশল নির্ধারণ সম্বলিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রণয়ন, মুদ্রণ এবং বিতরণ; এবং উক্ত সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ এবং গৃহীত কর্মকৌশল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং যথাযথ কৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক “Impact Assessment and Coping up Stratgies of Graduation From LDC Status fof Bangladesh” শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছে।

১৮.২ আলোচ্য সমীক্ষা প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম LDC Graduation পর্যায় এবং Graduation উত্তরণ পরবর্তী গুণগত ও পরিমানগত প্রভাব বিশ্লেষণ এবং তা মোকাবেলায় কার্যকর কৌশল সম্পর্কিত সমীক্ষা সম্পাদন করা । এ Graduation এর ফলে তার সম্ভাব্য প্রভাব (impact) বিশেষ করে বৈদেশিক সহায়তা, রপ্তানী, জাতিসংঘ প্রদত্ত বিভিন্ন সুবিধাসহ সামগ্রিক অর্থনীতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর কি প্রভাব পড়বে তার বিশ্লেষণসহ এ সকল প্রভাব ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুপারিশকৃত কর্মকৌশল ও প্রস্তুতির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য Policy Research Institute of Bangladesh (PRI) নামক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে মোট ১,৫২,৪৭,৬২০ (এক কোটি বায়ান্ন লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছয়শত বিশ) টাকায় ২৩/১২/২০১৮ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্প দলিল অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে ইন্সেপশন রিপোর্ট, মধ্যবর্তী অগ্রগতি প্রতিবেদন , ড্রাফট রিপোর্ট এবং চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করে । পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে উক্ত কাজগুলো সম্পাদন করা হয়েছে এবং টিওআর অনুযায়ী প্রতিটি অঙ্গের কাজ সমাপ্তির পর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

১৮.৩। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যাবলীঃ

নিম্ন আয়ের দেশের ক্যাটাগরী (এলডিসি) হতে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশের উপর যে সম্ভাব্য প্রভাব পড়তে পারে তা নিরুপণ এবং এ সকল প্রভাব মোকাবেলায় কৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে এই সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে। এ সমীক্ষা প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর এবং প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্ণিত সমীক্ষার মাধ্যমে সম্ভাব্য প্রভাবসমূহ নির্ধারণসহ তা মোকাবেলায় যথাযথ কর্মকৌশল সুপারিশ করা হয়েছে। এ সকল সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যোগ/কর্মকান্ড গ্রহণ করা হচ্ছে মর্মে প্রকল্প দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে।

১৯. অডিট সম্পাদন ও আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য:

এক্সটার্ণাল অডিট:

সাল	অডিটের বিষয়	প্রধান প্রধান ফাইন্ডিংস	অডিটের জবাব
২০১৮-২০১৯	মঞ্জুরী ও বরাদ্দ ভিত্তিক নির্দিষ্টকরণ নিরীক্ষা	পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-২৭(১০) অনুযায়ী পরামর্শক সেবা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাবদ ৭,৬২,৩৮১.০০ (সাত লক্ষ বাষট্টি হাজার তিনশত একাশি) টাকা গ্রহণ করা হয়নি।	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ মোতাবেক বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ে Central Procurement Technical Unit (CPTU) সিপিটিইউ কর্তৃক নির্ধারিত Standard Tender Document (STD) অনুসরণ করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত STD-তে বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাবদ জামানত গ্রহণের কোন সংস্থান নেই এ প্রেক্ষিতে, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ে পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাবদ জামানত গ্রহণ করা হয়নি। পারফরমেন্স সিকিউরিটি গ্রহণ না করার কারণে কার্য সম্পাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়নি। প্রকল্পটি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চুক্তির শর্ত মোতাবেক সমীক্ষা প্রতিবেদনও যথারীতি জমা দিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে উল্লিখিত আপত্তিটি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।
২০১৮-২০১৯	মঞ্জুরী ও বরাদ্দভিত্তিক নির্দিষ্টকরণ নিরীক্ষা	প্রকল্প সমাপ্তির পর জিওবি তহবিলের অব্যয়িত ৩,৩৩,৩২,৬৩২.০০ (তিন কোটি তেত্রিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার ছয়শত বত্রিশ) টাকা সরকারি কোষাগারে সমর্পন/জমা প্রদান করা হয়নি।	প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ২,৬৬,৩৫,০০০.০০ (দুই কোটি ছেষট্টি লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার) টাকা এবং প্রকল্পটির অনুকূলে নির্ধারিত অর্থবছরের (২০১৮-২০১৯) সংশোধিত এডিপিতে মোট ১,৩১,০০,০০০.০০ (এক কোটি একত্রিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ ছিল। অধিকন্তু নিরীক্ষিত অর্থবছরের (২০১৮-১৯) খসড়া অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্টের অডিট ফাইন্ডিংসে এ সংক্রান্ত কোন অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং গত ২৮/০৯/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত Exit Meeting এর আলোচ্যসূচিতে বর্ণিত প্রকল্পের বিপরীতে এ আপত্তিটি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এ প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে উল্লিখিত আপত্তিটি এ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নহে বিধায় আপত্তিটি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।

২০। ক্রয়কৃত যন্তপাতি/আসবাবপত্রের তালিকা :

ক্রঃনঃ	যন্ত্রপাতি/আসবাব পত্রের নাম	সংখ্যা	যেখানে ব্যবহৃত হচ্ছে
1.	**TV**	1	Being used in Division Chief's (Project Director) office, (Block-14, Room-14)
2.	**Photocopier**	1	Being used in Senior Assistant Chief's (Assistant Project Director) room, International Economics wing, (Block-14, Room-33)
3.	**Spiral Binder**	1	Being used in Senior Assistant Chief's (Assistant Project Director) room, International Economics wing (Block-14, Room-33)
4.	**Desktop (CPU) with Monitor**	2	Being used in Division Chief's (Project Director) office, (Block-14, Room-15)
			Being used in Senior Assistant Chief's (Assistant Project Director) room, International Economics wing (Block-14, Room-33)
5.	**Laptop**	2	Being used in Division Chief's (Project Director) office, (Block-14, Room-14)

ক্রঃনঃ	যন্ত্রপাতি/আসবাব পত্রের নাম	সংখ্যা	যেখানে ব্যবহৃত হচ্ছে
			Being used in Senior Assistant Chief's (Assistant Project Director) room, International Economics wing (Block-14, Room-14)
6.	**Scanner**	2	Being used in Division Chief's (Project Director) office, (Block-14, Room-15)
			Being used in Senior Assistant Chief's (Assistant Project Director) room, International Economics wing (Block-14, Room-33)
7.	**Printer**	2	Being used in Division Chief's (Project Director) office, (Block-14, Room-15)
			Being used in Senior Assistant Chief's (Assistant Project Director) room, International Economics wing (Block-14, Room-33)
8.	**Office Almirah**	1	Being used in Senior Assistant Chief's (Assistant Project Director) room, International Economics wing (Block-14, Room-33
9.	**Book Shelf**	2	Being used in Division Chief's (Project Director) office, (Block-14, Room-15)
			Being used in Senior Assistant Chief's (Assistant Project Director) room International Economics wing (Block-14, Room-33)
10.	**File Cabinet**	2	Being used in Division Chief's (Project Director) office, (Block-14, Room-15)
			Being used in Senior Assistant Chief's (Assistant Project Director) room International Economics wing(Block-14, Room-33)
11.	**Secretary Chair**	2	Being used in Division Chief's (Project Director) office, (Block-14, Room-15)
			Being used in Senior Assistant Chief's (Assistant Project Director) room International Economics wing (Block-14, Room-33)
12.	**Computer Table**	2	Being used in Division Chief's (Project Director) office, (Block-14, Room-15)
			Being used in Senior Assistant Chief's (Assistant Project Director) room International Economics wing (Block-14, Room-33)
13.	**Computer Chair**	2	Being used in Division Chief's (Project Director) office, (Block-14, Room-15)
			Being used in Senior Assistant Chief's (Assistant Project Director) room International Economics wing (Block-14, Room-33)
14.	**Visitor Chair**	6	Being used in 04 (Visitor Chair)Division Chief's (Project Director) office,(Block-14, Room-15)
			Being used in 02 (Visitor Chair) Senior Assistant Chief's (Assistant Project Director) room, International Economics wing (Block-14, Room-33)
15.	**Photocopy Machine Stand**	1	Being used in Senior Assistant Chief's (Assistant Project Director) room International Economics wing (Block-14, Room-33)

২১। **<u>বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রভাব</u> :** Impact Assessment and Coping up Strategies of Graduation from LDC Status for Bangladesh অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সমীক্ষা। এলডিসি হতে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পরিসরে নানাবিধ সুবিধা যেমন: বাণিজ্য, বৈদেশিক সহায়তা, জাতিসংঘ প্রদত্ত অনুদান ও কারিগরী সহায়তা প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সহযোগিতা হারাবে। ফলে আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। বর্ণিত সমীক্ষার মাধ্যমে এ সকল সম্ভাব্য প্রভাবসমূহ নির্ধারণসহ তা মোকাবেলায় যথাযথ কর্মকৌশল সুপারিশ করা হয়েছে। এ সকল সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যোগ/কর্মকান্ড গ্রহণ করা হচ্ছে। এলডিসি হতে উত্তরণের ফলে সম্ভাব্য প্রভাবসমূহ মোকাবেলায় এই সমীক্ষায় সুপারিশকৃত করণীয়/বিষয়ে

ইতোমধ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

২২। <u>সমস্যাঃ</u>

২২.১। <u>Time Over Run</u>: প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল ছিল মে,২০১৮ হতে জুন,২০১৯ পর্যন্ত। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০৬ মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর,২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধনপূর্বক প্রকল্পের মেয়াদ আরো ০৬ মাস বৃদ্ধি করে প্রকল্প ময়াদ মে, ২০১৮ হতে জুন,২০২০ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল ১ বছর ২মাস নির্ধারিত থাকলেও প্রকল্প সমাপ্ত হতে সময় ব্যয় হয়েছে ০২ বছর ০২মাস। ফলে প্রকল্পের টাইম ওভাররান হয়েছে ১ বছর যা মূল অনুমোদিত সময়ের ৮৫.৭১%। এ জাতীয় ছোট একটি প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনার জন্য প্রকল্পটির ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক টাইম ওভার রান (১ বছর) হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

২২.২। **<u>প্রকল্প মনিটরিং :</u>** নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক গত ১৯/০৬/২০১৯ তারিখে পরিদর্শনপূর্বক ০৪টি সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন পরিকল্পনা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তবে আইএমইডি'র সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি। তাছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তাগণ প্রকল্পটি পরিদর্শন করেননি।

২২.৩। **<u>অসম্পূর্ণ পিসিআর প্রেরণঃ</u>** মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত আলোচ্য প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনান্তে কিছু অসম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হওয়ায় (যেমন -পিসিআরএর ২৯ নং পৃষ্ঠায় ৬, ৭ ও ৮ নং অনুচ্ছেদে প্রকল্প পরিচালক, সংস্থা প্রধান ও বিভাগের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তার মন্তব্য উল্লেখ ছিল না) । তা সংশোধন করে পুনরায় আইএমইডিতে প্রেরণের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশোধিত পিসিআর ১৪ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয় ।

২৩। <u>সুপারিশঃ</u>

২৩.১। নিম্ন আয়ের দেশের ক্যাটাগরী (এলডিসি) হতে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশের উপর যে সম্ভাব্য প্রভাব পড়তে পারে তা নিরুপণ এবং এ সকল প্রভাব মোকাবেলায় কৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে এই সমীক্ষা প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর এবং প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়েছে এবং সমীক্ষার মাধ্যমে সম্ভাব্য প্রভাবসমূহ নির্ধারণসহ তা মোকাবেলায় যথাযথ কর্মকৌশল সুপারিশ করা হয়েছে। এ সকল সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক কি ধরনের উদ্যোগ/কর্মকান্ড গ্রহণ করছে বা করবে সে বিষয়ে গবেষণা পরিচালন করা যেতে পারে। বাস্তবায়নকারী সংস্থা /প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে উদ্যোগ গহণ করবে;

২৩.২। প্রকল্প থেকে সঠিক সময়ে সুফল প্রাপ্তি এবং বিনিয়োগকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিজাইন/পরিকলপনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে প্রকল্পে Time over run না ঘটিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করা যায় (২২.১);

২৩.৩। আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শিতব্য অন্যান্য প্রকল্প পরিদর্শনের সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে এবং সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং জোরদার করতে হবে (অনু ২২.২);

২৩.৪। প্রকল্প সমাপ্তির পর পিসিআর প্রণয়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে যত্নশীল হতে হবে এবং ভবিষ্যতে পিসিআর প্রেরণের ক্ষেত্রে নির্ভুল এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে (২২.৩)।

২৩.৫। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত আসবাবপত্র/যন্ত্রাংশ ও মালামালগুলো কোনটি কোথায় ব্যবহৃত হচ্ছে তার একটি ডাটাবেইজ সংরক্ষণ করতে হবে। যাতে পরবর্তীকালে প্রয়োজনে আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও যন্ত্রপাতি/সামগ্রীর অবস্থান নিশ্চিত করা যায় (অনুচ্ছেদ-২০)

২৩.৬। বর্ণিত সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।
