পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সচিবের দপ্তর

প্রাপ্তির তারিখ	ঃ	১৬/৪/২৪
ডাইরী নম্বর	ঃ	৯৫০
তারিখ	ঃ	
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন/সমন্বয়/পরিষদ)		
সচিবের একান্ত সচিব	ঃ	
স্বাক্ষর ঃ	ঃ	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিষদ শাখা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mochta.gov.bd

স্মারক নং:২৯.০০.০০০০.২১৪.৯৯.১১.২২-৩৫

তারিখ: ০৪ এপ্রিল ২০২৪

বিষয়ঃ খাগড়াছড়ি জেলাধীন গুইমারা উপজেলায় নির্মিত এল ড্রেন পরিদর্শন প্রতিবেদন।

সূত্রঃ বাজেট/প্রশাসন-২ শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ০৬ মার্চ ২০২৪ তারিখের ২৯.০০.০০০০.২১৯.০৫.০১৬.২৩-৭৩ নম্বর অফিস আদেশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ অফিস আদেশের প্রেক্ষিতে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক গত ৯ মার্চ ২০২৪ তারিখে খাগড়াছড়ি জেলাধীন গুইমারা উপজেলার অজিবালা ত্রিপুরা বাড়ি হতে ভক্ত কার্বারী পাড়া হয়ে সাধনা সিদ্ধি বৌদ্ধ বিহার পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত এল ড্রেন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রমের নিমিত্ত প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ পাতা।
০২(দুই) পাতা

সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।

০৪/০৪/২০২৪
তাসলীমা বেগম
সিনিয়র সহকারী সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এর দপ্তর

প্রশাসন-১ শাখা	ঃ	প্রশাসন-২/বাজেট শাখা
আইন শাখা	ঃ	হিসাব শাখা
পিও	ঃ	
আইসিটি শাখা	ঃ	
ডাইরী নং ৫১৮	ঃ	তারিখ ১৭.৪.২৪

১৭/৪/২৪

		প্রশাসন-২/বাজেট শাখা
		হিসাব শাখা
পিও	ঃ	
আইসিটি শাখা	ঃ	
ডাইরী নং	ঃ	তারিখ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিষদ শাখা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mochta.gov.bd

বিষয়: প্রকল্প **পরিদর্শন প্রতিবেদন**

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও কর্মস্থল: তাসলীমা বেগম, সিনিয়র সহকারী সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
পরিদর্শনের তারিখ: **০৯**/০৩/২০২৪

ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য			
১.	প্রকল্পের নাম	:	"গুইমারা উপজেলাধীন অজি বালা ত্রিপুরা বাড়ী হতে ভক্ত কার্বারী পাড়া হয়ে সাধনা সিদ্ধি বৌদ্ধ বিহার পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন" প্রকল্পের আওতায় এলড্রেন নির্মাণ
২.	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি
৩.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৪.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি ।
৫.	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	৯১.৪৩ লক্ষ টাকা
৬.	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল	:	জুলাই, ২০২২ - জুন, ২০২৫
৭.	প্রকল্প এলাকা	:	গুইমারা উপজেলাধীন ভক্ত কার্বারী পাড়া
৮.	পরিদর্শিত এলাকা		অজিবালা ত্রিপুরা পাড়া ও ভক্ত কার্বারী পাড়া
০৯.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	জলবদ্ধতা দূর করে রাস্তা টেকসই করার লক্ষ্যে এলড্রেন নির্মাণ
১০.	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও ফোন নম্বর	:	মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি । মোবা: ০১৮৯৩৪২১৭০২

খ) চলতি অর্থবছরে (২০২৩-২৪) এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ এবং আর্থিক ব্যয় **(লক্ষ টাকায়)**

			মোট	**জিওবি**	**প্রকল্প সাহায্য**
১১.	বর্তমান অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ	:	৫৫.২৭ লক্ষ টাকা	৫৫.২৭ লক্ষ টাকা	-
১২.	বর্তমান অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ মাস পর্যন্ত ব্যয় (মোট বরাদ্দের %)	:	৫৫.২৭ **(৬০.০০%)**	৫৫.২৭ **(৬০.০০%)**	-
১৩.	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	:	৫৫.২৭ **(৬০.০০%)**	৫৫.২৭ **(৬০.০০%)**	-
১৪.	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি [সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং বাস্তব অগ্রগতি %]	:	রাস্তাটির মোট দৈর্ঘ্য ১৮০০.০০ মিটার । এল ড্রেনের দৈর্ঘ্য ২৪০.০০ মিটার কাজের অগ্রগতি ৯০% ।		
১৫.	প্রকল্প পরিদর্শনের ছবি	:	  "গুইমারা উপজেলাধীন অজি বালা ত্রিপুরা বাড়ী হতে ভক্ত কার্বারী পাড়া হয়ে সাধনা সিদ্ধি বৌদ্ধ বিহার পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন" প্রকল্পেরআওতায় এলড্রেন পরিদর্শনের ছবি		

১৬.	উপকার ভোগীদের মতামত	:	স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনায় জানা যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে রাস্তাটি টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী হবে। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হবে।
১৭.	প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা	:	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে তেমন কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি। নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, চলতি অর্থ বছরে উক্ত প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে।
১৮.	প্রকল্প পরিদর্শনকারীর মতামত	:	প্রকল্পটির অগ্রগতি সন্তোষজনক। পাহাড়ি রাস্তায় টেকসই করার জন্য এলড্রেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট মাটিক্ষয় প্রতিরোধের জন্য রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে এলড্রেনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

০৪/২০২৪

(তাসলীমা বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সচিবের দপ্তর
প্রাপ্তির তারিখ ঃ ২১/৪/২৪
ডাইরী নম্বর ঃ ২৫১
তারিখ ঃ
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন/সমন্বয়/পরিষদ)
সচিবের একান্ত সচিব ঃ
স্বাক্ষর ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিষদ শাখা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mochta.gov.bd

স্মারক নং: ২৯.০০.০০০০.২১৪.৯৯.১১.২২-৩৬

তারিখ: ০৪ এপ্রিল ২০২৪

বিষয়ঃ খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন গরগজ্যাছড়ির আখ্যা ডাক্তার পাড়ায় নির্মিত সেচ ড্রেন পরিদর্শন প্রতিবেদন।

সূত্রঃ বাজেট/প্রশাসন-২ শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ০৬ মার্চ ২০২৪ তারিখের ২৯.০০.০০০০.২১৯.০৫.০১৬.২৩-৭৩ নম্বর অফিস আদেশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ অফিস আদেশের প্রেক্ষিতে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক গত ১০ মার্চ ২০২৪ তারিখে খাগড়াছড়ি জেলার খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন গরগজ্যাছড়ির আখ্যা ডাক্তার পাড়ায় নির্মিত সেচ ড্রেন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রমের নিমিত্ত প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ০২ (দুই) পাতা।

০৪/০৪/২০২৪
তাসলীমা বেগম
সিনিয়র সহকারী সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।

সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এর দপ্তর
প্রশাসন-১ শাখা ঃ প্রশাসন-২/বাজেট শাখা
আইন শাখা ঃ হিসাব শাখা
পিও ঃ
আইসিটি শাখা ঃ
ডাইরী নং ২১৭ ঃ তারিখ ১৭/৪/২৪
১৭/৪/২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিষদ শাখা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mochta.gov.bd

বিষয়: প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও কর্মস্থল: তাসলীমা বেগম, সিনিয়র সহকারী সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
পরিদর্শনের তারিখ: **১০**/০৩/২০২৪

ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য			
১.	প্রকল্পের নাম	:	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার গরগজ্যাছড়ির আখ্যা ডাক্তার পাড়ায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ
২.	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি
৩.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৪.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড।
৫.	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	২০.৭১ লক্ষ টাকা
৬.	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল	:	২০২২ - ২০২৪ অর্থবছর
৭.	প্রকল্প এলাকা	:	খাগড়াছড়ি সদর
৮.	পরিদর্শিত এলাকা		খাগড়াছড়ি সদর
০৯.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	সেচ সুবিধার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ।
১০.	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও ফোন নম্বর	:	মো: মুজিবুল আলম, নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, খাগড়াছড়ি। ফোন নাম্বার :- ০২৩৩৩৩৪৩৬১৩

খ) চলতি অর্থবছরে (২০২৩-২৪) এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ এবং আর্থিক ব্যয় **(লক্ষ টাকায়)**

			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১১.	বর্তমান অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ	:	১১.০০ লক্ষ টাকা	১১.০০ লক্ষ টাকা	
১২.	বর্তমান অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ মাস পর্যন্ত ব্যয় (মোট বরাদ্দের %)	:	১৫.১৮ (৭৩.২৯%)	১৫.১৮ (৭৩.২৯%)	
১৩.	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	:	১৫.১৮ (৭৩.২৯%)	১৫.১৮ (৭৩.২৯%)	
১৪.	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি [সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং বাস্তব অগ্রগতি %]	:	স্কিমটি ৫/০৩/২০২৪খ্রি: তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত সেচ ড্রেইনের দৈর্ঘ্য ৫২২ মিটার।		
১৫.	প্রকল্প পরিদর্শনের ছবি	:	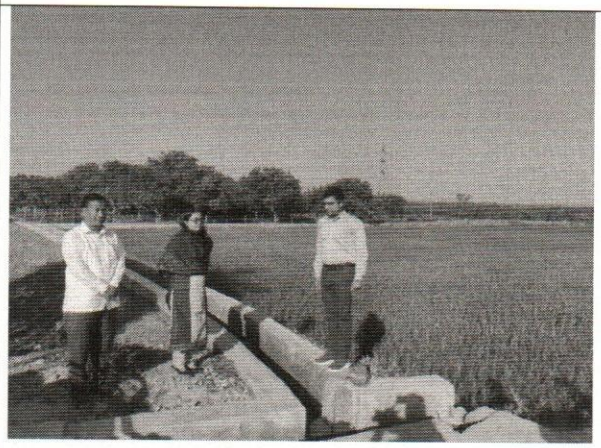 খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার গরগজ্যাছড়ির আখ্যা ডাক্তার পাড়ায় সেচ ড্রেইন পরিদর্শন।		

১৬.	উপকার ভোগীদের মতামত	:	স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনায় জানা যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ফসল উৎপাদন সহজতর হয়েছে।
১৭.	প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা	:	স্কিমটি বাস্তবায়নে তেমন কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি। নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, চলতি অর্থ বছরে উক্ত স্কিমটি সমাপ্ত হয়েছে।
১৮.	প্রকল্প পরিদর্শনকারীর মতামত	:	স্কিমটি বাস্তবায়নের ফলে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় এক ফসলী কৃষি জমিতে বর্তমানে বৎসরে দুই বার ফসল উৎপাদন হচ্ছে।

০৪/০৪/২০২৪

(তাসলীমা বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
