Project :

BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY
RAJSHAHI.

Well No	:	
District	:	Panchagarh
Upazilla	:	Tetulia
Union	:	Debnagar
Mouza	:	Amjoani
J.L No.	:	28
Plot No.	:	3381

Engineer :

Barind Multipurpose Development Authority.

Drilling Contractor

M/S. A. K. M. Ahsanul Haque.

DRILLING LOG.

Date Strated : 10. 02. 09 At 16.00 Hrs. Date completed : 12. 02. 09 At : 11.00 Hrs.
Logged by : SSAE, BMDA. Boda Zone. Rod length 10 ft.

Drilling Time Log			Grafhic Log	Thickness (ft.)		Description of Formation.
Rod	From	To		From	To	
1	16.00			0	10	Clay
				10	20	
				20	30	
				30	40	
				40	50	F.S Brown
				50	60	
				60	70	
				70	80	
				80	90	M.S Grey
				90	100	
				100	110	Clay
				110	120	
				120	130	
				130	140	M.S to C.S Grey
				140	150	
				150	160	
17		11.00		160	above	C.S Grey & Stone

Sub Assistant Engineer
Date :

Assistant Engineer
Date : 16/11/09

For the Contractor
Date :

Project :

BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY, RAJSHAHI.

Well No	:	
District	:	Panchagarh
Upazilla	:	Tetulia
Union	:	Debnagar
Mouza	:	Amjoani
J.L No.	:	28
Plot No.	:	3381

Engineer :	Drilling Contractor
Barind Multipurpose Development Authority.	M/S. A. K. M. Ahsanul Haque.

CONSTRUCTION DETAILS.

Operation	Started			Completed		
Drilling	10.02. 09 At	16.00	Hrs	12.02.09 At	11.00	Hrs
Casing	12.02. 09 At	12.00	Hrs	12.02.09 At	14.00	Hrs
Gravel placing	12.02. 09 At	14.00	Hrs	12.02.09 At	16.00	Hrs

Drilling Diameter : 24"

Housing pipe : (Diameter 14") PVC

UWC (Dia. 14" PVC) : 0.60 m. above G.L.

UWC (Including Reducer) : 26.05 m. bellow G.L.

Total length (m.) = 26.65 m.

Lapping (With Reducer) = 1.50 m.

LWC (Diameter 8" Inch) : PVC

Depth bellow G.L From : 29.90 m. To 32.75 m. 2.85 m.

From : To ×

Total length (m.) = 2.85 m.

Lapping = 0.15 m.

Screen (Diameter 8" Inch) : PVC

Depth bellow G.L From : 26.05 m. To 29.90 m. 3.85 m.

From : 32.75 m. To 47.30 m. 14.55 m.

Total length (m.) = 18.40 m.

Lapping = 0.60 m.

Bail plug (Diameter 8" Inch) : PVC

Depth bellow G.L From 47.30 m. To 48.30 m. = 1.00 m.

Centralizers :

Depth bellow G.L at 26.05 m, 29.90 m, 32.75 m, 38.60 m, 44.45 m, 47.30m. Total Numbers= 6 Nos.

Gravel :

Gravell Quantity (Approximately) : Cum.

Depth bellow G.L From : G.L To 48.50 m. length = 11.50 Cum.

Fixture Length (Excluding lapping of Joint) :

From Top of UWC to bottom of Bail Plug (m.) = 48.90 m.

Verticality Test :

Maximum Deviation : 1.78 " Inch at 60 ft. Depth.

Date : 12. 02. 09

G.L হইতে বেইল প্লাগের তলা পর্যন্ত Gravells দ্বারা প্যাকিং সম্পন্ন করা হয়েছে।

Material Used :

Housing pipe (Inc. Reducer) + Blind Pipe+Well Screen + Bail Plug = 28.15 m +3.00 m+ 19.00 m + 1.00 m = 51.15 m.

Lapping = 1.50 m +0.15 m+ .60 m = 2.25 m.

Cross Section of the Well

(Not to scale)

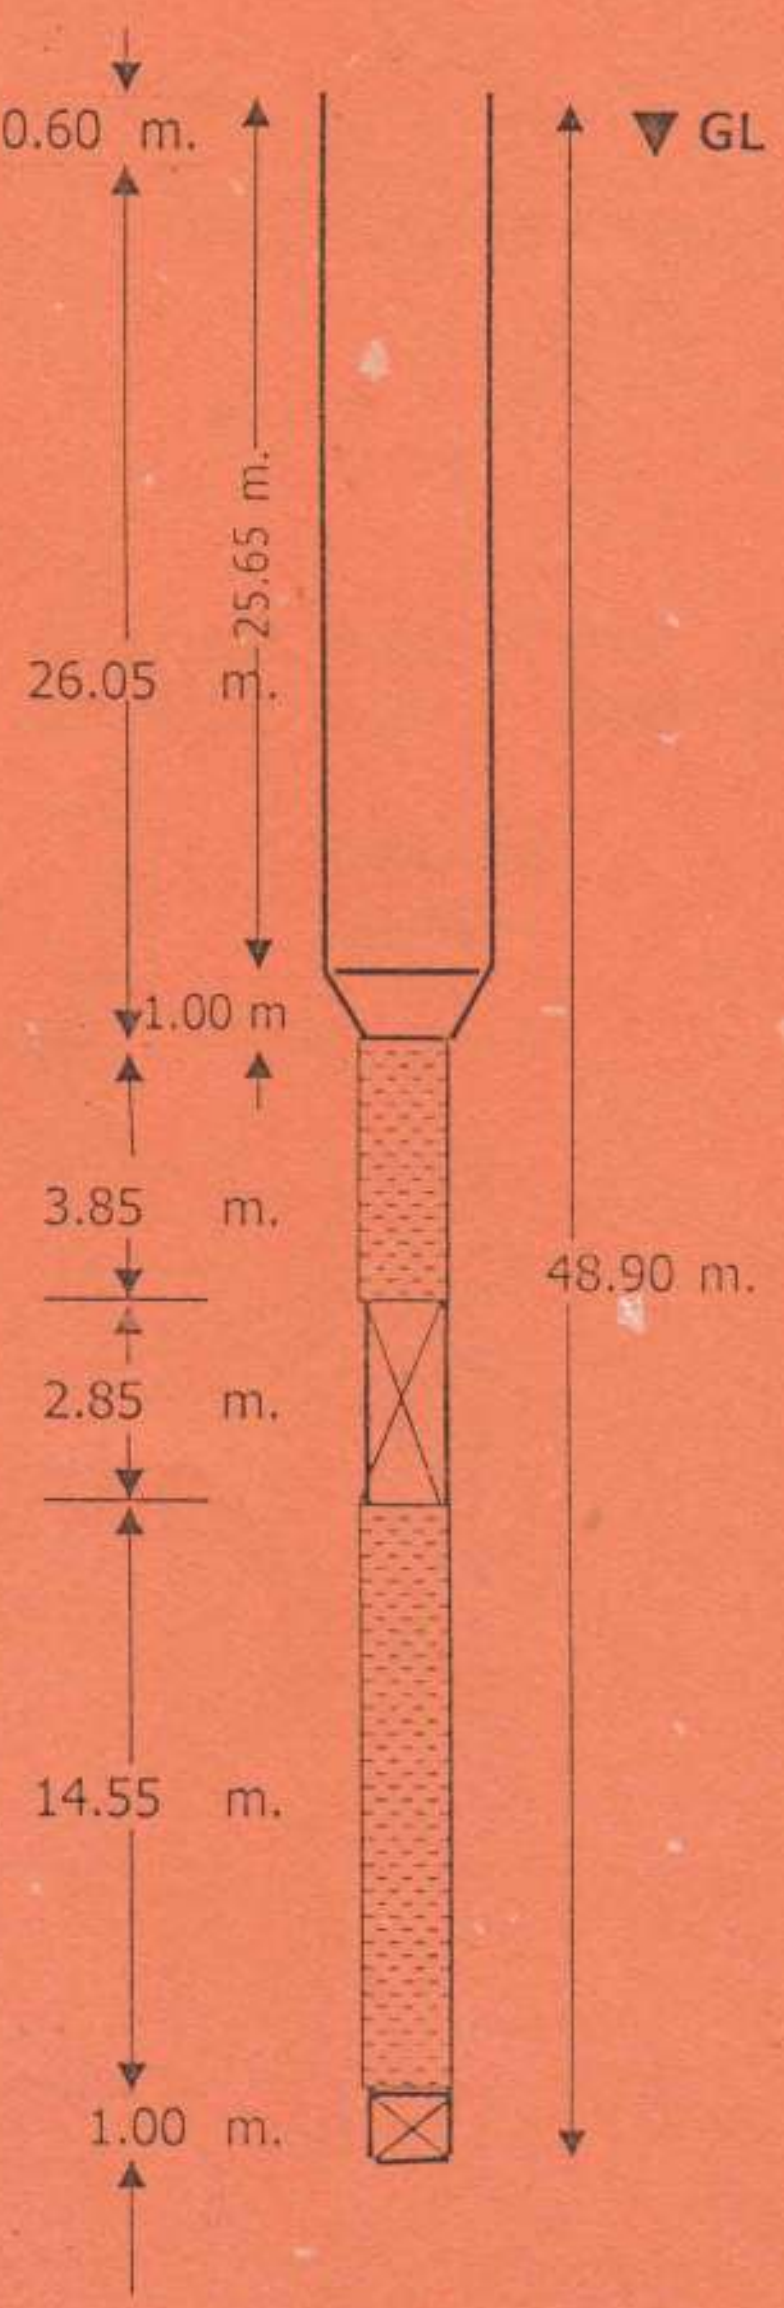

Order Depth = 48.30 M.

(From G.L to bottom of bail plug)

SSAE/ SAE
Date :

Assistant Engineer
Date :

For the contractor
Date :

Copy for

BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY
RAJSHAHI.

INSPECTION OF VERTICALITY OF THE DEEP TUBE WELL.

Before Shrouding.

1 Well No :
2 District : Panchagarh
3 Upazilla : Tetulia
4 Union : Debnagar
5 Mouza : Amjoani
6 J.L No. : 28
7 Plot No. : 3381
8 Total Length of Deep Tube Well : 160'- 5" ft.
9 Length of UWC (Excluding Reducer) : 84'- 2" ft.
10 Name of the Sinking of Contractor : M/S A. K. M. Ahsanul Haque.

Date : 12 -04 -2009.

VERTICALITY DATA SHEET.

Dia of UWC d -1: 14.00 Inch.
Dia of Disc d -2 : 13.50 Inch.

Suspention of Height (H) : 10' ft.

Depth in ft. Length	Deviation of Inch. X	Bearing Reading Pointing North	Calculated Deviation in inch. $D' = \frac{X(L+H)}{H}$	Disc Factor $C = \frac{(d1 - d2)}{2}$	Deviation in inch. $D = D' + C$
10'	0		0.000	0.25	0.25
20'	0.156	NW	0.468	0.25	0.72
30'	0.156	NW	0.624	0.25	0.87
40'	0.188	NW	0.940	0.25	1.19
50'	0.188	NW	1.128	0.25	1.38
60'	0.188	NE.	1.316	0.25	1.57
70'	0.218	NE.	1.744	0.25	1.99
80'	0.218	NE.	1.962	0.25	2.21
90'					
100'					
110'					
120					

11 Maximum Deviation : 2.21" Inch. at Depth 80'- 0" ft.
12 Other observation, if any :

Sub Assistant Engineer
Date :

Assistant Engineer
Date : 16.11.09

সহকারী প্রকৌশলী
বিএমডিএ, ইউনিট-২

মেসার্স একে এম আহসানুল হক
For the Contractor স্বত্বাধিকারী
Date :

Copy for

BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY
RAJSHAHI.

INSPECTION OF VERTICALITY OF THE DEEP TUBE WELL.

After Shrouding.

1 Well No :
2 District : Panchagarh
3 Upazilla : Tetulia
4 Union : Debnagar
5 Mouza : Amjoani
6 J.L No. : 28
7 Plot No. : 3381
8 Total Length of Deep Tube Well : 160'- 5" ft.
9 Length of UWC (Excluding Reducer) : 84'- 2" ft.
10 Name of the Sinking of Contractor : M/S A. K. M. Ahsanul Haque.

Date : 12 -04- 2009.

VERTICALITY DATA SHEET.

Suspention of Height (H) : 10' ft.

Dia of UWC d -1: 14.00 Inch.
Dia of Disc d -2 : 13.50 Inch.

Depth in ft. Length	Deviation of Inch. X	Bearing Reading Pointing North	Calculated Deviation in inch. $D' = \frac{X(L+H)}{H}$	Disc Factor $C = \frac{(d1 - d2)}{2}$	Deviation in inch. $D = D' + C$
10'	0		0.000	0.25	0.25
20'	0.125	NE.	0.375	0.25	0.63
30'	0.125	NE.	0.500	0.25	0.75
40'	0.156	NE.	0.780	0.25	1.03
50'	0.156	NE.	0.936	0.25	1.19
60'	0.218	NW	1.526	0.25	1.78
70'	0.188	NW	1.504	0.25	1.75
80'	0.156	NW	1.404	0.25	1.65
90'					
100'					
110'					
120'					

11 Maximum Deviation : 1.78" Inch. at Depth 60'- 0" ft.
12 Other observation, if any :
13 Straaightness : Dolly Passed up to 84'- 0" ft. freely in the UWC.

Sub Assistant Engineer
Date : 14/05/09

এ. কে. এম. ফজলুল হক
উপসহকারী প্রকৌশলী
বিএমডিএ, ইউনিট-২,
বোদা জোন, পঞ্চগড়।

Assistant Engineer
Date : 16/5/09

মেসার্স এ কে এম আহসানুল হক

For the Contractor/স্বত্বাধিকারী
Date :

Copy for

BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY
RAJSHAHI.

DEVELOPMENT RECORD
(Preiod : 2 Hours)

Date : 14 -02 -2009.
Srarting Time : 8 hrs 0 min. Capacity of Pump : 3 Cusec.
Ref. Mark (Top of Housing) : 2'- 0" ft. above G.L.
Static Water Level : 13' - 4" ft. bellow top of housing pipe.
Size of Orifice : 5" Inch. Size of delivery pipe : 6" Inch.
Length of UWC : 84'- 2" ft. Depth of Pump Setting : 73'-0" ft.

Well No :
District : Panchagarh
Upazilla : Tetulia
Union : Debnagar
Mouza : Amjoani
J.L No. : 28
Plot No. : 3381

Time	Pizometric Height (Inch).	Discharge (Cusec).	Pumping Water level bellow Refference Mark (Ft.)	Actual Draw - Down (ft.)	Remarks.
1	2	3	4	5	6
(8 hrs) (8 hours)			13' - 4"	S.W.L	50 % Discharge.
05 mn	13.5"	1.02	26' -10"	13' -6"	
10 mn	"	"	27' - 2"	13' -10"	
15 mn	"	"	27' - 5"	14' -1"	
20 mn	"	"	27' - 8"	14' -4"	
25 mn	"	"	27' - 10"	14' -6"	
30 mn	"	"	27' - 11"	14' -7"	
35 mn	53"	2.00	41' -5"	28' - 1"	100 % Discharge.
40 mn	"	"	41' -10"	28' - 6"	
45 mn	"	"	42' -0.5"	28' -8.5"	
50 mn	"	"	42' -2.5"	28' -10.5"	
55 mn	"	"	42' - 4"	29' - 0"	
60 mn	"	"	42' - 5"	29' - 1"	
65 mn	"	"	42' - 6"	29' - 2"	
70 mn	84"	2.50	48' - 10"	35' - 6"	125 % Discharge.
80 mn	"	"	49' - 7"	36' - 3"	
90 mn	"	"	49' - 9"	36' - 5"	
100 mn	113"	3.00	56' - 5"	43' - 1"	150 % Discharge.
110 mn	"	"	56' -11"	43' - 7"	
120 mn (2 hours)	"	"	57' - 1"	43' - 9"	

1 Cusec = 448.8 gls/mn.

Sub Assistant Engineer
Date :
এ, কে, এম, কামরুল হক
উপজেলা উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিএমডিএ, ইউনিট-২,
তেতুলিয়া জোন, পঞ্চগড়।

Assistant Engineer
Date 16.11.

(এ,এইচ,এম কুদরত-ই-এলাহী)
সহকারী প্রকৌশলী
বিএমডিএ, ইউনিট-২
তেতুলিয়া জোন, তেতুলিয়া, পঞ্চগড়।

মেসার্স এ কে এম আমিনুল হক
For the Contractor
স্বত্বাধিকারী
Date :

5. Amjoani-3381Sheet1

BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY

RAJSHAHI

ORM FOR SITE SEL ECTION FEAS IBILITY REPORT FOR DEEP TUBEWELL

A. DEEP TUBEWELL. SITE

1. District ....Panchagarh.... 2. Thana ....Tetulia.... 3. Jl. No. ....28....
4. U.P ....~~3381~~ Dubnagar.... 5. Plot No. ....3381.... 6. Name of scheme Amjoani
7. Area (Acres) ....88.52.... 8. Does tubewell site owner agree to hand over the Plot ?
....Yes.... 9. Name of T.W. site owner. Md. Abdul Goni
10. Is mouza map tracing in correct form ? ....Yes.

B. ACCESS

11. Site location (give directions)	North side from H/Q.
12. a) Site to good surfaced road (miles)	45 Km
b) Site to bad surfaced road (miles)	½ Km.
13. Site to earth road (yards)	½ Km
14. Access project of nearest to site (months)	July to November

C. TOPOGRAPHY AND DISTRIBUTIONS

15. Percentage of proposed area : Commandable	97%
16. Maximum flood level at TW site in monsoon (feet)	1'-0"
17. Height of TW site above adjacent plot if raised (feet)	1'-6"
18. Irrigation water can be distributed in 4. 3. 2. or directions.	4

D. SOILS & CROPPING

Drainage Class	No of Water Stand After Heavy Rain	Sample depth	A	B	C	D
19. High land (Uchujami)	18 Hrs.	6 Inch	L	L	L	L
20. Mid High land (Majhari Uchujami)	24 Hrs	12 Inch	CL	CL	CL	CL
21. Mid low land (Majhari Nichujami)	36 Hrs.	12-18"	CL	CL	CL	CL
22. Low land (Nichujami)	48 Hrs.	12-24"	CL	CL	CL	CL

24. Crops grown in monsoon season at present by group...

Crop grown in winter ....at present by group....Wheat, T. Aush

Monsoon crops group intends to grow after tubewell operator.........................

Winter season, crops group intends to grow after tubewell operators...Irri, Boro, Potato

Can mustard pulsies be grown During winter If not

why?.......................Yes.......................

E. CRITERIA :

	Yes/no
Is site more than ¾ mile from flowing river ?	Yes.
Is site least 2500 ft. from existing **DTW** or **LLP** ?	Yes.
Is Site at least 1700 ft. from existing **STW**	Yes.
Is depth of flooding at **TW** site less than 5ft.	Yes.
Is distance reasonable ?	Yes.
Is topography suitable for distribution in at least a directions ?	Yes.
Is soil suitable ?	Yes.

FEASIBILITY OF THE SCHEME

Is the scheme technically feasible for a **DTW** ? Yes / No

Inspected by : Verified by

Sub. Asstt. Engineer : Asstt. Engineer

Commended by : Approved by :

Executive Engineer : Executive Director.

"একরার নামা"

পঞ্চাশ টাকার নন-জুডিসিয়াল ষ্টাম্প

(Deed of Agreemcnt)

এই চুক্তিপত্র (Deed of Agreement) অদ্য ইংরেজী ....
বাংলা ....তারিখে প্রণীত হল নিম্নলিখিত পক্ষদ্বয়ের

মধ্যে

বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী এর পক্ষে................................ .....জোনের/ থানার সহকারী প্রকৌশলী অথবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি। অতঃপর ইহা বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ বলে অভিহিত হবে। ....১ম পক্ষ এবং ....বরেন্দ্র গভীর নলকুপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন" (Barind deep tubewell water user's association) অথবা ইহার নিম্নে মনোনীত ব্যক্তিবর্গ/প্রতিনিধি

(১) .... পিতা ....
(২) .... পিতা ....
(৩) .... পিতা ....
সর্বজাতি .... পেশা .... গ্রাম ....
থানা .... জেং ....২য় পক্ষ

"গভীর নলকূপের বিবরণ ও তফশীল"

জেলা ....
থানা ....
ইউনিয়ন ....
মৌজা ....
জে.এল নং ....
প্লট নং ....

কস্য একরার নামা পত্রমিদং লিখিতং কার্য্যাঞ্চগে আমরা তফশীলে বর্ণিত নলকুপ ব্যবহারকারী বরেন্দ্র গভীর নলকুপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন (Barind deep tubewell water user's association) এর পক্ষে নিম্নলিখিত কৃষকবৃন্দ বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প বিএমডিও কর্তৃক স্থাপিত / স্থাপিতব্য গভীর নলকুপটি নিম্নলিখিত শর্ত পালন সাপেক্ষে এবং (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত কো-অপারেটিভ সোসাইটি রুলস ১৯৮৭, কো-অপারেটিভ সোসাইটি অর্ডিনেন্স ১৯৮৪ (অর্ডিনেন্স নং১,১৯৮৫). বাংলাদেশ ইরিগেশন ওয়াটার রেট অর্ডিনেন্স ১৯৮৩ (অর্ডিনেন্স নং ৩১) ও তৎসংক্রান্ত গেজেট ১৮ইং জানুয়ারী, '৮৪) গেজেট নোটিফিকেশন (২রা ফেব্রুয়ারী '৮৭) ইরিগেশন এ্যাক্ট ১৯৭৬ (৩১শে মে, ১৯৭৭ পর্যন্ত সংশোধিত) এবং ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত যে কোন আইন বা বিধি) অনুযায়ী ক্রয়/পরিচালনা করতে এতদ্বারা চুক্তিবদ্ধ হলাম।

যেহেতু বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প ছক- এবং বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সরকারী রেজুলিউশন নং-পি এম ইউ (সেচ) প্রকল্প-২১ (৪) ৯০/১৫ এর অনুচ্ছেদ ৫ বলে বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আধুনিক চাষাবাদ, নানা প্রকার ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পানির চাহিদা মিটাবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত/স্থাপিতব্য গভীর নলকুপের প্রয়োজন অনুভুত হয়েছে; এবং

যেহেতু ". . . . . বরেন্দ্র গভীর নলকুপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন" (Barind deep tubewell water user's association) এর পক্ষ হতে জমির মালিকগণের যৌথ মালিকানায় এবং বৃহত্তর যৌথ ব্যবস্থাপনায় সেচচার্জ ভিত্তিতে গভীর নলকুপ পরিচালনা করবে; এবং

যেহেতু ". . . . . বরেন্দ্র গভীর নলকুপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন" (Barind deep tubewell water user's association) গভীর নলকুপ দ্বারা চাষাবাদের জন্য বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সেচচার্জ ভিত্তিতে গভীর নলকুপ ক্রয়/ব্যবহারের প্রস্তাব দাখিল করেছেন এবং যেহেতু বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প- বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজশাহী- উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন সেহেতু ১ম পক্ষ ও ২য় পক্ষ বর্ণিত শর্তে একরার নামায় (Deed of Agreement) চুক্তিবদ্ধ হলাম।

শর্তাবলী ঃ

১। গভীর নলকূপের (১.২-২কিউসেক ফোর্স মাত্র) ০.২-১.০ কিউসেক মূল্য পরিশোধের নিমিত্তে বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের নির্ধারিত নূন্যতম সেচ এলাকা (কিউসেক প্রতি ৩০ একর) জমির মালিকগণের নিকট হতে প্রতি শতংশ জমির জন্য ধার্যকৃত অর্থ প্রকল্প তহবিলে এককালীন জমা প্রদান করব।

২। গভীর নলকূপের সেচ এলাকায় যে কোন জমির উপর দিয়ে পানি বিতরণ নালা (ভূ-গর্ভস্থ/ভু-পরিস্থ) নির্মিত হলে আমাদের কোন আপত্তি থাকবে না, থাকলেও তা আইনানুগ গ্রাহ্য হবে না।

৩। গভীর নলকূপটি ক্রয়ের নিমিত্তে প্রতি ১৭ শতাংশ (অর্ধ বিঘা) জমির জন্য একটি শেয়ারের মালিক হিসাবে ব্যবস্থা রাখা হবে। উল্লেখ যে যদি কোন কৃষকের জমি ১৭ শতাংশের কম থাকে সে ক্ষেত্রে উক্ত কৃষকের জন্য একটি শেয়ারের ব্যবস্থা থাকবে। তবে ১৭ শতাংশের অতিরিক্ত জমির মালিকগণ শুধুমাত্র প্রত্যেক ১৭ শতাংশের জন্য একটি করে শেয়ারের মালিকানা পাবেন।

৪। "বরেন্দ্র গভীর নলকুপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন" (Barind deep tubewell water user's association) অর্থাৎ ২য় পক্ষ এর কার্যক্রম পরিচলনার জন্য শেয়ার সংখ্যার মালিকানার ভিত্তিতে ভোটাধিকার থাকবে তবে সেচচার্জ পদ্ধতিতে পরিচালিত গভীর নলকূপের ক্ষেত্রে সেচভূক্ত জমির একজন প্রকৃত মালিক একটি মাত্র ভোটের অধিকারী হবেন।

৫। গভীর নলকূপ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তৈল, জ্বালানী, খুচরা যন্ত্রাংশ, ড্রেনম্যান, অপারেটর, গ্রুপলিডার এ ইত্যাদি বাবদ খরচ জমির পরিমাণের উপর মালিকগণ আনুপাতিক হারে বহন করবেন।

৬) সেচ কার্য ব্যবহারের নিমিত্তে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরবার কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশ ইরিগেশন ওয়াটার রেট অর্ডিনেন্স ১৯৮৩ (অর্ডিনেন্স নং ৩১) ও তৎসংক্রান্ত গেজেট নোটিফিকেশন (১৮ই জানুয়ারী, ১৯৮৪) এবং গেজেট নোটিফিকেশন (২রা(ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭) মোতাবেক নিম্নবর্ণিত হারে বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প কর্তৃক ধার্য্যকৃত সেচ চার্জ প্রদান করতে "বরেন্দ্র গভীর নলকুপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন : (Barind deep tubewell water user's association) বাধ্য থাকবে। উপরন্ত এ সংক্রান্ত পরবর্তীতে অন্য যে কোন আইন বা বিধি প্রনীত হলে উভয় পক্ষ তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।

সেচ এলাকা ভিত্তিক নিরুপিত সেচচার্জের বিবরণ

ক্রমিক নং	নলকুপের ডিসচার্জ (কিউসেক)	নিম্নতম সেচ এলাকা (একর)	নির্ধারিত সেচচার্জ টাকা	নিরুপিত সেচচার্জ টাকা (৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত ২০%রেয়াত সহ)	নিরুপিত সেচচাজ (১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ২০%রেয়াত সহ)	নিরুপিত সেচচার্জ (১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে ৩১মার্চ পর্যন্ত)
১	১.২০-১.৫০	৪৫	টাঃ ১০১৩৫/=	টাঃ ৮১০০/-	টাঃ ৯১২১/=	টাঃ ১০১৩৫/=
২	১.৫১-১.৭৫	৫৪	টাঃ ১২১৫০/=	টাঃ ৯৭২০/=	টাঃ ১০৯৩৫/=	টাঃ ১২১৫০/=
৩	১.৭৬-২.০০	৬০	টাঃ ১৩৫০০/=	টাঃ ১০৮০০/=	টাঃ ১২১৫০/=	টাঃ ১৩৫০০/=

[বিঃ দ্রঃ সরকারী সিদ্ধান্তের আলোকে সেচ চার্জ পরিবর্তন যোগ্য। প্রকৃত সেচ এলাকা নূন্যতম সেচ এলকার চেয়ে বেশী হলে নিরুপিত সেচ চার্জ আনুপাতিক হারে বাড়াবে।]

৯) উপরোক্ত বর্ণনা মতে ২য় পক্ষ প্রতি বছর ৩১শে মার্চের মধ্যে সেচচার্জ দিতে ব্যর্থ হলে গেজেট নোটিফিকেশনের ১১নং অনুচ্ছেদ বলে বিঘা প্রতি, প্রতি মাসে, অথবা মাসের ভগ্নাংসে ১/= টাকা হারে সুদসহ মূল অর্থ জমা দিতে বাধ্য থাকব। পরবর্তী সেচ মৌসুম শুরুর পূর্বেও যদি আমরা সেচ চার্জ প্রদান না করি তবে কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ ১ম পক্ষ সেচের পানি বন্ধ করলে আমাদের অর্থাৎ ২য় পক্ষের কোন আপত্তি থাকবেনা।

১০ "বরেন্দ্র গভীর নলকুপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন" (Barind deep tubewell water user's association) এর পরিচালনার নিমিত্তে ইরিগেশন, এ্যাক্ট, ১৯৭৬ (৩১শে মে, ১৯৭৭ পর্যন্ত সংশোধিত) বা ভাবিষ্যতে এ সংক্রান্ত অন্য কোন আইন বা বিধি অনুযায়ী বরেন্দ্র প্রকল্পের সহকারী প্রকৌশলী/নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক "ক্যানাল অফিসার" / বা অন্য কোন পদের ক্ষমতা প্রয়োগ করলে আমরা অর্থাৎ ২য় পক্ষ তা মানতে বাধ্য থাকবে।

১১) গ্রুপ লিডার কোন অবস্থাতেই কোন কৃষকের নিকট হতে প্রকল্প কর্তৃক নির্ধারিত হারের চেয়ে বেশী সেচচার্জ আদায়, গ্রহণ করতে পারবে না। করলে আইনতঃ দন্ডনীয় হবে। প্রতি বছরান্তে আয় ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতে গ্রুপ লিডার আইনতঃ বাধ্য থাকবে।

১২) সেচ চার্জ ভিত্তিতে নলকূপ সেচ কাজে ব্যবহারকালীন সময়ে মেরামত খরচ জমাকৃত সেচ চার্জের শতকরা তেত্রিশ ভাগের বেশী হলে মেরামত খরচ বাবদ অতিরিক্ত টাকা "বরেন্দ্র গভীর নলকুপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন" (Barind deep tubewell water user`s association) ২য় পক্ষ বহন করতে বাধ্য থাকবে। প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত যন্ত্রাংশ সমূহ উক্ত তেত্রিশ ভাগের অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য হবে।

১৩) সেচ চার্জ ভিত্তিতে নলকুপ ব্যবহার কালে সেচ মৌসুম শেষ হওয়ার সাথে সাথে নলকুপের হ্যান্ডেল ও স্পাইসার শ্যাপ্ট সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলীর দপ্তরে (জোনাল দপ্তর) জমা দিতে আমরা বাধ্য থাকব। যথাসময়ে হ্যান্ডেল ও স্পাইসার শ্যাপ্ট জমা দানে আমরা অপারগ হলে বরেন্দ্র প্রকল্প কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ ১ম পক্ষ উহা খুলে নিয়ে গেলে আমাদের অর্থাৎ ২য় পক্ষের কোন আপত্তি থাকবে না। পরবর্তী সেচ মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই ২য় পক্ষ সেচ চার্জ প্রদান পূর্বক নলকুপ ব্যবহারের নিমিত্তে হ্যান্ডেল ও স্পাইসার শ্যাপ্ট সহকারী প্রকৌশলী দপ্তর হতে গ্রহণ করবে।

১৪) গভীর নলকুপের ইঞ্জিন, পাম্প, গিয়ারহেড, মোটর ইত্যাদি "বরেন্দ্র গভীর নলকুপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন" (Barind deep tubewell water user`s association) বা তাদের যে কোন প্রতিনিধির যথেচ্ছাভাবে ব্যবহারের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হলে উক্ত যন্ত্রাদি/যন্ত্রাংশের শতকরা পয়ত্রিশ ভাগ মূল্য এসোসিয়েশন বহন করতে বাধ্য থাকবে।

১৫) উপরোক্ত শর্ত পালনে আমরা অর্থাৎ ২য় পক্ষ গড়িমসি করলে বা ব্যর্থ হলে বরেন্দ্র প্রকল্প কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্তৃপক্ষ পি ডি, আর এ্যক্টের বিধান মতে বা অন্য যে কোন আইনের বিধান মতে গভীর নলকুপের মূল্য সেচ চার্জ আদায়ের জন্য আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবে।

১৬) অত্র একরার নামার (Deed of Agreement) সহিত "বরেন্দ্র গভীর নলকুপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন" (Barind deep tubewell water user`s association) এর সদস্যগণের প্রকল্পভুক্ত জমির বিবরণ সমুহে "ক ফরম" এ, সমিতির সাধারণ সভার এক প্রস্থ কার্য বিবরণী "খ ফরম" এবং উপবিধি সংযুক্ত রহিল 'গ' ফরমে উল্লেখিত গভীর নলকুপ পরিচালনা পদ্ধতি সমূহের যে কোন একটি জোন চালাতে কৃষকবৃন্দ বাধ্য থাকবে। এই গুলি, এই একরার (Deed of Agreement) অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

উপরোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে আমরা ২য় পক্ষ "..[illegible]....... বরেন্দ্র নলকুপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন" (Barind deep tubewell water user`s association) এর পক্ষ হতে উক্ত এসোসিয়েশন নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে এবং অত্র একরার নামা (Deed of Agreement) এ স্বাক্ষর করা হলো।

১ম পক্ষ ঃ প্রতিনিধি

বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

রাজশাহী

স্বাক্ষর ....

২য় পক্ষ

ক্রমিক নং	কৃষকের নাম	স্বাক্ষর	পদবী	স্কীম ভুক্ত জমির পরিমাণ (একর)
১)	মোঃ আঃ গনি	আঃ গনি	সভাপতি	২৫.০০
২)	মোঃ [illegible] ইসলাম	[illegible]	সহ সভাপতি	৬.০০
৩)	মোঃ [illegible]	[illegible]	[illegible]	৮.০০

স্বাক্ষী ঃ

১) ....

২) ....

৩) ....

"খ" ফরম

সাধারণ সভার কার্য বিবরণী

[illegible]

প্রস্তাবিত "........ [illegible] .... বরেন্দ্র গভীর নলকুপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন" এর সভার কার্য বিবরণী।

স্থান : [illegible]

সময় : ....১০.০০ ঘটিকা

তারিখ : ২৪/১০/১০ [illegible]

উপস্থিত সদস্যগণের নাম ও স্বাক্ষর বা টিপসহি :

ক্রমিক নং	নাম	স্বাক্ষর/টিপসহি	ক্রমিক নং	নাম	স্বাক্ষর/টিপসহি
২)	[illegible]	[illegible]	২৫)		
৩)	মুনসুর আলী	মুনসুর আলী	২৬)		
৪)	[illegible]	[illegible]	২৭)		
৫)	[illegible]	[illegible]	২৮)		
৬)	[illegible] ইসলাম	[illegible]	২৯)		
৭)	[illegible]	[illegible]	৩০)		
৮)	[illegible] রহমান	[illegible]	৩১)		
৯)	[illegible]	[illegible]	৩২)		
১০)	[illegible]	[illegible]	৩৩)		
১১)	[illegible]	[illegible]	৩৪)		
১২)	[illegible]	[illegible]	৩৫)		
১৩)	[illegible] ইসলাম	[illegible]	৩৬)		
১৪)			৩৭)		
১৫)			৩৮)		
১৬)			৩৯)		
১৭)			৪০)		
১৮)			৪১)		
১৯)			৪২)		
২০)			৪৩)		
২১)			৪৪)		
২২)			৪৫)		
২৩)			৪৬)		

[illegible] [illegible]

৳১০০ ৳১০০

একশত টাকা

প ৮৭৭৫৬৩৪

" গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য জমি হস্তান্তরের অঙ্গীকারনামা"

আমি মোঃ আব্দুল গনি, পিতা ঃ মৃতঃ শমসের আলী, গ্রামঃ হ্যাংগাডোবা, ডাকঘর ঃ দেবনগর, উপজেলা ঃ তেতুলিয়া, জেলা- পঞ্চগড় । আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, আমার নিম্ন তফশীলভূক্ত জমির ৩০ x ৩০ (৯০০ বর্গফুট) জায়গা একটি গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে নিঃশর্তভাবে দান করলাম । ভবিষ্যতে আমি/আমার কোন ওয়ারিশ জমির মালিকানা দাবি করবে না বা করলেও তা আইনতঃ গ্রাহ্য হবে না ।

আমি কাহারো প্ররোচনায় প্ররোচিত না হয়ে সজ্ঞানে ও সুস্থ মস্তিস্কে অত্র অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করলাম ।

জমির তফশীল ঃ

জেলা	ঃ	পঞ্চগড়	উপজেলা	ঃ	তেতুলিয়া
ইউনিয়ন	ঃ	দেবনগর	মৌজা	ঃ	আমজোয়ানী
জেএল নং	ঃ	২৮	দাগ নং	ঃ	৩৩৮১

জমি হস্তান্তরকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ ঃ

নাম ঃ মোঃ আব্দুল গনি
গ্রামঃ হ্যাংগাডোবা পোঃ দেবনগর
উপজেলা ঃ তেতুলিয়া, জেলা ঃ পঞ্চগড় ।

৳৫০ ৳৫০

পঞ্চাশ টাকা

ম ৩৭১৫১৪৩

ঃ পাতা নং- ০২ (দুই) ঃ

স্বাক্ষী স্বাক্ষর ঃ

আতাউর রহমান সরকার মো. লতিফুর রহমান

১। নাম ঃ মোঃ আতাউর রহ

পিতা ঃ মৃত: মহিমুদ্দিন

গ্রাম ঃ হাসনাবাদ

ডাকঘর ঃ

উপজেলা ঃ

জেলা ঃ

২। নাম ঃ মোঃ লতিফুর রহমান

পিতা ঃ মোঃ আব্দুল গনি

গ্রাম ঃ হাসনাবাদ

ডাকঘর ঃ

উপজেলা ঃ

জেলা ঃ
