



সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড SYLHET GAS FIELDS LIMITED

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

প্রতিবেদনকাল

মার্চ ২০২৫



মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন
MONTHLY MIS REPORT

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

মার্চ ২০২৫

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১)	উৎপাদন পরিসংখ্যান (ফিল্ড/স্থাপনা ভিত্তিক)	১
২)	কোম্পানির সামগ্রিক উৎপাদন পরিসংখ্যান	২
৩)	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণী	৩
৪)	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণী	৪
৫)	বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের আয়/ব্যয়ের তারতম্য বিশ্লেষণ	৫
৬)	আয়-ব্যয় বিবরণী	৬-৭
৭)	বিক্রয় বিবরণী (গ্যাস)	৮
৮)	বিক্রয় বিবরণী (উপজাত তেল)	৯
৯)	গ্রাহকওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণী	১০
১০)	প্রদেয় ভ্যাট এর বিবরণী	১১
১১)	সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা বিবরণী	১২
১২)	মাসের মজুদ বিবরণী	১৩
১৩)	নগদ তহবিল বিবরণী	১৪
১৪)	আয়-ব্যয় এবং বকেয়া পাওনার বিশ্লেষণ বিবরণী	১৫
১৫)	মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী	১৬
১৬)	বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী	১৭
১৭)	কোম্পানির উৎপাদন ও বিক্রয়ের তুলনামূলক চিত্র	১৮-১৯
১৮)	কোম্পানির চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ও চিত্র	২০-২৯
১৯)	উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট	৩০
২০)	জনবলের পরিসংখ্যান	৩১

প্রতিবেদন মাস : মার্চ ২০২৫

গ্যাস : এম এম এস সি এম (১ কিউমি = ৩৫.৩৪৭ কিউ ফুট), পানি ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : লিটার, (১৫৮.৯৮৭৩ লিটার = ১ ব্যারেল)

[illegible]

০২-০৬-২০২৪ তারিখ সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় কৈলাশটিলা এলাপাঞ্জি প্রান্ট চ
কৈলাশটিলা-৮নং কুপের উৎপাদন ২৪-০৭-২০২৪ তারিখ হতে শুরু হয়েছে।

গালু করার পূর্বে ০১ জুন ২০২৪ তারিখ সকাল ৮:০০ ঘটিকায় এলাপিজি ও সুপার লাইট কনডেনসেট মজুদ ছিল যথাক্রমে ৩৪১৬ ও ৯৬৮৪ লিটার।

11 

কোম্পানির সামগ্রিক উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন মাস : মার্চ ২০২৫

গ্যাস : এম এম এস সি এম, পানি ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : লিটার										
গ্যাস ক্ষেত্র স্থাপনা	বিদ্যমান কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উপাদান	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বক্সের লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪-২০২৫)	বিগত মাস (ফেব্রুয়ারি ২০২৫)	চলতি মাস (মার্চ ২০২৫)	বিগত বক্সের মোট (২০২৩-২০২৪)	চলতি বক্সের ক্রমপুঞ্জিত (২০২৪-২০২৫)	ক্রমপুঞ্জিত শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত
সিলেট, কৈলাশিলা, এমএসটিই প্রান্ট অপারেশন, রশিদপুর, বিয়ানীবাজার, ছাতক, রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্রান্ট, ৪০০০ বিপিডি কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্রান্ট, ৩০০০ বিপিডি ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট ও কৈলাশিলা এলপিগিজ প্রান্ট	২৫ টি	১৫ টি	গ্যাস	৩.৭৩২৯	৭৬৪.৯৬৮৮	৬৮৮.৬০১	৭৬৮.৬০১	৩০৬.৯৬৮৮	৭৬৮.৬০১	৩০৬.৯৬৮৮
			পানি	--	--	০৪২.৯১০.০১	৭৬৮.৬০১	৭৬৮.৬০১	৭৬৮.৬০১	৭৬৮.৬০১
			অপ: তৈল	--	--	--	--	--	--	--
			অকটেন	-	৬৯০.৭০০.৬৬	৬৯০.৭০০.৬৬	৬৯০.৭০০.৬৬	৬৯০.৭০০.৬৬	৬৯০.৭০০.৬৬	৬৯০.৭০০.৬৬
			মটর স্পিরিট RON 81	৬১২.৮৪৩.০০০	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২
			ডিজেল	২৬৮.৬০০.০০০	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২
			কেরোসিন	৪০.৭০২.০০০	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২
			কনডেনসেট	৮৬.০৬৫	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২
			এনজিএল	৬০.১৩০	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২
			মটর স্পিরিট RON 89	-	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২
			লাইট ন্যাক্সা	১৬৬.৬৬৮	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২
			রিফরমেট	৩২২.৭৪৪	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২
			সুপার লাইট কনডেনসেট	৬৬.১৮৭	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২
			এলপিগিজ	৮১.০৮০.০০০	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২	৭৬৮.৬০১.০২

-২-

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণী

প্রতিবেদন মাস : মার্চ ২০২৫

গ্যাস : এমএনএসপিএম, পেট্রোলিয়াম পণ্যাদি : লিটার									
ক্রমিক	উপাদান	চলতি মাস (মার্চ ২০২৫)	বিগত মাস (ফেব্রুয়ারি ২০২৫)	বেশী/ কম শতকরা হার (৩ - ৪)	বিগত বৎসরের মার্চ ২০২৪ মাস	বেশী / কম শতকরা হার (৩ - ৬)	মন্তব্য		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮		
ক)	গ্যাস	১১৬.৬৭১	১০৭.৫৫৭	৯.১৩১ ৮.৪৯%	১০৩.২৬৯	১৩.৪১৯ ১২.৯৯%	দিনের সংখ্যা বেশী থাকায় বিগত মাস অপেক্ষা তুলনামূলক গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।		
খ)	কনডেনসেট	২৬১.১৬১	২৬১.৭২৪	২৪৩.৯৬৯ ৯.৩২%	৩৪২.৯১১	-৫৬.৭৯৩৮ -১৬.৫৬%	চলতি মাসে দিনের সংখ্যা বেশী হওয়ায় কনডেনসেট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।		
গ)	এনজিএল	১,৭৭৮.০০০	১,৬৪০.০০০	১৪৯.০০০ ৯.০৯%	-	১,৭৮৯.০০০	চলতি মাসে দিনের সংখ্যা বেশী হওয়ায় এনজিএল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।		
ঘ)	মটর স্পিরিট RON 81	২০৪.৪৬৮	১৯.০১৭.৩২২	১৪৭৯.৪৫৭ ৭.৭৮%	১৮.২২০.৩৮৭	২.২৭৬.৩৯৩ ১২.৪৯%	দিনের সংখ্যা বেশী হওয়ায় মটর স্পিরিট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।		
ঙ)	ডিজেল	৭১৩.১৮৭	৮৪০.১৬১	৭৩.৭০৭ ৮.৭৭%	৬৪৯.৭৩০	২৬৪.১৩৮ ৪০.৬৫%	কনডেনসেটের স্পেসিফিকেশন পরিবর্তন হওয়ায় ডিজেল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।		
চ)	কেরোসিন	৯৬৯.৮৬৬	৯৮১.৬৮৯	-১৩.২৬৩ -১.৩৫%	১.২৮০.০৬৩	-৩১১.৬৩৭ -২৪.৩৫%	কনডেনসেটের স্পেসিফিকেশন পরিবর্তন হওয়ায় কেরোসিন উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।		
ছ)	মটর স্পিরিট RON 89	১৪.৩৮০	১১.৩০২.০১৩	৩.০৮২.০২৫ ২৭.২৭%	৯.১২৯.০৬৩	৫.২৫৪.৯৭৫ ৫৭.৫৬%	ব্রেন্ডিং বেশি করায় মটরস্পিরিট (RON 89) উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।		
জ)	অকটেন	৪,৮২৬.৮০৮	৬,০৬৮.০৯৭	(১,৬৪১,২৯০.০০) -২৭.০৫%	-		ব্রেন্ডিং কম করায় অকটেন উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।		
ঝ)	লাইট ন্যাফথা	৮৭৬.৪২৮	৪,২৫৭.৬৭০	৩৭.১১১ ৪.৭৭%	১.৩৬৫.০৭২	২.৯২৯.৭১৬ ২১৪.৬২%	দিনের সংখ্যা বেশী হওয়ায় লাইট ন্যাফথা এবং রিফরমেট উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে।		
ঞ)	রিফরমেট	৮,৬৬৮.৮৮৮	৮,৫৬৬.৬৮৮	৩১১.১৮৮ ৩.৬৪%	২.৮৩৫.৮৯৭	৬,০৪১.৮৫৫ ২১৩.০৫%			
ট)	এলপিগিজ	৭৫৩.৩৮৮	৭৭৫.৯৪৭	(১৬,৬০১.০০) -২.১৪%	২৪.৭৯৯	৭৩৪.৫৪০ ২৯৩১.৯৭%	চলতি মাসে ৩০০০ বিপিডি সিআরইউ প্লান্টে এলপিগিজ উৎপাদন না হওয়ার কারনে এলপিগিজ উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।		
ঠ)	সুপার লাইট কনডেনসেট	১,০৩৩.৯১১	৮৭৭.০২০	১৫৬.৮৯৯ ১৭.৮৯%	০		চলতি মাসে দিনের সংখ্যা বেশী হওয়ায় সুপার লাইট কনডেনসেট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।		

Signature

-৩-

Signature

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণী

প্রতিবেদন মাসঃ মার্চ ২০২৫

গ্যাস : এমএমএসপিএম, পেট্রোলিয়াম পণ্যাদি : লিটার						
ক্রমিক	বিক্রয়	চলতি মাস (মার্চ ২০২৫)	বিগত মাস (ফেব্রুয়ারি ২০২৫)	বেশী/ কম শতকরা হার (৩ - ৪)	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	
ক)	গ্যাস	১১৫.২৯০	১০৬.৩২০	৮.৯৭০ ৮.৪৪%	চলতি মাসে বিগত মাসের তুলনায় গ্যাস উৎপাদন বেশী হওয়ায় বিক্রয় বেশী হয়েছে।	
খ)	কনডেনসেট	১.৭৮২.০০০	১.৭১৪.৫০০	৬৭.৫০০ ৩.৯৪%	চলতি মাসে চাহিদা বেশী থাকায় কনডেনসেট বিক্রয় গত মাসের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।	
গ)	মটর স্পিরিট RON 89	১৩.৩১৫.২১০	১২.০১৭.১৭০	১,২৯৮.০৪০ ১০.৮০%	গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে চাহিদা বেশী থাকায় মটরস্পিরিট বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।	
ঘ)	ডিজেল	১.৩১৮.৩০০	৭১০.৮৯০	৬০৭.৪১০ ৮৫.৪৪%	গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে ডিজেলের চাহিদা বেশী থাকায় বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।	
ঙ)	কেরোসিন	১.১৫৫.৭৭০	৮৮৫.৯৩০	২৬৯.৮৪০ ৩০.৪৬%	গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে কেরোসিনের চাহিদা বেশী থাকায় বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।	
চ)	অকটেন	৪.৭০০.০৪০	৬.৪৩৩.৫০০	-১৭৩৩.৪৬০ -২৬.৯৪%	চাহিদা কম থাকায় গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে অকটেন বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।	
ছ)	এলপিগিজ	৮৩৭.৭৯০	৭৫১.৯৯০	৮৫৫০০.০০ ১১.৪১%	চলতি মাসে এলপিগিজ বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।	

Handwritten signature

Handwritten signature

বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের আয়/ব্যয়ের তারতম্য বিশ্লেষণ

প্রতিবেদনকালীন মাসঃ মার্চ ২০২৫

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস	চলতি মাস	হাস/বৃদ্ধি	হাস/বৃদ্ধি
		ফেব্রুয়ারি ২০২৫	মার্চ ২০২৫		
১	গ্যাস বিক্রয়	৩৩.৯৬	৩৬.৮৩	২.৮৭	গ্যাস বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
২	উপজাত তেল বিক্রয়	১৮২.০৯	১৮৫.৬৫	৩.৫৫	উপজাত তেল বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩	অপরিশোধিত তেল বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	অপরিশোধিত তেল বিক্রয় অপরিবর্তিত আছে
৪	ভ্যাট				
	গ্যাস	২৩.৩৪	২৫.৩১	১.৯৭	ভ্যাট বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫	উপজাত তেল	২৪.২৩	২৪.৫৭	০.৩৪	ভ্যাট বৃদ্ধি পেয়েছে।
	অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয়	৯৫.৪৩	১০১.১১	৫.৬৮	ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬	আয়কর পূর্ব নীট মুনাফা	৭৫.৯৯	৭৪.৫১	-১.৪৮	মুনাফা হ্রাস পেয়েছে।
৭	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা	৫৩.৯০	৭২.৮৫	১৮.৯৬	জমা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮	বকেয়া পাওনা আদায়	৩৮৭.২৮	১৫৭.৮৮	-২২৯.৪০	আদায় হ্রাস পেয়েছে।



—৫—



আয় - ব্যয় বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : মার্চ ২০২৫

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস প্রকৃত	ফেব্রুয়ারি ২০২৫ বাজেট	চলতি মাস প্রকৃত	মার্চ ২০২৫ বাজেট	বিগত বৎসরের মোট (২০২৩-২০২৪) প্রকৃত	বাজেট	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জীভূত প্রকৃত	বাজেট
ক) বিক্রয়									
১	গ্যাস	৩৩.৯৬	৩০.২২	৩৬.৮৩	৩০.২২	৩১১.৫৫	৩০৮.৯০	৩১৯.৯৯	২৭১.৯৭
২	অকটেন	৫৯.৩৬	৪৬.৬৮	৪৩.৩৬	৭৬.৬৪	৬৬৫.৫৯	৬৫১.৭৩	৫৩২.১২	৫৩২.১২
২	মটর স্পিরিট	১০২.৪৬	৬১.১৭	১১৩.৫৩	৬১.১৭	১২৫১.২২	৮৪৭৮.৯৫	৯৪৯.৪৪	৮৪৭৮.৯৫
৩	ডিজেল	৫.৭২	০.৭৮	১০.৬১	০.৭৮	৮৭.২৮	৭০.১২	৫৯.৪৩	৫৯.৪৩
৪	কেরোসিন	৭.২২	৮.৩৭	৯.৪২	৮.৩৭	১৫৭.৭৭	১০৩.৩৯	৭৭.৯৭	৭৭.৯৭
৫	কনডেনসেট	৭.৩৪	৮.৩৮	৮.৭৭	৮.৩৮	৫৭.২৮	৭৫.১৬	৫৩.৫০	৫৩.৫০
৬	এন জি এল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭১.০০	৭১.০০	০.০০	০.০০
৭	এল পি জি	০.৪৪	০.১৯	০.৪৪	০.১৯	৩৬.০০	৩৬.০০	৩৬.০০	৩৬.০০
৮	মজুদ সমন্বয়		০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট ১ হতে ৭ পর্যন্ত		২১৬.৪৯	১৭৬.৬৭	২২২.৯২	১৭৬.৬৭	৪৩৮.৭৫	২২৯০.২৬	১৯৯৬.০২	১৯৯৬.০২
খ) ব্যয়									
১। সম্পূরক কর ও ভ্যাট									
i	গ্যাস	২৩.৩৪	২১.২২	২৫.৩১	২২.২২	২১৭.৩৯	২১৩.৭০	২১৯.৮৯	১৯০.৯৭
i	অকটেন	৭.৭৪	১০.০১	৫.৬৬	১০.০১	২৭.৬৭	১১৫.০১	৬৯.৪১	৬৯.৪১
ii	মটর স্পিরিট	১৩.৩৬	৭.৯৮	১৪.৮১	১০.০১	১৬৩.৩১	১১০.৭৩	১২৩.৮১	৭১.৮১
iii	ডিজেল	০.৭৫	০.৭৬	১.৩৭	০.৭৬	৯.৭৬	৯.২৮	৭.৭৫	৭.৭৫
iv	কেরোসিন	০.৯৪	১.০৯	১.২৩	০.৭৬	২০.০২	১৩.৪৯	১০.১৭	৯.৭৩
v	কনডেনসেট	১.৪৪	০.৫৭	১.৫০	০.৫৭	৪০.৩১	৯.০৭	৯.৪৭	৯.৪৭
vi	এন জি এল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০২	০.০২	০.০০	০.০০
vii	এল পি জি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট সম্পূরক কর ও ভ্যাট		৪৭.৫৭	৪১.৬২	৪৯.৮৯	৪১.৬২	৫১১.৭৯	৪৭১.৯৯	৪৪০.৫৪	৩৭৪.৫৪

[Signature]

— ১৬ —

[Signature]

আয় - ব্যয় বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : মার্চ ২০২৫

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস		ফেব্রুয়ারি ২০২৫		চলতি মাস		মার্চ ২০২৫		বিগত বছরের মোট (২০২৩-২০২৪)		চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জীভূত	
		প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট
ক) বিক্রয়													
১	গ্যাস	৩৩.৯৬	৩০.২২	৩৬.৮৩	৩০.২২	৩৬.৮৩	৩০.২২	৩১৯.৯৯	৩১৯.৯৯	২৭১.৯৭	২৭১.৯৭		
২	অকটেন	৫৯.৩৬	৪৬.৬৮	৩৩.৩৬	৪৬.৬৮	৩৩.৩৬	৪৬.৬৮	৫৩২.১২	৫৩২.১২	৬৮৯.৮০	৬৮৯.৮০		
২	মটর স্পিরিট	১০২.৪৬	৬১.১৭	১১৩.৫৩	৬১.১৭	১১৩.৫৩	৬১.১৭	৯৪৯.৪৪	৯৪৯.৪৪	৫৫০.৫০	৫৫০.৫০		
৩	ডিজেল	৫.৭২	০.৭৮	১০.০১	০.৭৮	১০.০১	০.৭৮	৫৯.৪৩	৫৯.৪৩	৫২.২৪	৫২.২৪		
৪	কেরোসিন	৭.২২	৬.৩৮	৯.৪৭	৬.৩৮	৯.৪৭	৬.৩৮	৭৭.৯৩	৭৭.৯৩	৭৫.৩৩	৭৫.৩৩		
৫	কনডেনসেট	৭.৩৪	৪.৩৯	৮.৬৭	৪.৩৯	৮.৬৭	৪.৩৯	৫৩.৫৫	৫৩.৫৫	৩৯.৪৭	৩৯.৪৭		
৬	এন জি এল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৭	এল পি জি	০.৪৪	০.১৯	৪.৪০	০.১৯	৪.৪০	০.১৯	৩.৫৫	৩.৫৫	১.৬৯	১.৬৯		
৮	মজুদ সমন্বয়		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০				
মোট ১ হতে ৭ পর্যন্ত		২১৬.৪৯	৭৬.৬৭	২২২.৯২	৭৬.৬৭	২২২.৯২	৭৬.৬৭	৪৩৭.৭২	৪৩৭.৭২	১৬৭.১১	১৬৭.১১		
খ) ব্যয়													
১। সম্পূরক কর ও ভ্যাট													
i	গ্যাস	২৩.৩৪	২১.২২	২৫.৩২	২১.২২	২৫.৩২	২১.২২	২১৯.৭৯	২১৯.৭৯	১৯০.৯৭	১৯০.৯৭		
i	অকটেন	৭.৭৪	১০.০০	৫.৬৬	১০.০০	৫.৬৬	১০.০০	৬৯.৪১	৬৯.৪১	৮৯.৯৭	৮৯.৯৭		
ii	মটর স্পিরিট	১৩.৩৬	৭.৭৭	১৫.৪৪	৭.৭৭	১৫.৪৪	৭.৭৭	১২৩.২২	১২৩.২২	৭১.৮০	৭১.৮০		
iii	ডিজেল	০.৭৫	০.৭৬	১.৩১	০.৭৬	১.৩১	০.৭৬	৭.৭৭	৭.৭৭	৬.৭৭	৬.৭৭		
iv	কেরোসিন	০.৯৪	১.০০	১.৩১	১.০০	১.৩১	১.০০	১৩.৯৯	১৩.৯৯	৯.৭৭	৯.৭৭		
v	কনডেনসেট	১.৪৪	০.৭৭	০.৫৭	০.৭৭	০.৫৭	০.৭৭	৭.৭৭	৭.৭৭	৫.৭৭	৫.৭৭		
vi	এন জি এল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
vii	এল পি জি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
মোট সম্পূরক কর ও ভ্যাট		৪৭.৫৭	৪১.৬২	৪৯.৮৯	৪১.৬২	৪৯.৮৯	৪১.৬২	৫১১.৭৯	৫১১.৭৯	৩৭৪.৫৪	৩৭৪.৫৪		

[Signature]

— ৭ —

[Signature]

বিক্রয় বিবরণী (গ্যাস)

প্রতিবেদনকালীন মাস : মার্চ ২০২৫

পরিমাণ : এম এম সি এম, মূল্য : কোটি টাকায়

	তিতাস		জালালাবাদ		বাখরাবাদ		কর্ণফুলি		পশ্চিমাঞ্চল		মোট গ্যাস বিক্রয়	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১। চলতি মাস : মার্চ ২০২৫												
বাজেট	০.০০	০.০০			১১.৫৭	৩.৬৬	০০.০	০০.০	২২.৯২	৭.৬৯	৯০.০০	৩০.২২
প্রকৃত	০.০০	০.০০	৪৬.৬৫	১৮.৬১	৩৯.৪৭	১২.৩১	-	-	১৮.৭১	৫.৬২	১১৫.২৯	৩৬.৬৩
২। বিগত মাস : ফেব্রুয়ারি ২০২৫												
বাজেট	০.০০	০.০০			১১.৫৭	৩.৬৬	০০.০	০০.০	২২.৯২	৭.৬৯	৯০.০০	৩০.২২
প্রকৃত	০.০০	০.০০	৫৫.৫৫	১৮.৬১	৩৫.৬৬	১১.৩১	-	-	১৮.৭১	৫.৬২	১১৫.২৯	৩৬.৬৩
৩। ক্রমপঞ্জীভূত : চলতি বৎসর ২০২৪-২০২৫												
বাজেট	০.০০	০.০০			১১.৫৭	৩.৬৬	০০.০	০০.০	২২.৯২	৭.৬৯	৯০.০০	৩০.২২
প্রকৃত	০.০০	০.০০	৫৫.৫৫	১৮.৬১	৩৫.৬৬	১১.৩১	-	-	১৮.৭১	৫.৬২	১১৫.২৯	৩৬.৬৩
৪। মোট বিগত বৎসর (২০২৩-২০২৪)												
বাজেট	০.০০	০.০০			১১.৫৭	৩.৬৬	০০.০	০০.০	২২.৯২	৭.৬৯	৯০.০০	৩০.২২
প্রকৃত	০.০০	০.০০	৫৫.৫৫	১৮.৬১	৩৫.৬৬	১১.৩১	-	-	১৮.৭১	৫.৬২	১১৫.২৯	৩৬.৬৩
৫। ক্রমপঞ্জীভূত : আরম্ভকাল হতে												
বাজেট	০.০০	০.০০			১১.৫৭	৩.৬৬	০০.০	০০.০	২২.৯২	৭.৬৯	৯০.০০	৩০.২২
প্রকৃত	০.০০	০.০০	৫৫.৫৫	১৮.৬১	৩৫.৬৬	১১.৩১	-	-	১৮.৭১	৫.৬২	১১৫.২৯	৩৬.৬৩

Signature

— ৮ —

Signature

বিক্রয় বিবরণী (উপজাত তেল)

প্রতিবেদনকালীন মাস : মার্চ ২০২৫

পরিমাণ : হাজার লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০	১০১	১০২	১০৩	১০৪	১০৫	১০৬	১০৭	১০৮	১০৯	১১০	১১১	১১২	১১৩	১১৪	১১৫	১১৬	১১৭	১১৮	১১৯	১২০	১২১	১২২	১২৩	১২৪	১২৫	১২৬	১২৭	১২৮	১২৯	১৩০	১৩১	১৩২	১৩৩	১৩৪	১৩৫	১৩৬	১৩৭	১৩৮	১৩৯	১৪০	১৪১	১৪২	১৪৩	১৪৪	১৪৫	১৪৬	১৪৭	১৪৮	১৪৯	১৫০	১৫১	১৫২	১৫৩	১৫৪	১৫৫	১৫৬	১৫৭	১৫৮	১৫৯	১৬০	১৬১	১৬২	১৬৩	১৬৪	১৬৫	১৬৬	১৬৭	১৬৮	১৬৯	১৭০	১৭১	১৭২	১৭৩	১৭৪	১৭৫	১৭৬	১৭৭	১৭৮	১৭৯	১৮০	১৮১	১৮২	১৮৩	১৮৪	১৮৫	১৮৬	১৮৭	১৮৮	১৮৯	১৯০	১৯১	১৯২	১৯৩	১৯৪	১৯৫	১৯৬	১৯৭	১৯৮	১৯৯	২০০	২০১	২০২	২০৩	২০৪	২০৫	২০৬	২০৭	২০৮	২০৯	২১০	২১১	২১২	২১৩	২১৪	২১৫	২১৬	২১৭	২১৮	২১৯	২২০	২২১	২২২	২২৩	২২৪	২২৫	২২৬	২২৭	২২৮	২২৯	২৩০	২৩১	২৩২	২৩৩	২৩৪	২৩৫	২৩৬	২৩৭	২৩৮	২৩৯	২৪০	২৪১	২৪২	২৪৩	২৪৪	২৪৫	২৪৬	২৪৭	২৪৮	২৪৯	২৫০	২৫১	২৫২	২৫৩	২৫৪	২৫৫	২৫৬	২৫৭	২৫৮	২৫৯	২৬০	২৬১	২৬২	২৬৩	২৬৪	২৬৫	২৬৬	২৬৭	২৬৮	২৬৯	২৭০	২৭১	২৭২	২৭৩	২৭৪	২৭৫	২৭৬	২৭৭	২৭৮	২৭৯	২৮০	২৮১	২৮২	২৮৩	২৮৪	২৮৫	২৮৬	২৮৭	২৮৮	২৮৯	২৯০	২৯১	২৯২	২৯৩	২৯৪	২৯৫	২৯৬	২৯৭	২৯৮	২৯৯	৩০০	৩০১	৩০২	৩০৩	৩০৪	৩০৫	৩০৬	৩০৭	৩০৮	৩০৯	৩১০	৩১১	৩১২	৩১৩	৩১৪	৩১৫	৩১৬	৩১৭	৩১৮	৩১৯	৩২০	৩২১	৩২২	৩২৩	৩২৪	৩২৫	৩২৬	৩২৭	৩২৮	৩২৯	৩৩০	৩৩১	৩৩২	৩৩৩	৩৩৪	৩৩৫	৩৩৬	৩৩৭	৩৩৮	৩৩৯	৩৪০	৩৪১	৩৪২	৩৪৩	৩৪৪	৩৪৫	৩৪৬	৩৪৭	৩৪৮	৩৪৯	৩৫০	৩৫১	৩৫২	৩৫৩	৩৫৪	৩৫৫	৩৫৬	৩৫৭	৩৫৮	৩৫৯	৩৬০	৩৬১	৩৬২	৩৬৩	৩৬৪	৩৬৫	৩৬৬	৩৬৭	৩৬৮	৩৬৯	৩৭০	৩৭১	৩৭২	৩৭৩	৩৭৪	৩৭৫	৩৭৬	৩৭৭	৩৭৮	৩৭৯	৩৮০	৩৮১	৩৮২	৩৮৩	৩৮৪	৩৮৫	৩৮৬	৩৮৭	৩৮৮	৩৮৯	৩৯০	৩৯১	৩৯২	৩৯৩	৩৯৪	৩৯৫	৩৯৬	৩৯৭	৩৯৮	৩৯৯	৪০০	৪০১	৪০২	৪০৩	৪০৪	৪০৫	৪০৬	৪০৭	৪০৮	৪০৯	৪১০	৪১১	৪১২	৪১৩	৪১৪	৪১৫	৪১৬	৪১৭	৪১৮	৪১৯	৪২০	৪২১	৪২২	৪২৩	৪২৪	৪২৫	৪২৬	৪২৭	৪২৮	৪২৯	৪৩০	৪৩১	৪৩২	৪৩৩	৪৩৪	৪৩৫	৪৩৬	৪৩৭	৪৩৮	৪৩৯	৪৪০	৪৪১	৪৪২	৪৪৩	৪৪৪	৪৪৫	৪৪৬	৪৪৭	৪৪৮	৪৪৯	৪৫০	৪৫১	৪৫২	৪৫৩	৪৫৪	৪৫৫	৪৫৬	৪৫৭	৪৫৮	৪৫৯	৪৬০	৪৬১	৪৬২	৪৬৩	৪৬৪	৪৬৫	৪৬৬	৪৬৭	৪৬৮	৪৬৯	৪৭০	৪৭১	৪৭২	৪৭৩	৪৭৪	৪৭৫	৪৭৬	৪৭৭	৪৭৮	৪৭৯	৪৮০	৪৮১	৪৮২	৪৮৩	৪৮৪	৪৮৫	৪৮৬	৪৮৭	৪৮৮	৪৮৯	৪৯০	৪৯১	৪৯২	৪৯৩	৪৯৪	৪৯৫	৪৯৬	৪৯৭	৪৯৮	৪৯৯	৫০০	৫০১	৫০২	৫০৩	৫০৪	৫০৫	৫০৬	৫০৭	৫০৮	৫০৯	৫১০	৫১১	৫১২	৫১৩	৫১৪	৫১৫	৫১৬	৫১৭	৫১৮	৫১৯	৫২০	৫২১	৫২২	৫২৩	৫২৪	৫২৫	৫২৬	৫২৭	৫২৮	৫২৯	৫৩০	৫৩১	৫৩২	৫৩৩	৫৩৪	৫৩৫	৫৩৬	৫৩৭	৫৩৮	৫৩৯	৫৪০	৫৪১	৫৪২	৫৪৩	৫৪৪	৫৪৫	৫৪৬	৫৪৭	৫৪৮	৫৪৯	৫৫০	৫৫১	৫৫২	৫৫৩	৫৫৪	৫৫৫	৫৫৬	৫৫৭	৫৫৮	৫৫৯	৫৬০	৫৬১	৫৬২	৫৬৩	৫৬৪	৫৬৫	৫৬৬	৫৬৭	৫৬৮	৫৬৯	৫৭০	৫৭১	৫৭২	৫৭৩	৫৭৪	৫৭৫	৫৭৬	৫৭৭	৫৭৮	৫৭৯	৫৮০	৫৮১	৫৮২	৫৮৩	৫৮৪	৫৮৫	৫৮৬	৫৮৭	৫৮৮	৫৮৯	৫৯০	৫৯১	৫৯২	৫৯৩	৫৯৪	৫৯৫	৫৯৬	৫৯৭	৫৯৮	৫৯৯	৬০০	৬০১	৬০২	৬০৩	৬০৪	৬০৫	৬০৬	৬০৭	৬০৮	৬০৯	৬১০	৬১১	৬১২	৬১৩	৬১৪	৬১৫	৬১৬	৬১৭	৬১৮	৬১৯	৬২০	৬২১	৬২২	৬২৩	৬২৪	৬২৫	৬২৬	৬২৭	৬২৮	৬২৯	৬৩০	৬৩১	৬৩২	৬৩৩	৬৩৪	৬৩৫	৬৩৬	৬৩৭	৬৩৮	৬৩৯	৬৪০	৬৪১	৬৪২	৬৪৩	৬৪৪	৬৪৫	৬৪৬	৬৪৭	৬৪৮	৬৪৯	৬৫০	৬৫১	৬৫২	৬৫৩	৬৫৪	৬৫৫	৬৫৬	৬৫৭	৬৫৮	৬৫৯	৬৬০	৬৬১	৬৬২	৬৬৩	৬৬৪	৬৬৫	৬৬৬	৬৬৭	৬৬৮	৬৬৯	৬৭০	৬৭১	৬৭২	৬৭৩	৬৭৪	৬৭৫	৬৭৬	৬৭৭	৬৭৮	৬৭৯	৬৮০	৬৮১	৬৮২	৬৮৩	৬৮৪	৬৮৫	৬৮৬	৬৮৭	৬৮৮	৬৮৯	৬৯০	৬৯১	৬৯২	৬৯৩	৬৯৪	৬৯৫	৬৯৬	৬৯৭	৬৯৮	৬৯৯	৭০০	৭০১	৭০২	৭০৩	৭০৪	৭০৫	৭০৬	৭০৭	৭০৮	৭০৯	৭১০	৭১১	৭১২	৭১৩	৭১৪	৭১৫	৭১৬	৭১৭	৭১৮	৭১৯	৭২০	৭২১	৭২২	৭২৩	৭২৪	৭২৫	৭২৬	৭২৭	৭২৮	৭২৯	৭৩০	৭৩১	৭৩২	৭৩৩	৭৩৪	৭৩৫	৭৩৬	৭৩৭	৭৩৮	৭৩৯	৭৪০	৭৪১	৭৪২	৭৪৩	৭৪৪	৭৪৫	৭৪৬	৭৪৭	৭৪৮	৭৪৯	৭৫০	৭৫১	৭৫২	৭৫৩	৭৫৪	৭৫৫	৭৫৬	৭৫৭	৭৫৮	৭৫৯	৭৬০	৭৬১	৭৬২	৭৬৩	৭৬৪	৭৬৫	৭৬৬	৭৬৭	৭৬৮	৭৬৯	৭৭০	৭৭১	৭৭২	৭৭৩	৭৭৪	৭৭৫	৭৭৬	৭৭৭	৭৭৮	৭৭৯	৭৮০	৭৮১	৭৮২	৭৮৩	৭৮৪	৭৮৫	৭৮৬	৭৮৭	৭৮৮	৭৮৯	৭৯০	৭৯১	৭৯২	৭৯৩	৭৯৪	৭৯৫	৭৯৬	৭৯৭	৭৯৮	৭৯৯	৮০০	৮০১	৮০২	৮০৩	৮০৪	৮০৫	৮০৬	৮০৭	৮০৮	৮০৯	৮১০	৮১১	৮১২	৮১৩	৮১৪	৮১৫	৮১৬	৮১৭	৮১৮	৮১৯	৮২০	৮২১	৮২২	৮২৩	৮২৪	৮২৫	৮২৬	৮২৭	৮২৮	৮২৯	৮৩০	৮৩১	৮৩২	৮৩৩	৮৩৪	৮৩৫	৮৩৬	৮৩৭	৮৩৮	৮৩৯	৮৪০	৮৪১	৮৪২	৮৪৩	৮৪৪	৮৪৫	৮৪৬	৮৪৭	৮৪৮	৮৪৯	৮৫০	৮৫১	৮৫২	৮৫৩	৮৫৪	৮৫৫	৮৫৬	৮৫৭	৮৫৮	৮৫৯	৮৬০	৮৬১	৮৬২	৮৬৩	৮৬৪	৮৬৫	৮৬৬	৮৬৭	৮৬৮	৮৬৯	৮৭০	৮৭১	৮৭২	৮৭৩	৮৭৪	৮৭৫	৮৭৬	৮৭৭	৮৭৮	৮৭৯	৮৮০	৮৮১	৮৮২	৮৮৩	৮৮৪	৮৮৫	৮৮৬	৮৮৭	৮৮৮	৮৮৯	৮৯০	৮৯১	৮৯২	৮৯৩	৮৯৪	৮৯৫	৮৯৬	৮৯৭	৮৯৮	৮৯৯	৯০
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

গ্রাহক ওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : মার্চ ২০২৫

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	কোম্পানী ও গ্রাহক খাত	বিক্রয় মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া	চলতি মাস		চলতি মাসের শেষ তারিখে বকেয়া পাওনা	চলতি বৎসর (২০২৪-২০২৫) ক্রমপুঞ্জীভূত			বকেয়া কত মাসের গড় বিক্রয়	বকেয়া পাওনা কাল	বকেয়া আদায় কাল
			বিক্রয়	আদায়		বিক্রয়	আদায়	পর্যন্ত বকেয়া			
১	তিতাস	৪৩০-০	০০০	০০০	৪৩০-০	০০০	০০০	০০০	০০০	৪৩০-০	২০২৪-২০২৫
২	জালালাবাদ	১৩৯৬.৬১	১৮.৮১	৯৬.৬১	১৫৬.৯১	১৫৮.১১	১১৬.৬৬	৪১৪	৩.০০	২৯৬.৬২	১১৬.৬৬
৩	বাখরাবাদ	১৬৫.৬১	১২.৩৩	২০.০০	১৫৬.৯১	১০০.১১	৩৪.০৫	৭৬.৩৬	৩.০০	২৭৬.০১	৩৪.০৫
৪	কর্ণফুলি	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	২.০০	০০০	০০০
৫	পশ্চিমাঞ্চল	৪০০	২৬.৭০	৩৬.৩০	২৬.৬৬	৪৪.১৫	৩২.৩০	৩১.৮১	৩.০০	৪৩.৬৭	৩২.৫১
৬	আরপিভিসিএল	৪০০	০০০	০০০	৪০০	০০০	০০০	০০০	০০০	৪০০	০০০
৭	বিপিসি	৬৩০	৬৬.৩৬	৬৬.৩৬	৬৬.৩৬	৬৬.৩৬	০০০	০০০	০০০	৬৩০	০০০
৮	পদ্মা	৪১৪.৩৬	৪১.৪৩	৪১.৪৩	৪১.৪৩	৪১.৪৩	৪১.৪৩	৪১.৪৩	৪১.৪৩	৪১৪.৩৬	৪১৪.৩৬
৯	মেঘনা	৬৩০	৬৩.০৬	৬৩.০৬	৬৩.০৬	৬৩.০৬	৬৩.০৬	৬৩.০৬	৬৩.০৬	৬৩০	৬৩০
১০	যমুনা	২১৫.৮২	৮৬.৯৪	৮৬.৯৪	৮৬.৯৪	৮৬.৯৪	৮৬.৯৪	৮৬.৯৪	৮৬.৯৪	২১৫.৮২	২১৫.৮২
১১	উপমোটি (তেল কোথ)	৪৬.০০৬	০.৬৬৬৬	০.৬৬৬৬	৪৬.০০৬	৪৬.০০৬	৪৬.০০৬	৪৬.০০৬	৪৬.০০৬	৪৬.০০৬	৪৬.০০৬
১২	অন্যান্য (সুপার)	৬৬.১৩	৬.৬৬	৬.৬৬	৬৬.১৩	৬৬.১৩	৬৬.১৩	৬৬.১৩	৬৬.১৩	৬৬.১৩	৬৬.১৩
১৩	এলসি গ্যাস লিঃ	২৫২	৪৪.০	৪৪.০	৪৪.০	৪৪.০	৪৪.০	৪৪.০	৪৪.০	৪৪.০	৪৪.০
১৪	মোট	১১৬৫.৫৫	২২২২	২২২২	১১৬৫.৫৫	১১৬৫.৫৫	১১৬৫.৫৫	১১৬৫.৫৫	১১৬৫.৫৫	১১৬৫.৫৫	১১৬৫.৫৫

[Signature]

— ০২ —

[Signature]

প্রদেয় ভ্যাট এর বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : মার্চ ২০২৫

(কোটি টাকায়)

এজেন্সীর নাম	চলতি মাস মার্চ ২০২৫		চলতি মাসের শেষ তারিখে ক্রমপঞ্জিভূত দেয় অংক	উদ্ধৃতি কাল (এজিং)			চলতি বছরের ক্রমপঞ্জিভূত পরিশোধিত অংক ২০২৪-২০২৫	বিগত বছরের ৩০শে জুন দেয় অংক ২০২৩-২০২৪
	দেয়	পরিশোধিত		জানুয়ারি ২০২৫	ফেব্রুয়ারি ২০২৫	মার্চ ২০২৫		
হরিপুর ফিল্ড	২.৩২	২.৭৬	৫.৬৩	২.৪৬	২.২৪	২.৩২	১৩.০১	১৩.৭১
কৈলাশটিলা	০০.০	০০.০	২০.০২	০০.০	০০.০	০.০০	০.১০	০.১৩
এমএসটিই	২৩.২১	০৪.৭	২০.০১১	০৭.১১	১১.২৬	১২.৩২	৭১.৮৭	১১৫.০৬
রশিদপুর	৪৪.৭	৬৪.১১	২৩.৭৬	৩৭.৭	৩৬.৭	৪৪.৭	১২৪.৪১	৫৫.৯৯
বিয়ানী বাজার	৪৮.৩	৪.২২	৬৫.৬	৩.২৬	৩.৬৪	৩.৭৬	৩৬.৩৪	৪৬.৬৫
আরসিএফপি	৭২.৬	৬২.০	৬৭.৫৫	০৫.৯	৪৬.৭	৭২.৬	৬৭.০	৮৭.৭৩
৪০০০ বিপিডি	১৬.৭১	২২.৫২	৬৯.৩২	১৭.৪৩	১৫.০৫	১৬.৭৯	১৭১.০১	১৯২.৫২
মোট	১১৬.২১	৫০.৬৬	১১৫.৩৩	৫৩.৩০	৪৭.৫৭	৫৭.৮৯	৪০৯.৯৩	৫১১.৭৯

(Signature)

— ২২ —

(Signature)

সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : মার্চ ২০২৫

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণী	বিগত মাস ফেব্রুয়ারি ২০২৫	চলতি মাস মার্চ ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট ২০২৩-২০২৪	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত	প্রারম্ভ হতে ক্রমপুঞ্জিত
ক) প্রকৃত প্রদান ভিত্তিক :						
১	ভাট	৫৩.৯০	৫০.৬৬	৪৯০.৫৫	৪০৯.৯৩	১০৯৭৩.৫১
২	আয়কর	০.০০	৮.০৫	০০.৮	২৩.৪২	১৮৭৩.৫৯
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০.০০	১১.০০	৩৪.৬৩	০০.০০	২০৪১.৯৮
৪	কাষ্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০.৩৭
৫	ডি এস এল	০.০০	৩.১৪	৫৭.৫৬	৬.২৯	৭১৯.৫৫
৬	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৩৫
মোট প্রদান		৫৩.৯০	৭২.৮৫	৫৯০.৫৫	৪৫০.৬৩	১৫৬১৯.৩৫

খ) গ্র্যাকুয়াল (প্রাধিনাল ভিত্তিক)

১	ভাট	৪৭.৫৭	৪৯.৮৯	৫১১.৭৯	৪৪০.৫৪	১০৯৪৮.৩৪
২	আয়কর	২২.৮০	২২.৩৫	২৪৩.৬৪	২০০.৪২	৩০০৮.৩০
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	৬.২৫	৬.২৫	৭৫.৪২	৫৬.২৫	১৭৫৮.৯০
৪	কাষ্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০.৩৭
৫	ডি এস এল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪৪৫.৮৩
৬	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৩৫
মোট		৭৬.৬২	৭৮.৮৫	৬৭০.০৬	৬৯৭.২৩	১৬২৪৭.৭৯



—২২—



মাসের মজুদ বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : মার্চ ২০২৫

পরিমাণ : হাজার লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়

ক্রমিক ক.নং	বিবরণ	চলতি মাসের শেষ তারিখ ৩১-০৩-২০২৫										বিকৃত মাসের শেষ তারিখ ২৮-০২-২০২৫										বিকৃত মাসের শেষ তারিখ ৩০-০৬-২০২৪										মোট																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		হরিপুর কোটিএল	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০		০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০

১৫

১৫

১৫

নগদ তহবিল বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : মার্চ ২০২৫

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	ক্যাশ ব্যালান্স	ব্যাংক ব্যালান্স				মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালান্স
			চলতি হিসাব	স্বল্প মেয়াদী হিসাব	দীর্ঘ মেয়াদী হিসাব	মোট ব্যাংক ব্যালান্স	
১	চলতি মাসের শেষ তারিখ ৩১-০৩-২০২৫	০.০০৪	১.৮৬৫	৩৯০.৪৫২	৭৯৯.৬৬৭	১১৯১.৯৮৩	১১৯১.৯৮৭
২	বিগত মাসের শেষ তারিখ ২৮-২০-২০২৫	০.০০৩	২.৫২৬	২৭৭.০৭৪	৬৯৯.৬৬৬	১২৮৩.৩০৮	১২৮৩.৩০৭
৩	বিগত বছরের শেষ তারিখ ৩০-০৬-২০২৪	০.০০৫	০.৬২২	১৭৪.৩	১৩৯২.৭৯৩	১৪৬৭.৭০৮	১৪৬৭.৭১৩





বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের গ্যাস ও উপজাত তেল বিক্রয়

আয়-ব্যয় এবং বকেয়া পাওনার বিশ্লেষণ বিবরণী

ক্রমিক নং	মাস	গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ (এম এম সি এম)	উপজাত তেল বিক্রয়ের পরিমাণ (হাজার লিটার)	আয় (কোটি টাকায়)	ব্যয় (এসডি ভ্যাটসহ) (কোটি টাকায়)	বকেয়া পাওনা (কোটি টাকায়)
১	চলতি মাস মার্চ ২০২৫	১১৫.২৯	২৩,১০৯.১১	২২২.৪৮	১৫০.৯৯	১২৩০.৪৭
২	বিগত মাস ফেব্রুয়ারি ২০২৫	১০৬.৩২	২২,৫১৩.৯৮	২১৬.০৫	১৪৩.০০	১১৬৫.৫৫
৩	কম/বেশী (বিগত মাস হতে চলতি মাস)					
ক)	পরিমাণ	৮.৯৭	৫৯৫.১৪	৬.৪৩	৭.৯৯	৬৪.৯৩
খ)	পরিমাণ হ্রাস / বৃদ্ধির শতকরা হার (%)	৮.৪৪%	২.৬৪%	২.৯৭%	৫.৫৯%	৫.৫৭%
৪	বিগত বছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪	৯৪.৫৬	২০০৯৬.৩৪	২০৪.৪৫	১৪০.১১	১১৬৩.৪৭
৫	কম/বেশী (বিগত বৎসরের চলতি মাস হতে চলতি বৎসরের চলতি মাস)					
ক)	পরিমাণ	২০.৭৩	৩০১২.৭৭	৩০.৭১	১৭.০১	৬৭.০০
খ)	পরিমাণ হ্রাস / বৃদ্ধির শতকরা হার (%)	২১.৯২%	১৪.৯৯%	৮.৭২%	৭.৭৭%	৫.৭৬%

[Signature]

[Signature]

মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ বৎসরের বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ: এমএমসিএম, মূল্য: মিলিয়ন টাকায়

মাস	তিতাস		জালানাবাদ		বাখরাবাদ		কর্ণফুলী		পশ্চিমাঞ্চল		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
জুলাই ২৪	০.০০	০.০০	৪৫.৫৩	১১৭.২৬	৩৭.৫২	১১৭.২৬	০.০০	০.০০	৪৫.৫৩	৫৭.১৬	১০১	৩২২.৬৭
আগস্ট ২৪	০.০০	০.০০	৫২.৬৭	১১৭.৫৩	৩৮.৩১	১১৭.৫৩	০.০০	০.০০	৪৫.৫৩	৫৭.১৬	১০১	৩৪৮.৪৩
সেপ্টেম্বর ২৪	০.০০	০.০০	৫১.৪৭	১৬৭.৫৯	৩৯.৭৯	১২৪.৩৭	০.০০	০.০০	৪৫.৫৩	৫৭.১৬	১০১	৩৪৯.১২
অক্টোবর ২৪	০.০০	০.০০	৫২.৫২	১৬৭.৫৯	৪১.৮৭	১৩০.৭৬	০.০০	০.০০	৪৫.৫৩	৫৭.১৬	১০১	৩৫৮.৯৩
নভেম্বর ২৪	০.০০	০.০০	৫২.৫২	১৬৭.৫৯	৪১.৮৭	১৩০.৭৬	০.০০	০.০০	৪৫.৫৩	৫৭.১৬	১০১	৩৫৮.৯৩
ডিসেম্বর ২৪	০.০০	০.০০	৫২.৫২	১৬৭.৫৯	৪১.৮৭	১৩০.৭৬	০.০০	০.০০	৪৫.৫৩	৫৭.১৬	১০১	৩৫৮.৯৩
জানুয়ারি ২৫	০.০০	০.০০	৫২.৫২	১৬৭.৫৯	৪১.৮৭	১৩০.৭৬	০.০০	০.০০	৪৫.৫৩	৫৭.১৬	১০১	৩৫৮.৯৩
ফেব্রুয়ারি ২৫	০.০০	০.০০	৫২.৫২	১৬৭.৫৯	৪১.৮৭	১৩০.৭৬	০.০০	০.০০	৪৫.৫৩	৫৭.১৬	১০১	৩৫৮.৯৩
মার্চ ২৫	০.০০	০.০০	৫২.৫২	১৬৭.৫৯	৪১.৮৭	১৩০.৭৬	০.০০	০.০০	৪৫.৫৩	৫৭.১৬	১০১	৩৫৮.৯৩
এপ্রিল ২৫	০.০০	০.০০	৫২.৫২	১৬৭.৫৯	৪১.৮৭	১৩০.৭৬	০.০০	০.০০	৪৫.৫৩	৫৭.১৬	১০১	৩৫৮.৯৩
মে ২৫	০.০০	০.০০	৫২.৫২	১৬৭.৫৯	৪১.৮৭	১৩০.৭৬	০.০০	০.০০	৪৫.৫৩	৫৭.১৬	১০১	৩৫৮.৯৩
জুন ২৫	০.০০	০.০০	৫২.৫২	১৬৭.৫৯	৪১.৮৭	১৩০.৭৬	০.০০	০.০০	৪৫.৫৩	৫৭.১৬	১০১	৩৫৮.৯৩
সমগ্র	০.০০	০.০০	৫২.৫২	১৬৭.৫৯	৪১.৮৭	১৩০.৭৬	০.০০	০.০০	৪৫.৫৩	৫৭.১৬	১০১	৩৫৮.৯৩
মোট	০.০০	০.০০	৫২.৫২	১৬৭.৫৯	৪১.৮৭	১৩০.৭৬	০.০০	০.০০	৪৫.৫৩	৫৭.১৬	১০১	৩৫৮.৯৩

[Signature]

— ২৬ —

[Signature]

বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ বৎসরের বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ: এম এম সি এম,
মূল্য: মিলিয়ন টাকায়








[illegible]

Blank

161

[Signature]

কোম্পানির ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন চিত্র
প্রতিবেদনাধীনঃ মার্চ ২০২৫

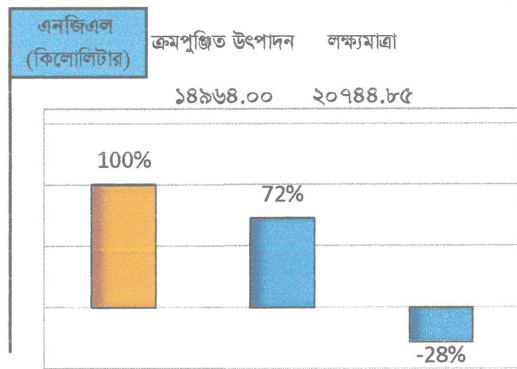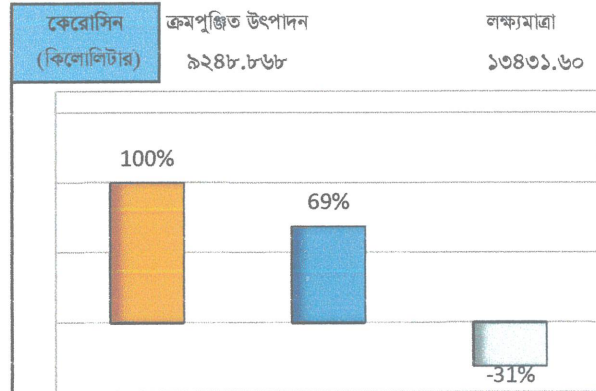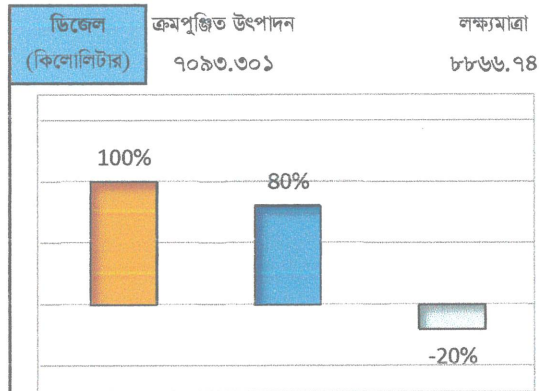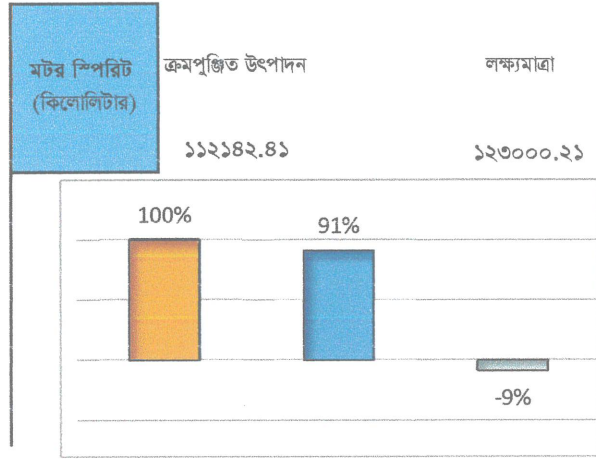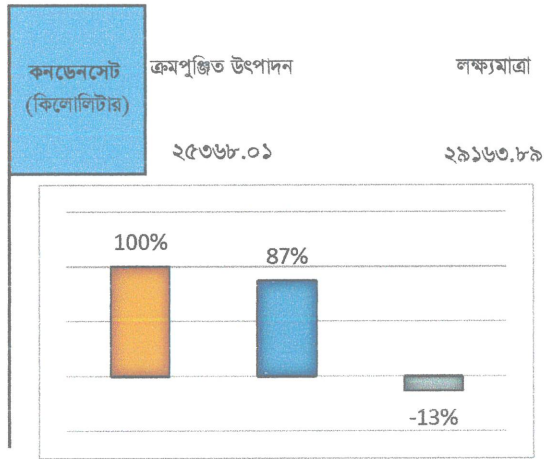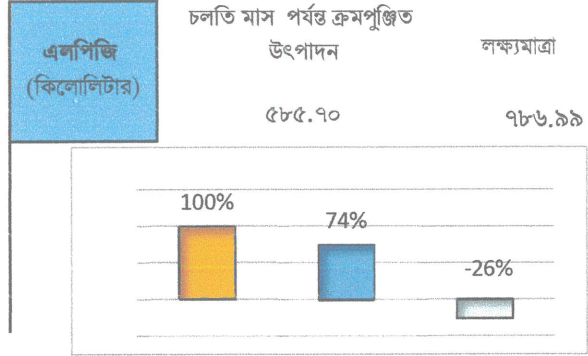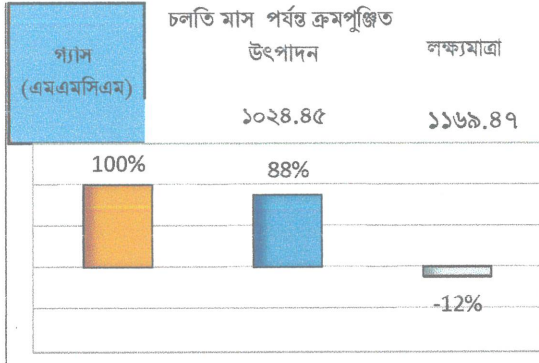

পরিচিতি









লক্ষ্যমাত্রা	
চলতি মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন-	
ঘাটতি (-)/বর্ধিত (+)	

[Signature]

[Signature]

কোম্পানির ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিত বিক্রয় চিত্র

প্রতিবেদনাধীন মাসঃ মার্চ ২০২৫

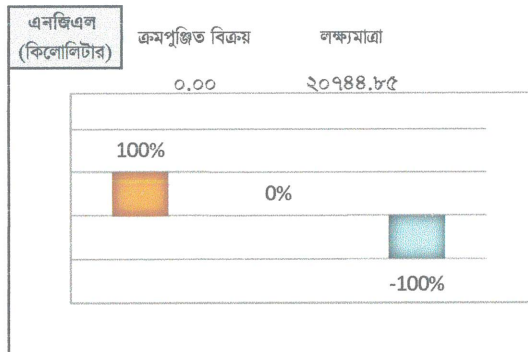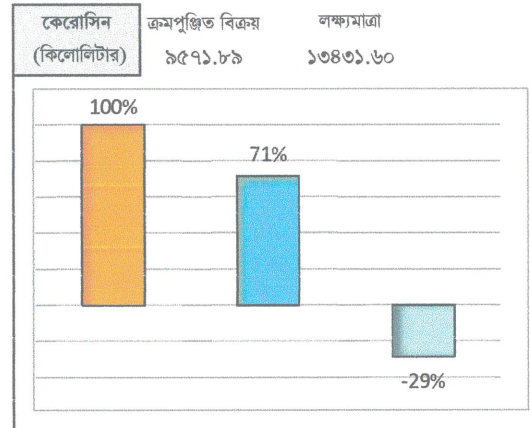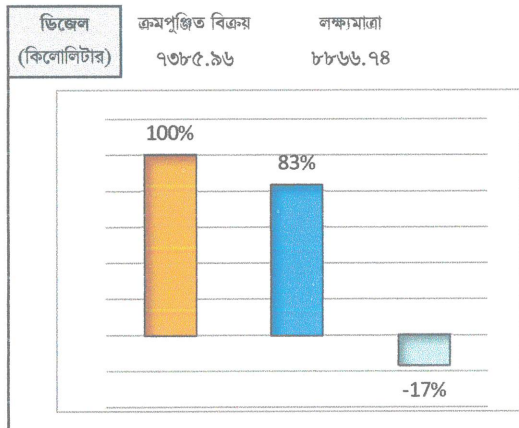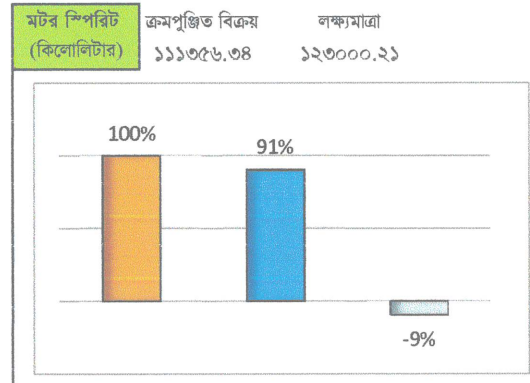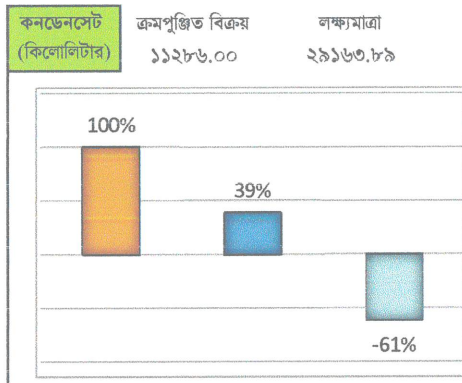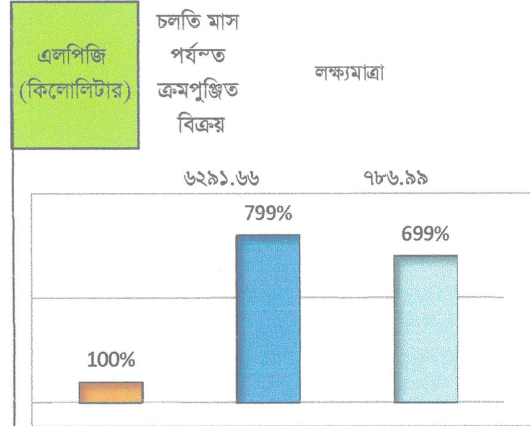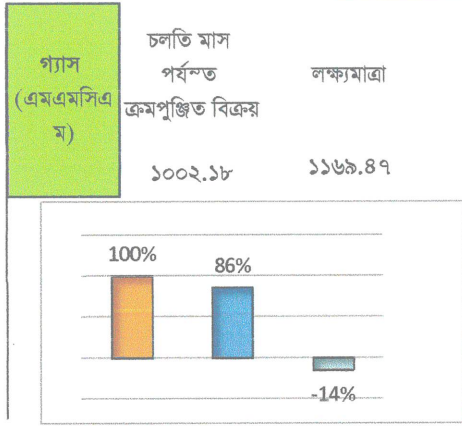

১২/৩

— ১২ —

১২/৩

কোম্পানির চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন:

বর্তমানে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভূক্ত জিডিএফ ও নিজস্ব অর্থায়নে ৩টি, জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়নে ২টি এবং কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৩টিসহ মোট ৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও অগ্রগতি প্রতিবেদন নিম্নরূপ:

ক) প্রকল্পের নাম: এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক জরিপ (১ম সংশোধিত)।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	এ্যাকরেজ ব্লক- ১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় গ্যাস রিজার্ভ ও রিসোর্স মূল্যায়নে অধিকতর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ভবিষ্যত গ্যাস চাহিদা মেটাতে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা; এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় (৮৬৫+১২৯=) ৯৯৪ বর্গকিলোমিটার ৩ডি সাইসমিক জরিপ পরিচালনা করা এবং কম-বেশী ৮ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত হাইড্রোকার্বন পে-জোন চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করা।					
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (আরডিপিপি অনুযায়ী) ব্যয়: লক্ষ টাকায়	:	স্থানীয় মুদ্রা:	৭৯৫৭.০০	বৈদেশিক মুদ্রা:	৩১৭১০.০০	মোট:	৩৯৬৬৭.০০
৩	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৬-০৮-২০২১ এবং আরডিপিপি: ০৪-১১-২০২৪					
৪	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (আরডিপিপি অনুযায়ী)	:	আরম্ভ: জুলাই ২০২১ সমাপ্তি: জুন ২০২৫					
৫	প্রকল্পের অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)					
৬	প্রকল্প পরিচালক	:	প্রকৌ. মোহাম্মদ সুলতানুল বাহার পদবী: প্রকল্প পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক মোবাইল নং-০১৭১৩৩০১০১২ Email: pd3d13-14@sgfl.org.bd					
৭	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ক) সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগ: ➤ এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ডি সাইসমিক ডাটা এ্যাকুইজিশন, প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশনসহ প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগের লক্ষ্যে কোম্পানি পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে BGP Inc, China এর সাথে ২৯-০৬-২০২২ তারিখে চুক্তি সম্পাদন এবং ১৩-১১-২০২৪ তারিখে চুক্তি সংশোধন করা হয়েছে। ➤ এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর প্রকল্প এলাকায় সর্বমোট ৮৬৫ বর্গকিলোমিটার ডাটা এ্যাকুইজিশন, প্রসেসিং, ইন্টারপ্রিটেশন, পেট্রোফিজিক্যাল এনালাইসিস, স্ট্যাটিক ও ডাইনামিক মডেলিং, হাইড্রোকার্বন রিসোর্স এস্টিমেশন, ফিল্ড ডেভলপমেন্ট প্লান এবং ১১টি ড্রিলবল কুপ লোকেশন চিহ্নিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে- যার মধ্যে ডুপিটলা প্রসপেক্ট-এ ১টি কুপ খননের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ডুপিটলা-২, সিলেট সাউথ-২, বাতচিয়া-১ ও হারারগঞ্জ-১সহ মোট ৪টি কুপ খনন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে- যা অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত ৮৬৫ বর্গকিলোমিটার এলাকায় অবস্থিত প্রসপেক্টসমূহে সর্বমোট ২৫২৯.১৯ বিসিএফ গ্যাস ও ৮৮.৬৪ মিলিয়ন ব্যারেল তেলের রিসোর্স এস্টিমেট করা হয়েছে। ➤ এছাড়া প্রকল্পের বর্ধিত কুড়িগাঁও (১২৯ বর্গকিলোমিটার) এলাকায় সার্ভিস প্রোভাইডার BGP Inc, China কর্তৃক গত ২১-১১-২০২৪ তারিখ হতে ৩ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদনের লক্ষ্যে সার্ভে, শট-হোল ড্রিলিং ও এক্সপ্লোসিভ লোডিং শুরু করে ০৯-০১-২০২৫ তারিখে ডাটা এ্যাকুইজিশন/রেকর্ডিং সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে চীনে অবস্থিত BGP Inc, China এর ডাটা সেন্টারে এ্যাকুইজিশনকৃত ডাটা প্রসেসিং এর কাজ চলমান রয়েছে। খ) স্থানীয় পরামর্শক সেবা: ➤ প্রকল্পের বর্ধিত কুড়িগাঁও (১২৯ বর্গকিলোমিটার) স্ট্রাকচারের জন্য আহবানকৃত ইওআই (Expression of interest) এর বিপরীতে ৩ ক্যাটাগরিতে ভূপদার্থবিদ (Geophysicist), ভূতত্ত্ববিদ (Geologist) ও পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার (Petroleum Engineer) এর প্রতি ক্যাটাগরিতে ১জন করে মোট ৩ জন স্থানীয় ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ করার লক্ষ্যে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে ১ জন ব্যক্তি পরামর্শকের সাথে ০৩-১২-২০২৪ তারিখ ও অপর ২ জন ব্যক্তি পরামর্শকের সাথে ০১-০১-২০২৫ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তি পরামর্শকদের সেবা গ্রহণ করা হচ্ছে।					
৮	আর্থিক অগ্রগতি	:	চলতি সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)					
			বিগত বছরের জুন'২৪ পর্যন্ত ব্যয়	জুন'২৪ পর্যন্ত আরডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	আরডিপিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	ব্যয়		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
			স্থ: মূ: ২৬৪৪.০০ বৈ: মূ: ১১৫৪৫.০০ মোট: ১৪১৮৯.০০	আর্থিক: ৩৫.৭৭% বাস্তব: ৮০.৮১%	স্থ: মূ: ৫০৯৬.০০ বৈ: মূ: ১৮৪০৪.০০ মোট: ২৩৫০০.০০	প্রতিবেদন মাস মার্চ ২০২৫ স্থ: মূ: ৩.৭৫ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ৩.৭৫	চলতি বছরের মোট (২০২৪-২০২৫) স্থ: মূ: ২২৩৩.৩৮ বৈ: মূ: ১০৭৬৫.০০ মোট: ১২৯৯৮.৩৮	স্থ: মূ: ৪৮৭৭.৩৮ বৈ: মূ: ২২৩১০.০০ মোট: ২৭১৮৭.৩৮
৯	অগ্রগতির হার	:	আর্থিক		বাস্তব			
	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	:	৫৫.৩১%		১৪.২১%			
	প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির শতকরা হার	:	৬৮.৫৪%		৯৫.০২%			

— ২০ —

[স্বাক্ষর]

খ) প্রকল্পের নাম: সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন, ১ম সংশোধিত।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট স্ট্রাকচারে নর্দান ক্রোজারে ২৫৭৬ মিটার গভীরতায় একটি অনুসন্ধান কূপ (সিলেট-১০) এবং এ কূপের আওতায় অধিকহারে গ্যাস উত্তোলনের জন্য মূল ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩৩০০ (± ১০০) মিটার গভীরতায় আরো একটি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ (সিলেট-১০এক্স) খনন করা;	
			সিলেট-১০ ও সিলেট-১০এক্স কূপ খনন করত: ১০৬ বিসিএফ গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি এবং প্রথম ৫ বছর দৈনিক প্রায় ৪০ (সিলেট-১০: ২০ ও সিলেট-১০এক্স: ২০) মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছর দৈনিক প্রায় ৩৫ (সিলেট-১০: ২০ ও সিলেট-১০এক্স: ১৫) মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক প্ররণ করা।	
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (আরডিপিপি অনুযায়ী) ব্যয়: লক্ষ টাকায়	:	স্থানীয় মুদ্রা: বৈদেশিক মুদ্রা: মোট:	১৩৯০১.০০ ৩৭৮০৯.০০ ৫১৭১০.০০
৩	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৩-১২-২০২১ এবং আরডিপিপি: ২৭-০৫-২০২৪	
৪	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (আরডিপিপি অনুযায়ী)	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২১ সমাপ্তি: জুন ২০২৫	
৫	প্রকল্প অর্থায়ন উৎস	:	নিজস্ব অর্থ এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)	
৬	প্রকল্প পরিচালক	:	প্রকৌ. আব্দুল কাদের ভুঞা পদবী: প্রকল্প পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক মোবাইল নং-০১৭৩০০০৬৯৫৩ Email: pdsylhet10@sgfl.org.bd	
৭	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ভূমি অধিগ্রহণ: ➤ প্রকল্পের আওতায় ৮.৪৮১ একর জমি অধিগ্রহণ কাজ গত ২২-০৯-২০২২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: ➤ মোট তিনজন বৈদেশিক পরামর্শক সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প সাইটে কাজ করেছেন। খনন ঠিকাদার নিয়োগ: ➤ সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্পের আওতায় টার্ন-কি ভিত্তিতে কূপ খনন অপারেশন, মালামাল সরবরাহ, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য সিসিজিপি'র অনুমোদনক্রমে নির্বাচিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান Sinopec International Petroleum Service Corporation, China-এর সাথে ০৭-০৯-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২৪-০৬-২০২৩ তারিখে খনন কাজ শুরু (স্পাড-ইন) করে ২৫৭৬ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন সম্পন্ন হয়েছে। ➤ কূপ খনন সম্পন্ন করে ২৬-১১-২০২৩ তারিখে ১ম ডিএসটি চলাকালীন দৈনিক ২২-২৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে ফ্লো এর বিপরীতে ওয়েলহেড প্রেসার ৩২৫০ পিএসআইজি পাওয়া গেছে। উক্ত কূপ হতে দৈনিক ১৫-২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। ➤ উক্ত কূপে ০২-১২-২০২৩ তারিখে ২২৮৯-২৩০০ মিটার গভীরতার স্তরে ২য় ডিএসটি অপারেশন পরিচালনা করা হলে উক্ত স্তরে গ্যাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়। পরবর্তী ১৩৯৭-১৪৪৫ মিটার জোনে ০৮-১২-২০২৩ তারিখে ৩য় ডিএসটি পরিচালনা করা হয়। উক্ত জোন পরীক্ষাকালে ক্রুড অয়েলের উপস্থিতি জানা যায়। গত ১৮-১২-২০২৩ তারিখে ২২১৮-২২২৩ মিটার গভীরতায় Perforation করে ৪র্থ ডিএসটি করা হলে সেখানেও গ্যাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়। কূপের বটম ইন্টারভাল ২৫৪০-২৫৬৫ মিটার জোনের গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যে Well Completion এর কাজ ০৭-০২-২০২৪ তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে। গ্যাস প্রাপ্তি সাপেক্ষে গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ: ➤ সিলেট-১০নং কূপ হতে হরিপুর ফিল্ডের প্রসেস প্লান্ট পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ৪ইঞ্চি ব্যাসের উচ্চচাপ গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ কাজের জন্য এনসিটি পদ্ধতিতে নির্বাচিত দরদাতা GasMin Limited, Dhaka এর সাথে ২৮-০৩-২০২৪ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ➤ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ১২-১১-২০২৪ তারিখ থেকে হরিপুর ফিল্ডের প্রসেস প্লান্ট থেকে সিলেট-৭নং কূপ লোকেশন পর্যন্ত প্রায় ৩.০ কিলোমিটার এবং কূপ লোকেশন হতে সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক পর্যন্ত ৬০০ মিটার রাস্তায় পাইপলাইন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। উক্ত পাইপলাইনের এসজিএফএল এর নিজস্ব রাস্তা ও জায়গার ব্যবহার করে ৪ কিলোমিটার পাইপলাইনের কাজ শেষ করা হয়েছে।	

		➤ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সিলেট-তামাবির মহাসড়কের রাইট অফ ওয়ে ব্যবহার করার অনুমতি না পাওয়ায় বিকল্প হিসেবে সিলেট-১০ নং কূপ ও সিলেট তামাবিল মহাসড়কের সংযোগ পয়েন্ট থেকে হরিপুর ব্রিজ পর্যন্ত ৪.৫ কিলোমিটার অংশে করিচেরপুল ও কাপনা নদীর তীর বরাবর নদীর শূকনা অংশে পাইপলাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া সিলেট-৩ নং কূপের পাইপলাইন রুট ও সিলেট-৬নং কূপের রুট ব্যবহার করে পাইপলাইন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে অবশিষ্ট ২.৭ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। সিলেট-১০ এক্স নং কূপ: ➤ সিলেট-১০নং কূপটি সফলভাবে খননের মাধ্যমে কয়েকটি লেয়ারে গ্যাস ও তেলের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়ায় এ কূপের আওতায় অধিক হারে গ্যাস উত্তোলনের লক্ষ্যে ৩৩০০ (±১০০) মিটার গভীরতায় মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ (সিলেট-১০এক্স) খননের জন্য প্রকল্পের ১ম সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (১ম আরডিপিপি) ২৭-০৫-২০২৪ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে অনুমোদিত হয়েছে। ➤ নতুন একটি গ্যাস কূপ সিলেট-১০এক্স এর জন্য "মালামাল, প্রকৌশল সেবা, মোবাইলাইজেশন ও ডি-মোবাইলাইজেশন ইত্যাদিসহ খনন অপারেশন" কাজের ক্রয় প্রক্রিয়া ও পরিকল্পনা পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে "আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র (এক ধাপ দুই খাম)" পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ২১-১০-২০২৪ তারিখে দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ১৮-১২-২০২৪ তারিখে দরপত্র গ্রহণ ও উন্মুক্তকালে দুটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান দরপত্র জমা প্রদান করেছে। ➤ এসজিএফএল-এর বোর্ডে অনুমোদনক্রমে ২৩-০১-২০২৫ তারিখে কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নে উত্তীর্ণ সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), PR China এর সাথে ১৯-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পাদন করা হয়েছে। খনন সাইটে মবাইলাইজেশনের জন্য ২৫-০২-২০২৫ তারিখে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।																				
৮	আর্থিক অগ্রগতি	<table><tr><td colspan="6">চলতি সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)</td></tr><tr><td rowspan="2">বিগত বছরের জুন'২৪ পর্যন্ত ব্যয়</td><td rowspan="2">জুন'২৪ পর্যন্ত আরডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার</td><td rowspan="2">আরডিপিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)</td><td colspan="2">ব্যয়</td><td rowspan="2">প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়</td></tr><tr><td>প্রতিবেদন মাস মার্চ ২০২৫</td><td>চলতি বছরের মোট (২০২৪-২০২৫)</td></tr><tr><td>স্থ: মূ: ১৫২৮.১৭ বৈ: মূ: ১৬৭৮৭.০০ মোট: ১৮৩১৫.১৭</td><td>আর্থিক: ৩৫.৪২% বাস্তব: ৪১.৪৫%</td><td>স্থ: মূ: ৪৫৯৩.০০ বৈ: মূ: ১৬৮২.০০ মোট: ৬২৭৫.০০</td><td>স্থ: মূ: ১৩.৯৩ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ১৩.৯৩</td><td>স্থ: মূ: ৪৫৮৩.৭৫ বৈ: মূ: ১৬৮১.৬১ মোট: ৬২৬৫.৩৬</td><td>স্থ: মূ: ৬১১১.৯২ বৈ: মূ: ১৮৪৬৮.৬১ মোট: ২৪৫৮০.৫৩</td></tr></table>	চলতি সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)						বিগত বছরের জুন'২৪ পর্যন্ত ব্যয়	জুন'২৪ পর্যন্ত আরডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	আরডিপিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	ব্যয়		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	প্রতিবেদন মাস মার্চ ২০২৫	চলতি বছরের মোট (২০২৪-২০২৫)	স্থ: মূ: ১৫২৮.১৭ বৈ: মূ: ১৬৭৮৭.০০ মোট: ১৮৩১৫.১৭	আর্থিক: ৩৫.৪২% বাস্তব: ৪১.৪৫%	স্থ: মূ: ৪৫৯৩.০০ বৈ: মূ: ১৬৮২.০০ মোট: ৬২৭৫.০০	স্থ: মূ: ১৩.৯৩ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ১৩.৯৩	স্থ: মূ: ৪৫৮৩.৭৫ বৈ: মূ: ১৬৮১.৬১ মোট: ৬২৬৫.৩৬	স্থ: মূ: ৬১১১.৯২ বৈ: মূ: ১৮৪৬৮.৬১ মোট: ২৪৫৮০.৫৩
চলতি সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)																						
বিগত বছরের জুন'২৪ পর্যন্ত ব্যয়	জুন'২৪ পর্যন্ত আরডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	আরডিপিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	ব্যয়		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়																	
			প্রতিবেদন মাস মার্চ ২০২৫	চলতি বছরের মোট (২০২৪-২০২৫)																		
স্থ: মূ: ১৫২৮.১৭ বৈ: মূ: ১৬৭৮৭.০০ মোট: ১৮৩১৫.১৭	আর্থিক: ৩৫.৪২% বাস্তব: ৪১.৪৫%	স্থ: মূ: ৪৫৯৩.০০ বৈ: মূ: ১৬৮২.০০ মোট: ৬২৭৫.০০	স্থ: মূ: ১৩.৯৩ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ১৩.৯৩	স্থ: মূ: ৪৫৮৩.৭৫ বৈ: মূ: ১৬৮১.৬১ মোট: ৬২৬৫.৩৬	স্থ: মূ: ৬১১১.৯২ বৈ: মূ: ১৮৪৬৮.৬১ মোট: ২৪৫৮০.৫৩																	
৯	অগ্রগতির হার	:	আর্থিক	বাস্তব																		
	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	:	৯৯.৮৫%	২৬.০৬%																		
	প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির শতকরা হার	:	৪৭.৫৪%	৬৭.৫১%																		





গ) প্রকল্পের নাম: হরিপুর গ্যাস ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন (১ম সংশোধিত)।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য হরিপুর গ্যাস ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন; হরিপুর ফিল্ডের কুপসমূহ হতে উত্তোলিত গ্যাস প্রসেস করে তা সরবরাহের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।			
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (আরডিপিপি অনুযায়ী) ব্যয়: লক্ষ টাকায়	:	স্থানীয় মুদ্রা:	২৩০৮.০০	বৈদেশিক মুদ্রা:	১২৮৭২.০০
			মোট:	১৫১৮০.০০		
৩	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ৩১-০৮-২০২২ এবং আরডিপিপি: ০৯-১২-২০২৪			
৪	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (আরডিপিপি অনুযায়ী)	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২২ সমাপ্তি: জুন ২০২৫			
৫	প্রকল্প অর্থায়ন উৎস	:	নিজস্ব অর্থ এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)			
৬	প্রকল্প পরিচালক	:	প্রকৌ. সুমন বিকাশ দাস পদবী: প্রকল্প পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক মোবাইল নং- ০১৭৩০০০৬৯৫৮ Email: sbdasmste@gmail.com			
৭	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ক) প্লান্ট স্থাপন কাজ: - হরিপুর গ্যাস ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট নির্মাণের লক্ষ্যে ইপিসি ঠিকাদার ZICOM EQUIPMENT PTE LTD-এর সাথে ০৩-১০-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ০৮-০২-২০২৩ তারিখে প্রকল্পের ইপিসি কাজের বিপরীতে এলসি স্থাপন করা হয়। - প্রকল্পের আওতায় ইপিসি ঠিকাদার কর্তৃক প্রসেস প্লান্ট স্থাপন কাজ ০২-১০-২০২৪ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। ১৭-১১-২০২৪ তারিখ হতে ৩০-১১-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্লান্ট কমিশনিং এবং ০১-১২-২০২৪ হতে ০৭-১২-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্লান্টের টেস্ট রান সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ইপিসি ঠিকাদার কর্তৃক নবনির্মিত প্রসেস প্লান্ট বিষয়ক অন-সাইট প্রশিক্ষণ ১৫-০১-২০২৫ তারিখে শেষ হয়েছে। Acceptance এর পর ০৮-১২-২০২৪ তারিখ হতে আলোচ্য প্রসেস প্লান্ট এসজিএফএল এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে এবং দৈনিক কমবেশি ১১.৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস প্রসেস করে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। খ) বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: ৫ জন বৈদেশিক পরামর্শক প্রয়োজন অনুযায়ী Dismantling, Design Review, Welding & Mechanical Testing, Installation, Electrical & Instrumentation, Pre-commissioning এবং Commissioning কাজে পরামর্শ সেবা প্রদান করেছেন। গ) EIA স্টাডি ও পরিবেশগত ছাড়পত্র: - পরিবেশ অধিদপ্তর হতে প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান EQMS Consulting Limited, Dhaka কর্তৃক ইআইএ সমীক্ষা কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে, সমীক্ষা প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ০২-০৮-২০২৩ তারিখ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং উক্ত ছাড়পত্র ০১-০৮-২০২৪ তারিখ হতে ১ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়েছে।			
৮	আর্থিক অগ্রগতি	:	চলতি সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)			
			বিগত বছরের জুন'২৪ পর্যন্ত ব্যয়	জুন'২৪ পর্যন্ত আরডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	আরডিপিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	ব্যয়
			স্থ: মূ: ৩১৮.০০ বৈ: মূ: ৭২১২.০০ মোট: ৭৫৩০.০০	আর্থিক: ৪৯.৬০% বাস্তব: ৭৭.৬৩%	স্থ: মূ: ১৯৩৮.০০ বৈ: মূ: ৫১৯৭.০০ মোট: ৭১৩৫.০০	প্রতিবেদন মাস মার্চ ২০২৫
						চলতি বছরের মোট (২০২৪-২০২৫)
						স্থ: মূ: ১৩৫৫.৪৩ বৈ: মূ: ২২২৭.১৫ মোট: ৩৫৮২.৫৮
						স্থ: মূ: ১৬৭৩.৪৩ বৈ: মূ: ৯৪৩৯.১৫ মোট: ১১১১২.৫৮
৯	অগ্রগতির হার	:	আর্থিক	বাস্তব		
	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	:	৫০.২১%	২২.১০%		
	প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির শতকরা হার	:	৭৩.২১%	৯৯.৭৩%		

হসি

— ২৬ —

৫/৭/২৪

ঘ) প্রকল্পের নাম: কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭নং কূপ ওয়ার্কওভার, ১ম সংশোধিত

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭নং বন্ধ কূপসমূহ ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে পুনঃউৎপাদনে আনয়ন; ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭নং কূপসমূহ হতে প্রথম ৫ বছরে ৫৪ বিসিএফ এবং পরবর্তী ৫ বছরে ৪১ বিসিএফ অর্থাৎ ১০ বছরে আনুমানিক ৯৫ বিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করে দেশের জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।					
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (আরডিপিপি অনুযায়ী) ব্যয়: লক্ষ টাকায়	:	স্থানীয় মুদ্রা:	২১৯৭৭.০০	বৈদেশিক মুদ্রা:	৫৮৩১.০০	মোট:	২৭৮০৮.০০
৩	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৯-০১-২০২৩ এবং আরডিপিপি: ১৯-১২-২০২৪					
৪	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (আরডিপিপি অনুযায়ী)	:	আরম্ভ: জানুয়ারি ২০২৩ সমাপ্তি: জুন ২০২৫					
৫	প্রকল্প অর্থায়ন উৎস	:	নিজস্ব তহবিল					
৬	প্রকল্প পরিচালক	:	ড. মো: ফরহাদজ্জামান পদবী: প্রকল্প পরিচালক ও ব্যবস্থাপক মোবাইল নং-০১৭১৬৪২৪১৪০ Email: farhadgeo@gmail.com					
৭	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ক) মালামাল ক্রয়/সংগ্রহ: ➤ বৈদেশিক মালামাল ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। খ) বৈদেশিক পরামর্শ সেবা: ➤ বৈদেশিক পরামর্শক সংক্রান্তে কূপ সাইটে বাস্তব কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। গ) থার্ড পার্টি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস: ➤ সিমেন্টিং, ডিএসটি, ওয়্যারলাইন লগিং এবং স্লিকলাইন সংক্রান্তে কূপ সাইটে বাস্তব কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। ঘ) ওয়ার্কওভার অপারেশন: কৈলাশটিলা-২: ➤ কৈলাশটিলা-২নং কূপে ২৭-০৬-২০২৩ তারিখে ওয়ার্কওভার শুরু করে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতঃ ডিপার হরাইজোন হতে (৩১২৬-৩১৩০ মিটার গভীরতা) ২৩-১১-২০২৩ তারিখ থেকে দৈনিক ৬.২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা হয় এবং বর্তমানে উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। রশিদপুর-২: ➤ রশিদপুর-২নং কূপে ০৩-১২-২০২৩ তারিখে ওয়ার্কওভার শুরু করে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতঃ আপার গ্যাস স্যান্ড টপ জোন (পারফোরমেশন ১৩৯১.৩-১৩৯৪.৩ ও ১৪০৩.৫-১৪০৭ মিটার গভীরতায়) হতে ০৯-০২-২০২৪ তারিখ থেকে দৈনিক ৮.৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা হয় এবং বর্তমানে উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। রশিদপুর-৫: ➤ ২৫-০৩-২০২৪ তারিখ স্পাড-ইন করত: ২৮৬০ মিটার পর্যন্ত হোল ক্লিন করে ওয়্যারলাইন লগিং করা হয়েছে। ১৮-০৪-২০২৪, ০৪-০৫-২০২৪ ও ০৬-০৫-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনটি ডিএসটি সম্পন্ন করা হয়। উক্ত টেস্টে বাণিজ্যিকভাবে গ্যাস উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত গ্যাসের ফ্লো পাওয়া যায়নি বিধায় কারিগরি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কূপটিকে ওয়াটার ডিসপোজাল ওয়েল হিসেবে ১৭-০৫-২০২৪ তারিখে কমপ্লিট করা হয়েছে। সিলেট-৭: ➤ সিলেট-৭নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ ১৬-০৭-২০২৪ তারিখে শুরু (স্পাড-ইন) করে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতঃ আপার বোকাবিল জোন (১১৯২.৪-১২০২ মিটার) হতে ০৪-১১-২০২৪ তারিখ থেকে দৈনিক ৮.৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা হয়েছে এবং বর্তমানে উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া প্রকল্প কার্যক্রমের গুনগত মান বজায় রাখা সংক্রান্তে কয়েকটি বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লগিং ইন্টারপ্রিটেশন রিপোর্ট, ডিএসটি ইন্টারপ্রিটেশন রিপোর্ট, সিমেন্টিং ইভালুয়েশন রিপোর্ট, স্লিকলাইন অপারেশন রিপোর্ট, কম্পালটেন্সি রিপোর্ট ও ওয়ার্কওভার রিপোর্ট ইত্যাদি বিষয়ে ৪টি কূপের ক্ষেত্রে মোট ২০টি টেকনিক্যাল রিপোর্টের মধ্যে ১৬টি চূড়ান্ত করে প্রকল্প দপ্তরে দাখিল করেছে। চুক্তির আলোকে পেমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে।					
৮	আর্থিক অগ্রগতি	:	চলতি সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)					
			বিগত বছরের জুন'২৪ পর্যন্ত ব্যয়	জুন'২৪ পর্যন্ত আরডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	আরডিপিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	ব্যয়		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
			স্থ: মূ: ৫১১৮.০০ বৈ: মূ: ৩৮২.০০ মোট: ৫৫০০.০০	আর্থিক: ১৯.৭৮% বাস্তব: ৭৭.০৭%	স্থ: মূ: ১৫৭৫৯.০০ বৈ: মূ: ৪৩৯৭.০০ মোট: ২০১৫৬.০০	প্রতিবেদন মাস মার্চ ২০২৫ স্থ:মূ: ৪০৫৯.৫৮ বৈ: মূ: ২৯০.০৮ মোট: ৪৩৪৯.৬৬	চলতি বছরের মোট (২০২৪-২০২৫) স্থ: মূ: ১৫৪৩২.১১ বৈ: মূ: ৩৮৭৬.০০ মোট: ১৯৩০৮.১১	স্থ: মূ: ২০৫৫০.১১ বৈ: মূ: ৪২৫৮.০০ মোট: ২৪৮০৮.১১
৯	অগ্রগতির হার	:	আর্থিক		বাস্তব			
	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	:	৯৫.৭৯%		২১.৯২%			
	প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির শতকরা হার	:	৮৯.২১%		৯৮.৯৯%			

৬) প্রকল্পের নাম: সিলেট-১১নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট ও রশিদপুর স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ২০০০ (±১০০) মিটার ও ৪২০০ (±১০০) মিটার (TVD) গভীরতায় একটি উন্নয়ন কূপ (সিলেট-১১) ও একটি অনুসন্ধান কূপ (রশিদপুর-১৩) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে সিলেট-১১ ও রশিদপুর- ১৩নং কূপ দুটি হতে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১৬ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।					
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) ব্যয়: লক্ষ টাকায়	:	স্থানীয় মূদ্রা:	১৮২৬৭.০০	বৈদেশিক মূদ্রা:	৪১৬৮৩.০০	মোট:	৫৯৯৫০.০০
৩	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১৮-০৪-২০২৪					
৪	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (ডিপিপি অনুযায়ী)	:	আরম্ভ: মার্চ ২০২৪ সমাপ্তি: জুন ২০২৬					
৫	প্রকল্প অর্থায়ন উৎস	:	নিজস্ব তহবিল					
৬	প্রকল্প পরিচালক	:	প্রকৌ. মুহাঃ মাহমুদুল ইসলাম পদবী: প্রকল্প পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক মোবাইল নং-০১৭১২ ২৩৬৪৪৫ Email: pdrp13@sgfl.org.bd					
৭	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ক) খনন ঠিকাদার নিয়োগ: ➤ সিলেট-১১ (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩ (অনুসন্ধান কূপ) খনন কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে কূপ খনন, মালামাল সরবরাহ, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য Turn-key ভিত্তিতে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান Sinopec International Petroleum Service Corporation, China-এর সহিত ১৫-১০-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। খ) ইআইএ/আইইই/পরিবেশ ছাড়পত্র: ➤ প্রকল্পের অনুকূলে ১৪-০১-২০২৫ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। গ) ভূমি অধিগ্রহণ: ➤ রশিদপুর-১৩ নং (অনুসন্ধান কূপ) কূপের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৯.৭৭৮ একর ভূমি অধিগ্রহণের অনুমোদন প্রদান করে ১৭-০৩-২০২৫ তারিখে জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ বরাবর পত্র প্রেরণ করেছে। ➤ সিলেট-১১নং (উন্নয়ন কূপ) কূপের জন্য ৩.৯৩১ একর ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক সিলেট বরাবর ১১-০২-২০২৪ তারিখে প্রস্তাবনা দাখিল করা হয়েছে। ২৪-১১-২০২৪ তারিখে ৪ ধারা জারী করা হয়েছে। ০৩-১২-২০২৪ তারিখে যৌথ তদন্তসহ ভূমি ডিমার্কেশন করা হয়েছে এবং ভূমির মালিকগণের কোন আপত্তি না থাকলে নিয়মানুযায়ী ০৭ ধারা জারী করা হবে। ঘ) ভূমি উন্নয়ন: ➤ সিলেট-১১নং (উন্নয়ন কূপ) কূপ এলাকা বন্নি-পাইলিংসহ মাটি ভরাটের কাজ ২৭-০২-২০২৫ তারিখ হতে আরম্ভ করা হয়েছে। ঙ) বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: ➤ প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত ০৯-০১-২০২৫ তারিখে ইওআই আহ্বান করা হয়েছে। ৩১-০১-২০২৫ তারিখে ৯টি প্রতিষ্ঠান ইওআই দাখিল করেছে। মূল্যায়ন শেষে গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে আরএফপি প্রেরণ করা হবে।					
৮	আর্থিক অগ্রগতি	%	চলতি সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)					
			বিগত বছরের জুন'২৪ পর্যন্ত ব্যয়	জুন'২৪ পর্যন্ত ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	ব্যয়		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
			স্থানীয়: ০.০০ বৈদেশিক: ০.০০ মোট: ০.০০	আর্থিক: ০.০০% বাস্তব: ০.০০%	স্থানীয়: ৪৫৮.০০ বৈদেশিক: ০.০০ মোট: ৪৫৮.০০	প্রতিবেদন মাস মার্চ ২০২৫	চলতি বছরের মোট (২০২৪-২০২৫)	স্থানীয়: ৫৮.৬৫ বৈদেশিক: ০.০০ মোট: ৫৮.৬৫
						স্থানীয়: ৯.৭৭ বৈদেশিক: ০.০০ মোট: ৯.৭৭	স্থানীয়: ৫৮.৬৫ বৈদেশিক: ০.০০ মোট: ৫৮.৬৫	স্থানীয়: ৫৮.৬৫ বৈদেশিক: ০.০০ মোট: ৫৮.৬৫
৯	অগ্রগতির হার	:	আর্থিক		বাস্তব			
	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	:	১২.৮১%		১৩.০৫%			
	প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির শতকরা হার	:	০.১০%		১৩.০৫%			

— ২৫ —

৮) প্রকল্পের নাম: কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২নং কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্প।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২নং কূপসমূহকে পূরণায় গ্যাস উৎপাদন আনয়ন: সংশ্লিষ্ট কূপের টার্গেটেড স্যান্ডসমূহে মজুদকৃত ৭১২ বিসিএফ গ্যাসের মধ্যে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে (কৈলাশটিলা-১: ৫, রশিদপুর-৩: ১০ ও বিয়ানীবাজার-২: ৮) এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে (কৈলাশটিলা-১: ৫, রশিদপুর-৩: ৭ ও বিয়ানীবাজার-২: ৬) অর্থাৎ মোট ৭১.৭৫ বিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করে দেশের জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।					
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) ব্যয়: লক্ষ টাকায়	:	স্থানীয় মুদ্রা:	১৬১২৯.০০	বৈদেশিক মুদ্রা:	৬২৬৬.০০	মোট:	২২৩৯৫.০০
৩	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১১-১২-২০২৪					
৪	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (ডিপিপি অনুযায়ী)	:	আরম্ভ: জানুয়ারি ২০২৫ সমাপ্তি: জুন ২০২৬					
৫	প্রকল্প অর্থায়ন উৎস	:	নিজস্ব তহবিল					
৬	প্রকল্প পরিচালক	:	প্রকৌ. কাজী মো: শহীদ উল্লাহ পদবী: প্রকল্প পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক মোবাইল নং-০১৮১৮ ৪০৪০৬৩ Email: pd3wellsw0@sgfl.org.bd					
৭	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ক) মালামাল ক্রয়/সংগ্রহ: ➤ প্রকল্পের ওয়ার্কওভার অপারেশন কাজ বাপেক্স-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য ব্যয় নির্ধারণ সংক্রান্ত এসজিএফএল ও বাপেক্স-এর কর্মকর্তাদের মধ্যে নেগোসিয়েশন সভা ০৯-০৩-২০২৫ তারিখে বাপেক্স ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ওয়ার্কওভার কাজে প্রয়োজনীয় সকল মালামাল বাপেক্স কর্তৃক প্রদান করা হবে। খ) বৈদেশিক পরামর্শ সেবা: ➤ বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে ০৬-০৩-২০২৫ তারিখে ইওআই আহ্বান করা হয়েছে। গ) ইআইএ সম্পাদন: ➤ EIA সম্পাদনের নিমিত্ত QCBS পদ্ধতিতে নির্বাচিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান EQMS Consulting Limited, Dhaka এর সাথে ২১-০১-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মাঠ পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন করেছে এবং খসড়া প্রতিবেদন দাখিল করেছে। ঘ) থার্ড পার্টি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস: ➤ তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত দরপত্র দলিলের আলোকে ২০-০২-২০২৫ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ঙ) ওয়ার্কওভার অপারেশন: ➤ প্রকল্পের ওয়ার্কওভার অপারেশন কাজ বাপেক্স-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য ব্যয় নির্ধারণ সংক্রান্ত এসজিএফএল ও বাপেক্স-এর কর্মকর্তাদের মধ্যে নেগোসিয়েশন সভা ০৯-০৩-২০২৫ তারিখে বাপেক্স ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাপেক্স-এর সাথে খসড়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চ) রিগ ফাউন্ডেশন মডিফিকেশন: ➤ রশিদপুর-৩নং কূপের রিগ ফাউন্ডেশন মডিফিকেশনের জন্য নির্বাচিত ঠিকাদারের সহিত ১৮-০৩-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। ঠিকাদার ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে। ➤ কৈলাশটিলা-১ নং কূপের রিগ ফাউন্ডেশন মডিফিকেশনের জন্য ২০-০২-২০২৫ তারিখ এবং বিয়ানীবাজার-২নং কূপের রিগ ফাউন্ডেশন মডিফিকেশনের জন্য ২৩-০২-২০২৫ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। প্রাপ্ত দরপ্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন প্রতিবেদন এসজিএফএল-এর পরিচালক পর্যদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।					
৮	আর্থিক অগ্রগতি	:	চলতি সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)					
		:	বিগত বছরের জুন'২৪ পর্যন্ত ব্যয়	জুন'২৪ পর্যন্ত ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	ব্যয়		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
		:	স্থি: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০	আর্থিক: ০.০০% বাস্তব: ০.০০%	স্থি: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০	প্রতিবেদন মাস মার্চ ২০২৫ স্থি: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০	চলতি বছরের মোট (২০২৪-২০২৫) স্থি: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০	স্থি: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০
৯	অগ্রগতির হার	:	আর্থিক		বাস্তব			
	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	:	০.০০%		২.৭৩%			
	প্রকল্পের শুরূ হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির শতকরা হার	:	০.০০%		২.৭৩%			

— ২৬ —

হ) প্রকল্পের নাম: ডুপিটলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডুপিটলা ও কৈলাশটিলা স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ৩৪৬০ (±১০০) মিটার ও ৩৬০০ (±১০০) মিটার (TVD) গভীরতায় দু'টি অনুসন্ধান কূপ (ডুপিটলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে ডুপিটলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ দুটি হতে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে অর্থাৎ ১০ বছরে মোট ৫৬ বিসিএফ গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।				
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) ব্যয়: লক্ষ টাকায়	:	স্থানীয় মুদ্রা: বৈদেশিক মুদ্রা: মোট:	১৯৯১২.০০ ৪৪৭৩৬.০০ ৬৪৬৪৮.০০			
৩	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৭-০১-২০২৫				
৪	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (ডিপিপি অনুযায়ী)	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২৪ সমাপ্তি: সেপ্টেম্বর ২০২৬				
৫	প্রকল্প অর্থায়ন উৎস	:	জিওবি ও নিজস্ব তহবিল				
৬	প্রকল্প পরিচালক	:	প্রকৌ. মো: মুশতাক আহমেদ পদবী: প্রকল্প পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক মোবাইল নং-০১৭৩০-০৭৩৬৪৯ Email: PDDPL1KTL9@sgfl.org.bd				
৭	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ক) ভূমি অধিগ্রহণ: ➤ কৈলাশটিলা-৯নং কূপের খননস্থল উন্নয়ন ও সংযোগ রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যে ১৯-০৫-২০২৪ তারিখে ৬.০৩৫ একর ভূমি হকুমদখলের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করে। ১৪-০৮-২০২৪ তারিখে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, সিলেট বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ডিপিপি অনুমোদনের পর পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত ০২-০২-২০২৫ তারিখে পুনরায় জেলা প্রশাসক, সিলেট বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ➤ ডুপিটলা-১নং কূপের খননস্থল উন্নয়ন ও সংযোগ রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যে ০৫-১২-২০২৪ তারিখে ৭.৮২৩ একর ভূমি হকুমদখলের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করে। ডিপিপি অনুমোদনের পর পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত ৩০-০১-২০২৫ তারিখে জেলা প্রশাসক, সিলেট বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। খ) খনন অপারেশন (মালামাল, প্রকৌশল ও পূর্ত কাজ ইত্যাদিসহ): ➤ ডুপিটলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খননের লক্ষ্যে কূপ খনন, মালামাল সরবরাহ, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য Turn-key ভিত্তিতে আর্থিক মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য ও সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান CNPC Chuangqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC)-এর সাথে ২৭-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। গ) বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: ➤ ০৯-০১-১০১৪ তারিখে REOI বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হয়েছে এবং ৩০-০১-২০২৫ তারিখে দরপত্র খোলা হয়েছে। প্রাপ্ত দরপ্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন শেষে ৬টি প্রতিষ্ঠানের নিকট ১৮-০৩-২০২৫ তারিখে আরএফপি ডকুমেন্ট প্রেরণ করা হয়েছে। ঘ) ইআইএ/আইইই/পরিবেশ ছাড়পত্র: ➤ প্রকল্পের অনুকূলে ডুপিটলা-১নং কূপের জন্য ১১-০৭-২০২৪ তারিখে এবং কৈলাশটিলা-৯নং কূপের জন্য ০৯-০৪-২০২৪ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া গেছে।				
৮	আর্থিক অগ্রগতি	:	চলতি সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)				
			বিগত বছরের জুন'২৪ পর্যন্ত ব্যয়	জুন'২৪ পর্যন্ত ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	ব্যয়	প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
			স্থান: ০.০০ বৈ: ০.০০ মোট: ০.০০	আর্থিক: ০.০০% বাস্তব: ০.০০%	স্থান: ০.০০ বৈ: ০.০০ মোট: ১০.০০	প্রতিবেদন মাস মার্চ ২০২৫ স্থান: ১০.০০ বৈ: ০.০০ মোট: ১০.০০	চলতি বছরের মোট (২০২৪-২০২৫) স্থান: ১০.০০ বৈ: ০.০০ মোট: ১০.০০
৯	অগ্রগতির হার	:	আর্থিক		বাস্তব		
	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	:	১০০%		৪.৪৮%		
	প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির শতকরা হার	:	০.০২%		৪.৪৮%		









— ২৭ —

জ) প্রকল্পের নাম: রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রশিদপুর স্ট্রীকচারে ২৯০০ (±১০০) মিটার গভীরতায় একটি অনুসন্ধান কূপ (রশিদপুর-১১) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে ২৯.৪৯ বিসিএফ গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি করা এবং প্রথম ৩ বছরে দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।					
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) ব্যয়: লক্ষ টাকায়	:	স্থানীয় মুদ্রা:	৭৫১৮.০০				
			বৈদেশিক মুদ্রা:	১৯৬৬৯.০০				
			মোট:	২৭১৮৭.০০				
৩	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১৪-০১-২০২৫					
৪	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (ডিপিপি অনুযায়ী)	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২৪ সমাপ্তি: জুন ২০২৬					
৫	প্রকল্প অর্থায়ন উৎস	:	জিওবি ও নিজস্ব তহবিল					
৬	প্রকল্প পরিচালক	:	প্রকৌ. মো: আবুল মনজুর চৌধুরী পদবী: প্রকল্প পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক মোবাইল নং-০১৭৩০-০৩৬৩৯৯ Email: pdrp11@sgfl.org.bd					
৭	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ক) খনন ঠিকাদার নিয়োগ: ➤ “রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন” প্রকল্পের বর্ণিত কূপ খনন, মালামাল সরবরাহ, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য Turn-key ভিত্তিতে ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে আহবানকৃত দরপত্রের বিপরীতে প্রাথমিক ও কারিগরি মূল্যায়নে উত্তীর্ণ দু’টি দরদাতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আর্থিক মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য ও সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান CNPC Chuangqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC) এর সাথে ২৭-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। খ) ইআইএ/আইইই/পরিবেশ ছাড়পত্র: ➤ প্রকল্পের অনুকূলে ১৬-০১-২০২৫ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। গ) ভূমি অধিগ্রহণ: ➤ প্রকল্পের ৮.৩৮৭ একর ভূমি অধিযাচনের লক্ষ্যে অধিযাচন সংক্রান্ত সকল নথি ২৭-০২-২০২৫ তারিখে জেলা প্রশাসক হবিগঞ্জের এলএ শাখা কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৩-০৩-২০২৫ তারিখে ভূমি মালিকদের পাওনা অর্থ পরিশোধের শর্তে ২ বছরে জন্য হকুম দখলের নিমিত্তে অনুমোদন প্রদান পাওয়া যায়। ঘ) বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: ➤ প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত Rich Spread Group Limited,China এর সাথে চুক্তি নবায়ন করা হয়েছে।					
৮	আর্থিক অগ্রগতি	:	চলতি সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)					
			বিগত বছরের জুন’২৪ পর্যন্ত ব্যয়	জুন’২৪ পর্যন্ত ডিপিপি’র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	ব্যয়		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
			স্থ: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০	আর্থিক: ০.০০% বাস্তব: ০.০০%	স্থ: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০	প্রতিবেদন মাস মার্চ ২০২৫	চলতি বছরের মোট (২০২৪-২০২৫)	
						স্থ: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০	স্থ: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০	
৯	অগ্রগতির হার	:	আর্থিক		বাস্তব			
	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	:	০.০০%		০.০০%			
	প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির শতকরা হার	:	০.০০%		০.০০%			

— ২৮ —

কোম্পানির চলমান প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত

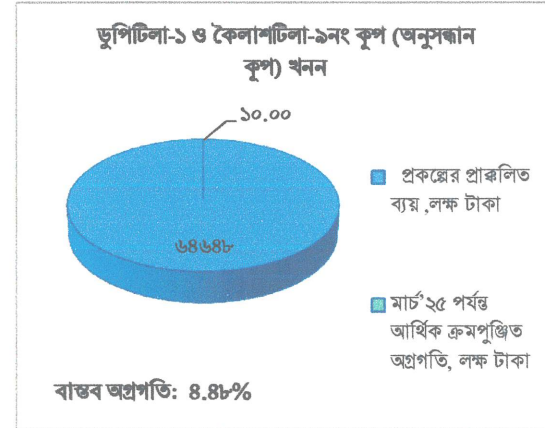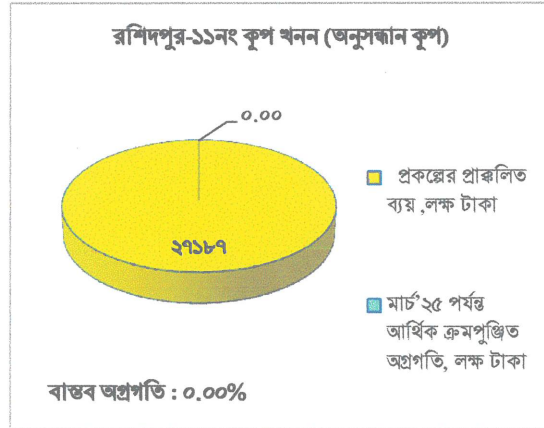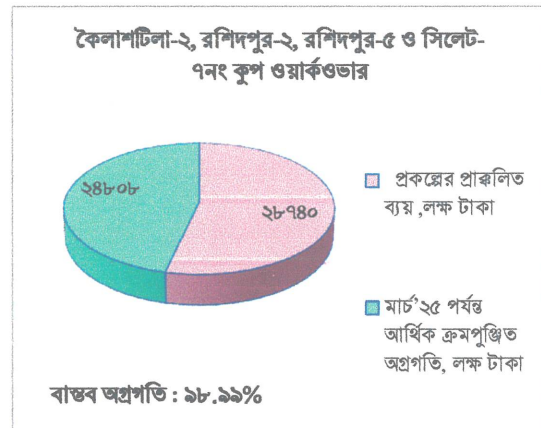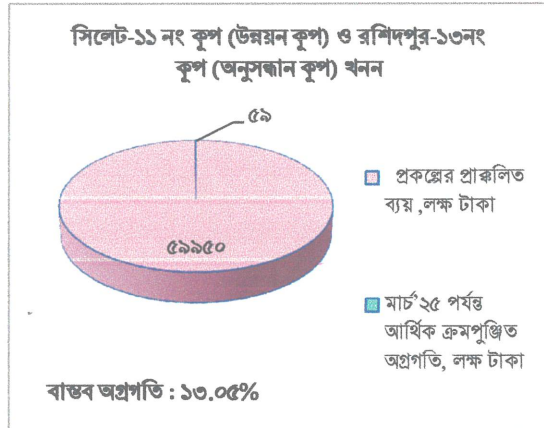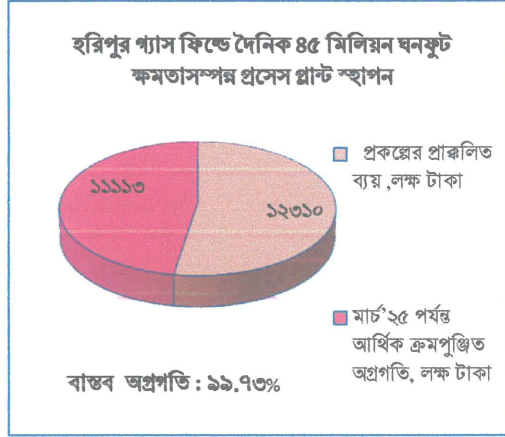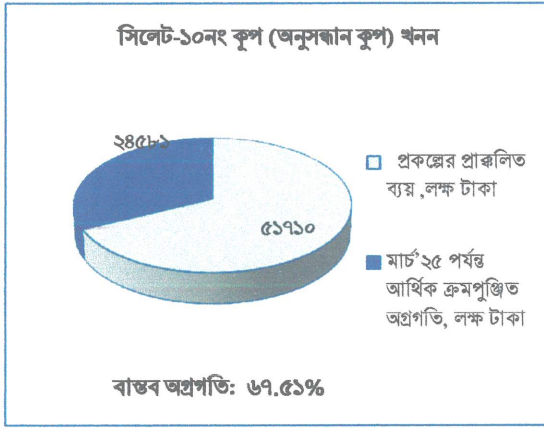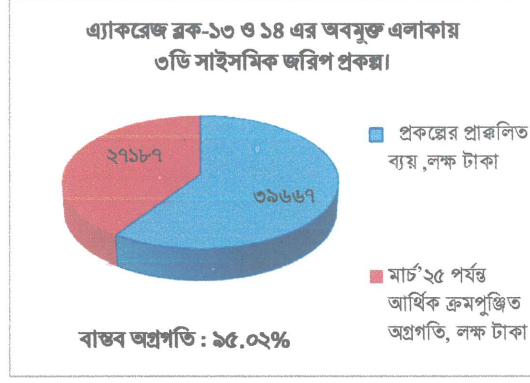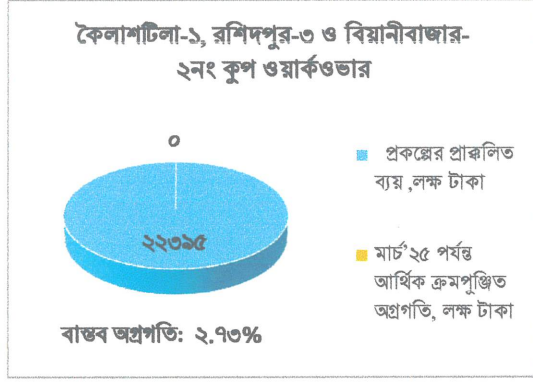

[Signature]

— ২৩ —

[Signature]

উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট

মার্চ ২০২৫

উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট :

- ক) উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড : কৈলাশটিলা-৭নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ ০৭-০৩-২০২৫ তারিখে শুরু করা হয়েছে।
- খ) আগামী দুই মাসে সম্পাদিতব্য গুরুত্বপূর্ণ : কৈলাশটিলা-৭নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।
কাজের তালিকা।
- গ) আগামী দুই মাসে বড় রকমের কোন : নাই।
সমস্যা/সংকটের আশঙ্কা করা হলে তার
বিবরণ



— ৬০ —



জনবলের পরিসংখ্যান

মাসের নাম : মার্চ ২০২৫

জনবলের পরিসংখ্যান :

১। কর্মকর্তা

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫	কর্মরত পদের সংখ্যা
১।	৭৮০০০ (নির্ধারিত)	-
২।	৬৬০০০-৬৮৪৮০-৭১০৫০-৭৩৭২০-৭৬৪৯০	-
৩।	৫৬৫০০-৫৮৭৬০-৬১১২০-৬৩৫৭০-৬৬১২০-৬৮৭৭০-৭১৫৩০-৭৪৪০০	৯
৪।	৫০০০০-৫২০০০-৫৪০৮০-৫৬২৫০-৫৮৫০০-৬০৮৪০-৬৩২৮০-৬৫৮২০-৬৮৪৬০-৭১২০০	৭২
৫।	৪৩০০০-৪৪৯৮০-৪৬৯৭০-৪৯০৯০-৫১৩০০-৫৩৬১০-৫৬০৩০-৫৮৫৬০-৬১২০০-৬৩৯৬০-৬৬৮৪০-৬৯৮৫০	৬৮
৬।	৩৫৫০০-৩৭২৮০-৩৯১৫০-৪১১১০-৪৩১৭০-৪৫৩৩০-৪৭৬০০-৪৯৯৮০-৫২৪৮০-৫৫১১০-৫৭৮৭০-৬০৭৭০-৬৩৮১০-৬৭০১০	৫৫
৭।	২৯০০০-৩০৪৫০-৩১৯৮০-৩৩৫৮০-৩৫২৬০-৩৭০৩০-৩৮৮৯০-৪০৮৪০-৪২৮৯০-৪৫০৪০-৪৭৩০০-৪৯৬৭০-৫২১৬০-৫৪৭৭০-৫৭১০০-৬০৩৯০-৬৩৪১০	-
৮।	২৩০০০-২৪১৫০-২৫৩৬০-২৬৬৩০-২৭৯৭০-২৯৩৭০-৩০৮৪০-৩২৩৯০-৩৪০১০-৩৫৭২০-৩৭৫১০-৩৯৩৯০-৪১৩৬০-৪৩৪৩০-৪৫৬১০-৪৭৯০০-৫০৩০০-৫২৮২০-৫৫৪৭০	২
৯।	২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০	৮৩
১০।	১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০	৪৩
	মোট কর্মকর্তা :	৩৩২

২। কর্মচারী

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫	কর্মরত পদের সংখ্যা
১।	২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০	০০
২।	১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০	০০
৩।	১২৫০০-১৩১৩০-১৩৭৯০-১৪৪৮০-১৫২১০-১৫৯৮০-১৬৭৮০-১৭৬২০-১৮৫১০-১৯৪৪০-২০৪২০-২১৪৫০-২২৫৩০-২৩৬৬০-২৪৮৫০-২৬১০০-২৭৪১০-২৮৭৯০-৩০২৩০	০৭
৪।	১১৩০০-১১৮৭০-১২৪৭০-১৩১০০-১৩৭৬০-১৪৪৫০-১৫১৮০-১৫৯৪০-১৬৭৪০-১৭৫৮০-১৮৪৬০-১৯৩৯০-২০৩৬০-২১৩৮০-২২৪৫০-২৩৫৮০-২৪৭৬০-২৬০০০-২৭৩০০	২৪
৫।	১১০০০-১১৫৫০-১২১৩০-১২৭৪০-১৩৩৮০-১৪০৫০-১৪৭৬০-১৫৫০০-১৬২৮০-১৭১০০-১৭৯৬০-১৮৮৬০-১৯৮১০-২০৮১০-২১৮৬০-২২৯৬০-২৪১১০-২৫৩২০-২৬৫৯০	৫৪
৬।	১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০-২১৩১০-২২৩৮০-২৩৫০০-২৪৬৮০	২২
৭।	৯৭০০-১০১৯০-১০৭০০-১১২৪০-১১৮১০-১২৪১০-১৩০৪০-১৩৭০০-১৪৩৯০-১৫১১০-১৫৮৭০-১৬৬৭০-১৭৫১০-১৮৩৯০-১৯৩১০-২০২৮০-২১৩০০-২২৩৭০-২৩৪৯০	০৪
৮।	৯৩০০-৯৭৭০-১০২৬০-১০৭৮০-১১৩২০-১১৮৯০-১২৪৯০-১৩১২০-১৩৭৮০-১৪৪৭০-১৫২০০-১৫৯৬০-১৬৭৬০-১৭৬০০-১৮৪৮০-১৯৪১০-২০৩৯০-২১৪১০-২২৪৯০	৬৭
৯।	৯০০০-৯৪৫০-৯৯৩০-১০৪৩০-১০৯৬০-১১৫১০-১২০৯০-১২৭০০-১৩৩৪০-১৪০১০-১৪৭২০-১৫৪৬০-১৬২৪০-১৭০৬০-১৭৯২০-১৮৮২০-১৯৭৭০-২০৭৬০-২১৮০০	০৩
১০।	৮৮০০-৯২৪০-৯৭১০-১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০	০
১১।	৮৫০০-৮৯৩০-৯৩৮০-৯৮৫০-১০৩৫০-১০৮৭০-১১৪২০-১২০০০-১২৬০০-১৩২৩০-১৩৯০০-১৪৬০০-১৫৩৩০-১৬১০০-১৬৯১০-১৭৭৬০-১৮৬৫০-১৯৫৯০-২০৫৭০	০
১২।	৮২৫০-৮৬৭০-৯১১০-৯৫৭০-১০০৫০-১০৫৬০-১১০৯০-১১৬৫০-১২২৪০-১২৮৬০-১৩৫১০-১৪১৯০-১৪৯০০-১৫৬৫০-১৬৪৪০-১৭২৭০-১৮১৪০-১৯০৫০-২০০১০	০৫
	মোট কর্মচারী :	১৮৬
	মোট কর্মকর্তা এবং কর্মচারী (৩৩২+১৮৬) :	৫১৮ জন

১ জন কর্মকর্তার অবসরজনিত কারণে গত মাসের প্রতিবেদনের সাথে প্রতিবেদনাধীন মাসে জনবলের সংখ্যার তারতম্য হয়েছে।

— ৬৯ —
