



সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড SYLHET GAS FIELDS LIMITED

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

প্রতিবেদনকাল

ফেব্রুয়ারি ২০২৫



মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন
MONTHLY MIS REPORT

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

ফেব্রুয়ারি ২০২৫

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১)	উৎপাদন পরিসংখ্যান (ফিল্ড/স্থাপনা ভিত্তিক)	১
২)	কোম্পানির সামগ্রিক উৎপাদন পরিসংখ্যান	২
৩)	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণী	৩
৪)	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণী	৪
৫)	বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের আয়/ব্যয়ের তারতম্য বিশ্লেষণ	৫
৬)	আয়-ব্যয় বিবরণী	৬-৭
৭)	বিক্রয় বিবরণী (গ্যাস)	৮
৮)	বিক্রয় বিবরণী (উপজাত তেল)	৯
৯)	গ্রাহকওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণী	১০
১০)	প্রদেয় ভ্যাট এর বিবরণী	১১
১১)	সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা বিবরণী	১২
১২)	মাসের মজুদ বিবরণী	১৩
১৩)	নগদ তহবিল বিবরণী	১৪
১৪)	আয়-ব্যয় এবং বকেয়া পাওনার বিশ্লেষণ বিবরণী	১৫
১৫)	মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী	১৬
১৬)	বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী	১৭
১৭)	কোম্পানির উৎপাদন ও বিক্রয়ের তুলনামূলক চিত্র	১৮-১৯
১৮)	কোম্পানির চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ও চিত্র	২০-২৯
১৯)	উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট	৩০
২০)	জনবলের পরিসংখ্যান	৩১

উৎপাদন পরিসংখ্যান (ফিল্ড/ছাপনা ভিত্তিক)

প্রতিবেদন মাস : ফেব্রুয়ারি ২০২৫

গ্যাস : এম এম এস সি এম (১ কিউ:মি: ৩৫.৩১৪৭ কিউ:ফুট), পানি ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : লিটার, (১৫৮.৯৮৭৩ লিটার = ১ ব্যারেল)

[illegible]

০২-০৬-২০২৪ তারিখ সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় কৈলাশটিলা এলাপাঁজি প্রান্ট চ
কৈলাশটিলা-চনং কুপের উৎপাদন ২৪-০৭-২০২৪ তারিখ হতে শুরু হয়েছে।

নট চালু করার পূর্বে ০১ জুন ২০২৪ তারিখ সকাল ৮:০০ ঘটিকায় এলপিগ্যাস ও সুপার লাইট কনডেনসেট মজুদ ছিল যথাক্রমে ৩৪১৬ ও ৯৬৮৪ লিটার।

নট চালু করার পূর্বে ০১ জুন ২০২৪ তারিখ সকাল ৮:০০ ঘটিকায় এলপিগ্যাস ও সুপার লাইট কনডেনসেট মজুদ ছিল যথাক্রমে ৩৪১৬ ও ৯৬৮৪ লিটার।

কোম্পানির সামগ্রিক উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন মাস : ফেব্রুয়ারি ২০২৫

গ্যাস : এম এম এস সি এম, পানি ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : লিটার										
গ্যাস ক্ষেত্র স্থাপনা	বিদ্যমান কুপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কুপ সংখ্যা	উপাদান	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪-২০২৫)	বিগত মাস (জানুয়ারি ২০২৫)	চলতি মাস (ফেব্রুয়ারি ২০২৫)	বিগত বৎসরের (২০২৩-২০২৪) মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত (২০২৪-২০২৫)	ক্রমপুঞ্জিত জুজু হতে
সিলেট, কৈলাশটিলা, এমএসটিই প্রান্ট অপারেশন, রশিদপুর, বিয়ানীবাজার, ছাতক, রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্রান্ট, ৪০০০ বিপিডি কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্রান্ট, ৩০০০ বিপিডি ক্যাটলাইটিক রিকব্রিং ইউনিট ও কৈলাশটিলা এলপিগিজ প্রান্ট	২৫ টি	১৫ টি	গ্যাস	৩,৭৩২৯	৭৬৪,৬৮১	১১৯,৭১৮	১০৭,৫৫৭	১,০৭৩,৭৭০	৭৬১	৩৯৭,৪৮২,৪৮৫
			পানি	--	--	১১,০৮১,৫৪১	১০,০১৯,২৪০	১৬০,৬৭৫,৪৬৫	৮৭	৪৭০,৩০৬,০৫০
			অপ: তৈল	--	--	--	--	--	--	০৩৬,৫৪১,৫৪১
			অকটেন	-	৬৬,০০০,২৩৯	৪৪২,৮৮৪,৬	৬৬০,৭৬০,৬	--	৪৬১,৬৬২,২২৫	৪৬১,৬৬২,২২৫
			মটর স্পিরিট RON 81	৬১২,৮৪৩.০০০	২০২,৮৭০,৬৮৮	৬৬৬,৬০৬,৭১	২২০,৬১০,৬৭	৬১২,৮৪৩,২২২	৪২৭,৬৭০,৭৪১	৪৬১,৬৬২,২২৫
			ডিজেল	২৬,৮৬৯.০০০	৮,৮৬৬,৭৩৫	০৬৬,৬০৬,৭৩৫	৬৭,৬০৮,৮	৬৭,৬০৮,৮	৬৭,৬০৮,৮	৬৭,৬০৮,৮
			কেরোসিন	৪০,৭০২.০০০	১৩,৮৩১,৬০২	৪০৬,৬৬৬,৭৩৫	৬৭,৬০৮,৮	৬৭,৬০৮,৮	৬৭,৬০৮,৮	৬৭,৬০৮,৮
			কনডেনসেট	৮৫,৭০২	২৯,১৬৩,৮৯১	৪০৬,৬৬৬,৭৩৫	৬৭,৬০৮,৮	৬৭,৬০৮,৮	৬৭,৬০৮,৮	৬৭,৬০৮,৮
			এনজিএল	৬০,১৩০	২০,৭৪৪,৮৫০	৪০৬,৬৬৬,৭৩৫	৬৭,৬০৮,৮	৬৭,৬০৮,৮	৬৭,৬০৮,৮	৬৭,৬০৮,৮
			মটর স্পিরিট RON 89	-	১২৩,০০০,২০৭	৪০৬,৬৬৬,৭৩৫	৬৭,৬০৮,৮	৬৭,৬০৮,৮	৬৭,৬০৮,৮	৬৭,৬০৮,৮
			লাইট ন্যাফথা	১৬৬,৭৭৮	৫৫,০৩৬,৬৩৪	৪০৬,৬৬৬,৭৩৫	৬৭,৬০৮,৮	৬৭,৬০৮,৮	৬৭,৬০৮,৮	৬৭,৬০৮,৮
			রিকব্রমেট	৩২২,৭৪৪	১০৬,৫০৫,৫৫২	৪০৬,৬৬৬,৭৩৫	৬৭,৬০৮,৮	৬৭,৬০৮,৮	৬৭,৬০৮,৮	৬৭,৬০৮,৮
			সুপার লাইট কনডেনসেট	৯৬,১৮৭	-	৪০৬,৬৬৬,৭৩৫	৬৭,৬০৮,৮	৬৭,৬০৮,৮	৬৭,৬০৮,৮	৬৭,৬০৮,৮
			এলপিগিজ	৮০০,৮৮০	৬৮৬,৬৬৬,৭৩৫	৪০৬,৬৬৬,৭৩৫	৬৭,৬০৮,৮	৬৭,৬০৮,৮	৬৭,৬০৮,৮	৬৭,৬০৮,৮

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণী

প্রতিবেদন মাস : ফেব্রুয়ারি ২০২৫

গ্যাস : এমএনএসসিএম, পেট্রোলিয়াম পণ্যাদি : লিটার						
ক্রমিক	উপাদান	চলতি মাস (ফেব্রুয়ারি ২০২৫)	বিগত মাস (জানুয়ারি ২০২৫)	বৈশী/ কম হার (৩ - ৪)	বিগত বৎসরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মাস	বৈশী / কম শতকরা হার (৩ - ৬)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক)	গ্যাস	১০৭.৫৫৭	১১৯.৭১৪	-১২.১৫৭ -১০.১৬%	৯৩.৫৮৬	১৩.৯১১ ১৪.৯৩%
খ)	কনডেনসেট	২,৬১৭,২২৪	২,৭৭৭,০৭৪	-১৫৯,৮৫০ -৫.৭৬%	৩,২০৩,০০৯	-৫৮৫,৭৮৫ -১৮.২৯%
গ)	এনজিএল	১,৬৪০,০০০	১,৮০২,০০০	-১৬২,০০০ -৮.৯৯%	৩৪,০০০	১,৬০৬,০০০ ৪৭২৩.৫৩%
ঘ)	মটর স্পিরিট RON 81	১৯,০১৭,৩২২	১৮,৯৩১,৯৯৭	৮৫,৩২৫ ০.৪৫%	১৭,৪৭৮,৫৮০	১,৫৩৮,৭৪২ ৮.৮০%
ঙ)	ডিজেল	৮৪০,১৬১	৯৯৪,৩৯০	-১৫৪,২২৯ -১৫.৫১%	৫৯৩,৯২৯	২৪৬,২৩২ ৪১.৪৬%
চ)	কেরোসিন	৯৮১,৬৮৯	১,০৫১,৩৬৪	-৬৯,৬৭৫ -৬.৬৩%	১,১৮৮,৫৬২	-২০৬,৮৭৩ -১৭.৪১%
ছ)	মটর স্পিরিট RON 89	১১,৩০২,০১৩	১৩,৬৫৬,১৪১	(২,৩৫৪,১২৮) -১৭.২৪%	৯,১২৯,০৬৩	২,১৭২,৯৫০ ২৩.৮০%
জ)	অকটেন	৬,০৬৮,০৯৭	৭,৪৮৬,২৪৮	(১,৪১৮,১৫১.০০) -১৮.৯৪%	-	দিনের সংখ্যা কম হওয়ায় অকটেন উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
ঝ)	লাইট ন্যাক্সা	৪,২৫৭,৬৭০	৪,৭০৪,৪৫৪	(৪৪৬,৭৮৪) -৯.৫০%	১,৩৬৫,০৭২	২,৮৯২,৫৯৮ ২১১.৯০%
ঞ)	রিফরমেট	৮,৫৬৬,০৬৫	৯,৪৯৩,৭৮০	(৯২৭,৭১৫) -৯.৭৭%	২,৮৩৫,৮৯৭	৫,৭৩০,১৬৮ ২০২.০৬%
ট)	এলসিজি	৭৭৫,৯৪০	৮৮০,৯৬২	(১০৫,০২২.০০) -১১.৯২%	২৪,৭৯৯	৭৫১,১৪১ ৩০২৮.৯২%
ঠ)	সুপার লাইট কনডেনসেট	৮৭৭,০২০	৯৯৬,৩৮৫	-১১৯,৩৬৫ -১১.৯৮%	০	দিনের সংখ্যা কম হওয়ায় সুপার লাইট কনডেনসেট উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।

[Signature]

১৩

[Signature]

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণী

প্রতিবেদন মাসঃ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

গ্যাস : এমএমএসসিএম, পেট্রোলিয়াম পণ্যাদি : লিটার					
ক্রমিক	বিক্রয়	চলতি মাস (ফেব্রুয়ারি ২০২৫)	বিগত মাস (জানুয়ারি ২০২৫)	বেশী/ কম শতকরা হার (৩ - ৪)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
ক)	গ্যাস	১০৬.৩২০	১১৮.৩১০	-১১.৯৯০ -১০.১৩%	চলতি মাসে বিগত মাসের তুলনায় গ্যাস উৎপাদন কম হওয়ায় বিক্রয় কম হয়েছে।
খ)	কনডেনসেট	১,৭১৪.৫০০	৪৭২.৫০০	১,২৪২.০০০ ২৬২.৮৬%	চলতি মাসে চাহিদা বেশী থাকায় কনডেনসেট বিক্রয় গত মাসের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।
ঘ)	মটর স্পিরিট RON 89	১২,০১৭,১৭০	১৪,১২০,২২০	-২,১০৩,০৫০ -১৪.৮৯%	গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে চাহিদা কম থাকায় মটরস্পিরিট বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।
ঙ)	ডিজেল	৭১০,৮৯০	৬৫৪,৪৯০	৫৬,৪০০ ৮.৬২%	গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে ডিজেলের চাহিদা বেশী থাকায় বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
চ)	কেরোসিন	৮৮৫,৯৩০	৯৭৬,৬৫০	-৯০,৭২০ -৯.২৯%	গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে কেরোসিনের চাহিদা কম থাকায় বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।
ছ)	অকটেন	৬,৪৩৩,৫০০	৭,৮৯৭,৭৭০	-১৪৬৪২৭০ -১৮.৫৪%	চাহিদা কম থাকায় গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে অকটেন বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।
জ)	এলপিগিজ	৭৫১,৯৯০	৭৯৭,৯৪০	-৪৫৯৫০.০০ -৬%	চলতি মাসে এলপিগিজ বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।

[Signature]

[Signature]

বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের আয়/ব্যয়ের তারতম্য বিশ্লেষণ

প্রতিবেদনকালীন মাসঃ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস	চলতি মাস	হাস/বৃদ্ধি	হাস/বৃদ্ধি
		জানুয়ারি ২০২৫	ফেব্রুয়ারি ২০২৫		
১	গ্যাস বিক্রয়	৩৭.৭৯	৩৩.৯৬	-৩.৮৩	গ্যাস বিক্রয় হাস পেয়েছে।
২	উপজাত তেল বিক্রয়	২০৮.৯৩	১৮২.০৯	-২৬.৮৩	উপজাত তেল বিক্রয় হাস পেয়েছে।
৩	অপরিমেশোধিত তেল বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	অপরিমেশোধিত তেল বিক্রয় অপরিবর্তিত আছে
ভ্যাট					
৪	গ্যাস	২৫.৯৭	২৩.৩৪	-২.৬৩	ভ্যাট হাস পেয়েছে।
	উপজাত তেল	২৭.৩৩	২৪.২৩	-৩.০৯	ভ্যাট হাস পেয়েছে।
৫	অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয়	১০৪.৭৭	৯৫.৪৩	-৯.৩৪	ব্যয় হাস পেয়েছে।
৬	আয়কর পূর্ব নীট মুনাফা	৯০.৮১	৭৫.৯৯	-১৪.৮৩	মুনাফা হাস পেয়েছে।
৭	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা	৫৩.৬৫	৫৩.৯০	০.২৪	জমা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮	বকেয়া পাওনা আদায়	৪২৫.৪০	৩৮৭.২৮	-৩৮.১২	আদায় হাস পেয়েছে।

আয় - ব্যয় বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : ফেব্রুয়ারি ২০২৫

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস		জানুয়ারি ২০২৫		চলতি মাস		ফেব্রুয়ারি ২০২৫		বিগত বৎসরের মোট (২০২৩-২০২৪)		চলতি বৎসরের ক্রয়পঞ্জীভূত	
		প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট
ক) বিক্রয়													
১	গ্যাস	৩৭.৭৯	৩০.২২	৩৩.৯৬	২২.২২	৩৩.৯৬	২২.২২	৩৩.৯৬	২২.২২	৩৩.৯৬	২২.২২	৩৩.৯৬	২২.২২
২	অকটেন	৭২.৭৭	৪৬.৬৬	৬৯.৩৬	৪৬.৬৬	৬৯.৩৬	৪৬.৬৬	৬৯.৩৬	৪৬.৬৬	৬৯.৩৬	৪৬.৬৬	৬৯.৩৬	৪৬.৬৬
২	মটর স্পিরিট	১২০.৩৯	৬১.১৬	১২০.৩৯	৬১.১৬	১২০.৩৯	৬১.১৬	১২০.৩৯	৬১.১৬	১২০.৩৯	৬১.১৬	১২০.৩৯	৬১.১৬
৩	ডিজেল	৬২.২৫	৩০.৭৮	৬২.২৫	৩০.৭৮	৬২.২৫	৩০.৭৮	৬২.২৫	৩০.৭৮	৬২.২৫	৩০.৭৮	৬২.২৫	৩০.৭৮
৪	কেরোসিন	৭.৬৬	৩.৮৮	৭.৬৬	৩.৮৮	৭.৬৬	৩.৮৮	৭.৬৬	৩.৮৮	৭.৬৬	৩.৮৮	৭.৬৬	৩.৮৮
৫	কনডেনসেট	২.৪৪	১.১১	২.৪৪	১.১১	২.৪৪	১.১১	২.৪৪	১.১১	২.৪৪	১.১১	২.৪৪	১.১১
৬	এন জি এল	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
৭	এল পি জি	০.৪০	০.২০	০.৪০	০.২০	০.৪০	০.২০	০.৪০	০.২০	০.৪০	০.২০	০.৪০	০.২০
৮	মজুদ সময়												
মোট ১ হতে ৭ পর্যন্ত		২৬৮.১৬	১৩২.২২	২৬৮.১৬	১৩২.২২	২৬৮.১৬	১৩২.২২	২৬৮.১৬	১৩২.২২	২৬৮.১৬	১৩২.২২	২৬৮.১৬	১৩২.২২
খ) ব্যয়													
১। সম্পূরক কর ও ভ্যাট													
i	গ্যাস	২৫.৯৭	২১.২২	২৩.৩৬	২১.২২	২৩.৩৬	২১.২২	২৩.৩৬	২১.২২	২৩.৩৬	২১.২২	২৩.৩৬	২১.২২
i	অকটেন												
ii	মটর স্পিরিট	১৫.০৬	৭.৯৭	১৫.০৬	৭.৯৭	১৫.০৬	৭.৯৭	১৫.০৬	৭.৯৭	১৫.০৬	৭.৯৭	১৫.০৬	৭.৯৭
iii	ডিজেল	০.৬৯	০.৬৬	০.৬৯	০.৬৬	০.৬৯	০.৬৬	০.৬৯	০.৬৬	০.৬৯	০.৬৬	০.৬৯	০.৬৬
iv	কেরোসিন	১.০৪	১.০০	১.০৪	১.০০	১.০৪	১.০০	১.০৪	১.০০	১.০৪	১.০০	১.০৪	১.০০
v	কনডেনসেট	০.৪০	০.২০	০.৪০	০.২০	০.৪০	০.২০	০.৪০	০.২০	০.৪০	০.২০	০.৪০	০.২০
vi	এন জি এল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
vii	এল পি জি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট সম্পূরক কর ও ভ্যাট		৫৩.৩০	২১.৬৬	৫৩.৩৬	২১.৬৬	৫৩.৩৬	২১.৬৬	৫৩.৩৬	২১.৬৬	৫৩.৩৬	২১.৬৬	৫৩.৩৬	২১.৬৬

hly

25

1
2
3

প্রতিবেদনকালীন মাস : ফেব্রুয়ারি ২০২৫

— 9 —

[illegible]

বিক্রয় বিবরণী (গ্যাস)

প্রতিবেদনকালীন মাস : ফেব্রুয়ারি ২০২৫

পরিমাণ : এম এম সি এম, মূল্য : কোটি টাকায়

	তিতাস		জালালাবাদ		বাখরাবাদ		কর্ণফুলি		পশ্চিমাঞ্চল		মোট গ্যাস বিক্রয়	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১। চলতি মাস : ফেব্রুয়ারি ২০২৫												
বাজেট	০.০০	০.০০	৫৫.৫২	১৮.৬৬	১১.৫০	৩.৮৬	০.০০	০.০০	২২.৯২	৭.৬৯	৯০.০০	৩০.২২
প্রকৃত	০.০০	০.০০	৫২.৪২	১৭.০৭	৩৫.৭৬	১১.১৭	-	-	১৮.৭৭	৫.৭২	১০৬.৩২	৩৩.৯৬
২। বিগত মাস : জানুয়ারি ২০২৫												
বাজেট	০.০০	০.০০	৫৫.৫২	১৮.৬৬	১১.৫০	৩.৮৬	০.০০	০.০০	২২.৯২	৭.৬৯	৯০.০০	৩০.২২
প্রকৃত	০.০০	০.০০	৫৫.৫২	১৮.৬৬	১১.৫০	৩.৮৬	০.০০	০.০০	২২.৯২	৭.৬৯	৯০.০০	৩০.২২
৩। ক্রমপুঞ্জীভূত : চলতি বৎসর ২০২৪-২০২৫												
বাজেট	০.০০	০.০০	৫৫.৫২	১৮.৬৬	১১.৫০	৩.৮৬	০.০০	০.০০	২২.৯২	৭.৬৯	৯০.০০	৩০.২২
প্রকৃত	০.০০	০.০০	৫৫.৫২	১৮.৬৬	১১.৫০	৩.৮৬	০.০০	০.০০	২২.৯২	৭.৬৯	৯০.০০	৩০.২২
৪। মোট বিগত বৎসর (২০২৩-২০২৪)												
বাজেট	০.০০	০.০০	৫৫.৫২	১৮.৬৬	১১.৫০	৩.৮৬	০.০০	০.০০	২২.৯২	৭.৬৯	৯০.০০	৩০.২২
প্রকৃত	০.০০	০.০০	৫৫.৫২	১৮.৬৬	১১.৫০	৩.৮৬	০.০০	০.০০	২২.৯২	৭.৬৯	৯০.০০	৩০.২২
৫। ক্রমপুঞ্জীভূত : আরম্ভকাল হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত												
বাজেট	০.০০	০.০০	৫৫.৫২	১৮.৬৬	১১.৫০	৩.৮৬	০.০০	০.০০	২২.৯২	৭.৬৯	৯০.০০	৩০.২২
প্রকৃত	০.০০	০.০০	৫৫.৫২	১৮.৬৬	১১.৫০	৩.৮৬	০.০০	০.০০	২২.৯২	৭.৬৯	৯০.০০	৩০.২২
প্রকৃত	১১০৫৭.২১	১৯১২.৮১	২৪৮৪৪৪৪	৮৭৫১৮৭৫	১৯৫১৯৫১	২৭৮৭৮৭৮	৩১০৩১০	৩১০৩১০	২৪৮৪৪৪৪	৮৭৫১৮৭৫	২৪৮৪৪৪৪	৮৭৫১৮৭৫

[Signature]

[Signature]

বিভিন্ন বিবরণী (উপজাত তেল)

প্রতিবেদনকালীন মাস : ফেব্রুয়ারি ২০২৫

পরিমাণ : হাজার লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়

[illegible]

প্রদেয় ভ্যাট এর বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : ফেব্রুয়ারি ২০২৫

(কোটি টাকায়)

এজেন্সীর নাম	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত দেয় অংক	চলতি মাস ফেব্রুয়ারি ২০২৫		চলতি মাসের শেষ তারিখে ক্রমপুঞ্জিত দেয় অংক	উদ্ধৃতি কাল (এজিং)			চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জিত দেয় অংক ২০২৪-২০২৫	চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জিত পরিশোধিত অংক ২০২৪-২০২৫	বিগত বছরের ৩০শে জুন দেয় অংক ২০২৩-২০২৪
		দেয়	পরিশোধিত		ডিসেম্বর ২০২৪	জানুয়ারি ২০২৫	ফেব্রুয়ারি ২০২৫			
হরিপুর ফিল্ড	৬.২০	২.২৪	২.৩৬	৬.০৬	২.৪৬	২.২৪	২.২৪	১৩.২১	১০.২৫	১৩.৭১
কৈলাশটীলা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.১৬	০.১১	০.১৩
এমএলটিই	১১.০০	১১.২৬	৮.২৮	১১.৬০	০.৭১	০.৭১	১১.২৬	৭.২২	৫৫.৭৭	১১৫.০৬
রশিদপুর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
বিয়ানী বাজার	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
আরসিএফপি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪০০০ বিপিডি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট	১২২.৫২	৮৭.৫৭	৫৩.৯০	১১৬.২২	৪২.৭৫	৫৩.৩০	৮৭.৫৭	৩৯০.৬৫	৩৫৯.২৭	৫১১.৭৯

সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : ফেব্রুয়ারি ২০২৫

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণী	বিগত মাস জানুয়ারি ২০২৫	চলতি মাস ফেব্রুয়ারি ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট ২০২০-২০২১	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত	প্রারম্ভ হতে ক্রমপুঞ্জিত
ক) প্রকৃত প্রদান ভিত্তিক :						
১	ভাটি	৫৩.৬৫	৫৩.৬৫	১০৭.৩০	১০৭.৩০	১০৭.৩০
২	আয়কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪	কাস্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫	ডি এস এল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট প্রদান		৫৩.৬৫	৫৩.৬৫	১০৭.৩০	১০৭.৩০	১০৭.৩০

খ) এ্যাকরুয়াল (প্রতিনিয়াল ভিত্তিক)

১	ভাটি	৫৩.৩০	৪৬.৫৭	৯৯.৮৭	৯৯.৮৭	৯৯.৮৭
২	আয়কর	২২.৬২	০.০০	২২.৬২	২২.৬২	২২.৬২
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	৬.২৫	৬.২৫	১২.৫০	১২.৫০	১২.৫০
৪	কাস্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫	ডি এস এল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট		৮২.১৭	৫২.৮২	১৩৫.০০	১৩৫.০০	১৩৫.০০

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)



প্রতিবেদনকালীন মাস : ফেব্রুয়ারি ২০২৫

[illegible]

নগদ তহবিল বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : ফেব্রুয়ারি ২০২৫

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	ক্যাশ ব্যালান্স	ব্যাংক ব্যালান্স				মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালান্স
			চলতি হিসাব	স্বল্প মেয়াদী হিসাব	দীর্ঘ মেয়াদী হিসাব	মোট ব্যাংক ব্যালান্স	
১	চলতি মাসের শেষ তারিখ ২৮-০২-২০২৫	০.০০৩	২.৫২৬	৪২৭.০৭৪	৭৯৯.৬৬৭	১২৮৩.০৭৪	১২৮৩.০৭৭
২	বিগত মাসের শেষ তারিখ ৩১-০১-২০২৫	০.০০২	০.৫৭৬	১১৮.৫২৫	৭৯২.৫২৪	৯১১.৬২৫	৯১১.৬২৭
৩	বিগত বছরের শেষ তারিখ ৩০-০৬-২০২৪	০.০০৫	০.৬২২	৩.৭৪৮	১৩৩১	১৪০২.৩৮৬	১৪০২.৩৯১





বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের গ্যাস ও উপজাত তেল বিক্রয়

আয়-ব্যয় এবং বকেয়া পাওনার বিশ্লেষণ বিবরণী

ক্রমিক নং	মাস	গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ (এম এম সি এম)	উপজাত তেল বিক্রয়ের পরিমাণ (হাজার লিটার)	আয় (কোটি টাকায়)	ব্যয় (এসডি ভ্যাটসহ) (কোটি টাকায়)	বকেয়া পাওনা (কোটি টাকায়)
১	চলতি মাস ফেব্রুয়ারি ২০২৫	১০৬.৩২	২২,৫১৩.৯৮	২১৬.০৫	১৪৩.০০	১১৬৫.৫৫
২	বিগত মাস জানুয়ারি ২০২৫	১১৮.৩১	২৪,৯১৯.৫৬	২৪৬.৭২	১৫৮.০৭	১৩৩৬.৩৪
৩	কম/বেশী (বিগত মাস হতে চলতি মাস)					
ক)	পরিমাণ	-১২.০০	-২৪০৫.৫৮	-৩০.৬৬	-১৫.০৭	-১৭০.৭৯
খ)	পরিমাণ হ্রাস / বৃদ্ধির শতকরা হার (%)	-১০.১৪%	-৯.৬৫%	-১২.৪৩%	-৯.৫৩%	-১২.৭৮%
৪	বিগত বছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪	৮৫.৯৬	২২২৩৯.৭৪	২১৫.৩১	১৩৪.১৫	১০৬৭.৬৫
৫	কম/বেশী (বিগত বছরের চলতি মাস হতে চলতি বছরের চলতি মাস)					
ক)	পরিমাণ	২০.৩৬	২৭৪.২৪	০.৭৫	৮.৮৬	৯৭.৮৯
খ)	পরিমাণ হ্রাস / বৃদ্ধির শতকরা হার (%)	২৩.৬৯%	১.২৩%	০.৩৫%	৬.৬০%	৯.১৭%












মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ বৎসরের বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ: এমএমসিএম, মূল্য: মিলিয়ন টাকায়

মাস	তিতাস		জালালাবাদ		বাখরাবাদ		কর্ণফুলী		পশ্চিমাঞ্চল		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
জুলাই ২৪	০.০০	০.০০	৪৪.৫৩	১৫২.৫৮	৩৭.৫২	১১৭.২৬	০০.০০	০০.০০	৪৫.৮১	৫৭.১৬	১০১.১০	৩২২.৬৭
আগস্ট ২৪	০.০০	০.০০	৫২.৬৮	১৬১.৫৮	৩৮.৫১	১২১.৫৮	০০.০০	০০.০০	৪৫.৮১	৫৭.১৬	১০১.১০	৩২২.৬৭
সেপ্টেম্বর ২৪	০.০০	০.০০	৫১.৬৮	১৬১.৫৮	৩৮.৫১	১২১.৫৮	০০.০০	০০.০০	৪৫.৮১	৫৭.১৬	১০১.১০	৩২২.৬৭
অক্টোবর ২৪	০.০০	০.০০	৫২.৬৮	১৬১.৫৮	৩৮.৫১	১২১.৫৮	০০.০০	০০.০০	৪৫.৮১	৫৭.১৬	১০১.১০	৩২২.৬৭
নভেম্বর ২৪	০.০০	০.০০	৫২.৬৮	১৬১.৫৮	৩৮.৫১	১২১.৫৮	০০.০০	০০.০০	৪৫.৮১	৫৭.১৬	১০১.১০	৩২২.৬৭
ডিসেম্বর ২৪	০.০০	০.০০	৫২.৬৮	১৬১.৫৮	৩৮.৫১	১২১.৫৮	০০.০০	০০.০০	৪৫.৮১	৫৭.১৬	১০১.১০	৩২২.৬৭
জানু ২৫	০.০০	০.০০	৫২.৬৮	১৬১.৫৮	৩৮.৫১	১২১.৫৮	০০.০০	০০.০০	৪৫.৮১	৫৭.১৬	১০১.১০	৩২২.৬৭
ফেব্রু ২৫	০.০০	০.০০	৫২.৬৮	১৬১.৫৮	৩৮.৫১	১২১.৫৮	০০.০০	০০.০০	৪৫.৮১	৫৭.১৬	১০১.১০	৩২২.৬৭
মার্চ ২৫	০.০০	০.০০	৫২.৬৮	১৬১.৫৮	৩৮.৫১	১২১.৫৮	০০.০০	০০.০০	৪৫.৮১	৫৭.১৬	১০১.১০	৩২২.৬৭
এপ্রিল ২৫	০.০০	০.০০	৫২.৬৮	১৬১.৫৮	৩৮.৫১	১২১.৫৮	০০.০০	০০.০০	৪৫.৮১	৫৭.১৬	১০১.১০	৩২২.৬৭
মে ২৫	০.০০	০.০০	৫২.৬৮	১৬১.৫৮	৩৮.৫১	১২১.৫৮	০০.০০	০০.০০	৪৫.৮১	৫৭.১৬	১০১.১০	৩২২.৬৭
জুন ২৫	০.০০	০.০০	৫২.৬৮	১৬১.৫৮	৩৮.৫১	১২১.৫৮	০০.০০	০০.০০	৪৫.৮১	৫৭.১৬	১০১.১০	৩২২.৬৭
সমগ্র	০.০০	০.০০	৫২.৬৮	১৬১.৫৮	৩৮.৫১	১২১.৫৮	০০.০০	০০.০০	৪৫.৮১	৫৭.১৬	১০১.১০	৩২২.৬৭
মোট	০.০০	০.০০	৫২.৬৮	১৬১.৫৮	৩৮.৫১	১২১.৫৮	০০.০০	০০.০০	৪৫.৮১	৫৭.১৬	১০১.১০	৩২২.৬৭

কোম্পানির ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন চিত্র
প্রতিবেদনাধীনঃ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

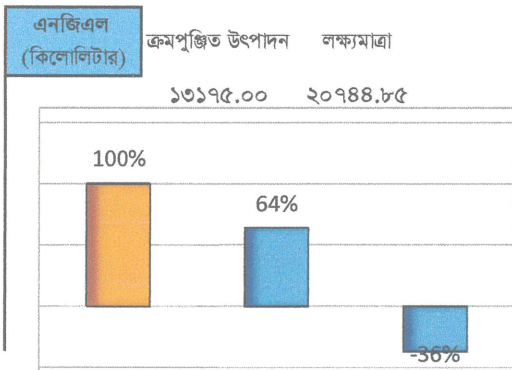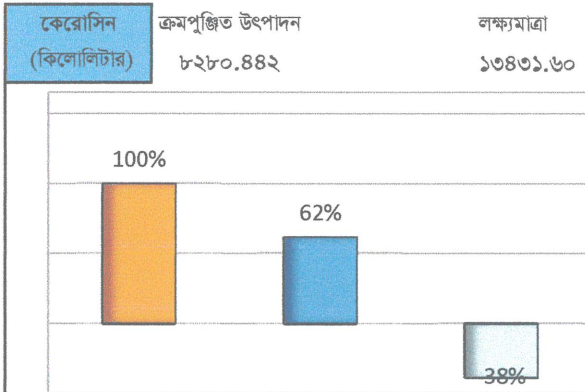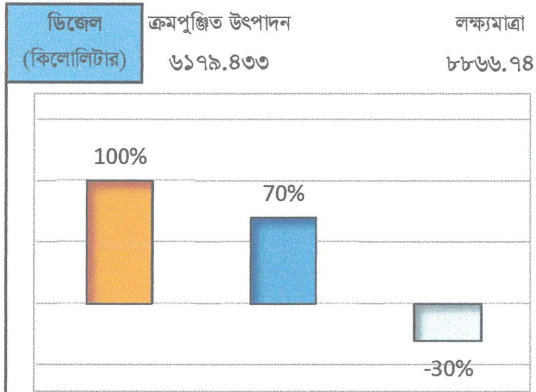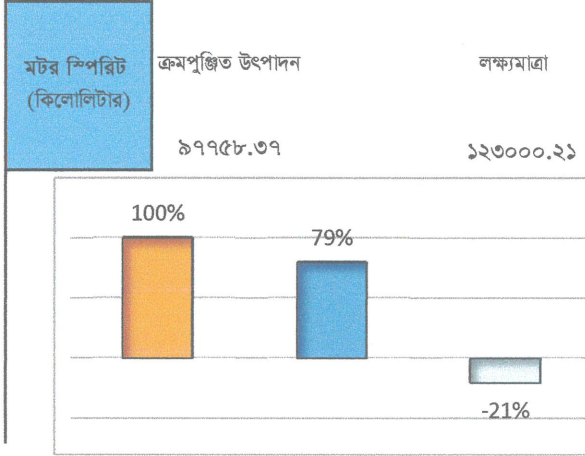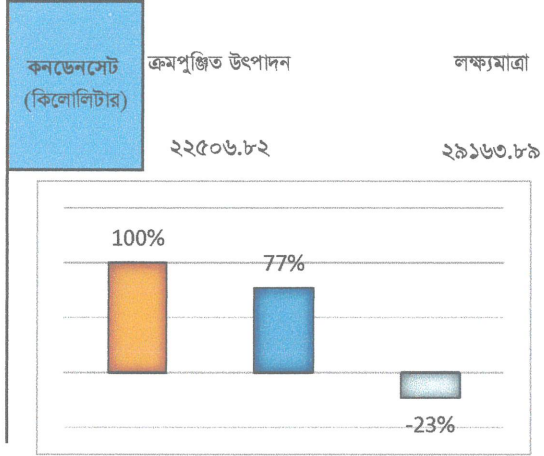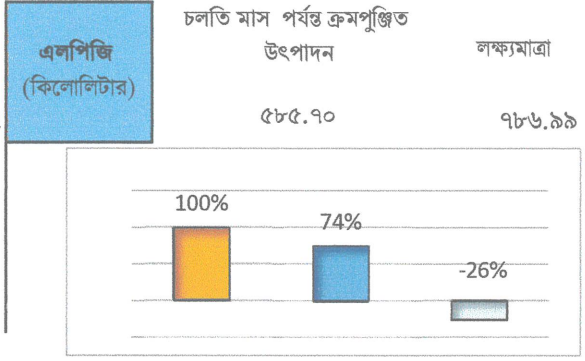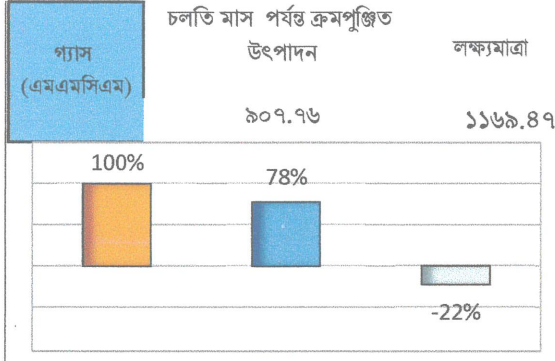

পরিচিতি







লক্ষ্যমাত্রা	
চলতি মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন-	
ঘটতি (-)/বর্ধিত (+)	

Handwritten signature


Handwritten signature

কোম্পানির ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিত বিক্রয় চিত্র

প্রতিবেদনাধীন মাস: ফেব্রুয়ারি ২০২৫

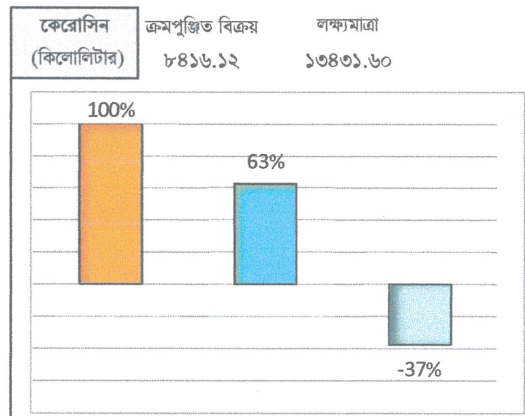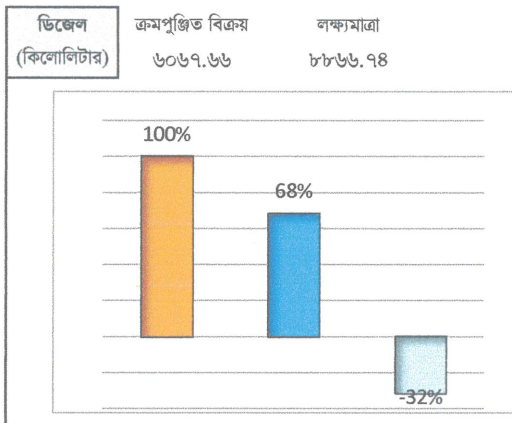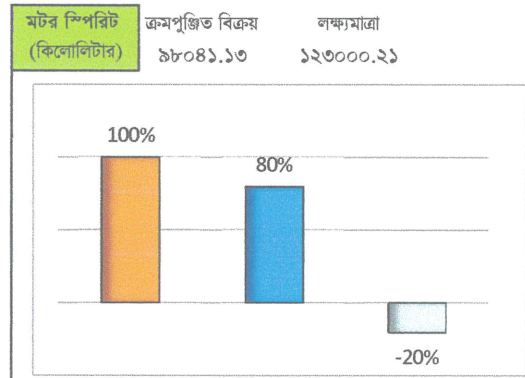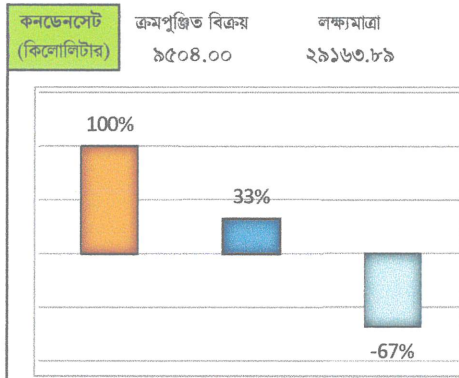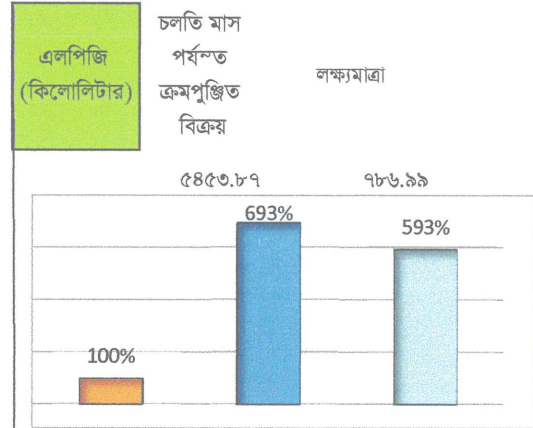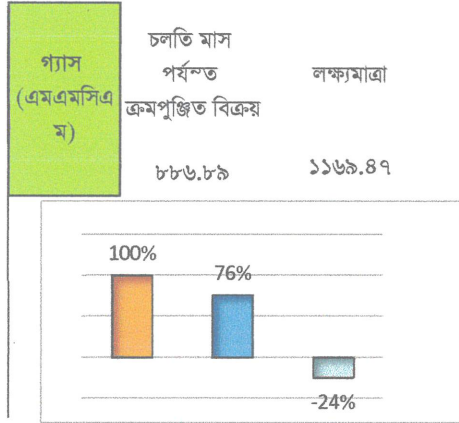

এনজিএল
(কিলোলিটার)



২২

— ২২ —

২২

কোম্পানির চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন:

বর্তমানে এসজিএফএল-এ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত জিডিএফ ও নিজস্ব অর্থায়নে ৩টি, জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়নে ২টি এবং কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৩টি সহ মোট ৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও অগ্রগতি প্রতিবেদন নিম্নরূপ:

ক) প্রকল্পের নাম: এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক জরিপ (১ম সংশোধিত)।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	এ্যাকরেজ ব্লক- ১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় গ্যাস রিজার্ভ ও রিসোর্স মূল্যায়নে অধিকতর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ভবিষ্যত গ্যাস চাহিদা মেটাতে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা; এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় (৮৬৫+১২৯=) ৯৯৪ বর্গকিলোমিটার ৩ডি সাইসমিক জরিপ পরিচালনা করা; কম-বেশী ৮ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত হাইড্রোকার্বন পে-জোন চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করা।					
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (আরডিপিপি অনুযায়ী) ব্যয়: লক্ষ টাকায়	:	স্থানীয় মুদ্রা:	৭৯৫৭.০০	বৈদেশিক মুদ্রা:	৩১৭১০.০০	মোট:	৩৯৬৬৭.০০
৩	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৬-০৮-২০২১ এবং আরডিপিপি: ০৪-১১-২০২৪					
৪	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (আরডিপিপি অনুযায়ী)	:	আরম্ভ: জুলাই ২০২১ সমাপ্তি: জুন ২০২৫					
৫	প্রকল্প অর্থায়ন উৎস	:	নিজস্ব অর্থ এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)					
৬	প্রকল্প পরিচালক	:	প্রকৌ. মোহাম্মদ সুলতানুল বাহার পদবী: প্রকল্প পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক মোবাইল নং-০১৭১৩৩০১০১২ Email: pd3d13-14@sgfl.org.bd					
৭	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ক) অনুমোদনের পর্যায়: প্রকল্পের ডিপিপি ২৬-০৮-২০২১ এবং ১ম সংশোধিত ডিপিপি ০৪-১১-২০২৪ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। খ) আইইই/ইআইএ/ইএমপি স্টাডি: পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE) প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র ২১-০৬-২০২২ তারিখে প্রদান করেছে। গ) সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগ: -এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ডি সাইসমিক ডাটা এ্যাকুইজিশন, প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশনসহ প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগের লক্ষ্যে কোম্পানি পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে BGP Inc, China এর সাথে ২৯-০৬-২০২২ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। -এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর প্রকল্প এলাকায় সর্বমোট ৮৬৫ বর্গকিলোমিটার ডাটা এ্যাকুইজিশন, প্রসেসিং, ইন্টারপ্রিটেশন, পেট্রোফিজিক্যাল এনালাইসিস, স্ট্যাটিক ও ডাইনামিক মডেলিং, হাইড্রোকার্বন রিসোর্স এস্টিমেশন, ফিল্ড ডেভলপম্যান্ট প্লান এবং ১১টি ড্রিলেবল কুপ লোকেশন চিহ্নিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে- যার মধ্যে ডুপিটিলা প্রসপেক্ট-এ ১টি কুপ খননের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ডুপিটিলা-২, সিলেট সাউথ-২, বাতচিয়া-১ ও হারারগঞ্জ-১সহ মোট ৪টি কুপ খনন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে-যা অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত ৮৬৫ বর্গকিলোমিটার এলাকায় অবস্থিত প্রসপেক্টসমূহে সর্বমোট ২৫২৯.১৯ বিসিএফ গ্যাস ও ৮৮.৬৪ মিলিয়ন ব্যারেল তেলের রিসোর্স এস্টিমেট করা হয়েছে। - এছাড়া প্রকল্পের বর্ধিত কুড়িগাঁও (১২৯ বর্গকিলোমিটার) এলাকায় সার্ভিস প্রোভাইডার BGP Inc, China কর্তৃক গত ২১-১১-২০২৪ তারিখ হতে ৩ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদনের লক্ষ্যে সার্ভে, শট-হোল ড্রিলিং ও এক্সপ্লোসিভ লোডিং শুরু করে ০৯-০১-২০২৫ তারিখে ডাটা এ্যাকুইজিশন/রেকর্ডিং সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে এ্যাকুইজিশনকৃত ডাটা প্রসেসিং এর কাজ চলমান রয়েছে। ঘ) স্থানীয় পরামর্শক সেবা: প্রকল্পের বর্ধিত কুড়িগাঁও (১২৯ বর্গকিলোমিটার) স্ট্রাকচারের জন্য আহবানকৃত ইওআই (Expression of interest) এর বিপরীতে ৩ ক্যাটাগরিতে ভূপদার্থবিদ (Geophysicist), ভূতত্ত্ববিদ (Geologist) ও পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার (Petroleum Engineer) এর প্রতি ক্যাটাগরিতে ১জন করে মোট ৩ জন স্থানীয় ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ করার লক্ষ্যে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে ১ জন ব্যক্তি পরামর্শকের সাথে ০৩-১২-২০২৪ তারিখ ও অপর ২ জন ব্যক্তি পরামর্শকের সাথে ০১-০১-২০২৫ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তি পরামর্শকদের সেবা গ্রহণ করা হচ্ছে।					
৮	আর্থিক অগ্রগতি	:	চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)					
			বিগত বছরের জুন'২৪ পর্যন্ত ব্যয়	জুন'২৪ পর্যন্ত আরডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	এডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	ব্যয়		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
			স্থ: মূ: ২৬৪৪.০০ বৈ: মূ: ১১৫৪৫.০০ মোট: ১৪১৮৯.০০	আর্থিক: ৩৫.৭৭% বাস্তব: ৮০.৮১%	স্থ: মূ: ২২৩৫.০০ বৈ: মূ: ১০৭৬৫.০০ মোট: ১৩০০০.০০	প্রতিবেদন মাস ফেব্রুয়ারি ২০২৫ স্থ: মূ: ৩.৭৮ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ৩.৭৮	চলতি বছরের মোট (২০২৪-২০২৫) স্থ: মূ: ২২২৯.৬৩ বৈ: মূ: ১০৭৬৫.০০ মোট: ১২৯৯৪.৬৩	স্থ: মূ: ৪৮৭৩.৬৩ বৈ: মূ: ২২৩১০.০০ মোট: ২৭১৮৩.৬৩
৯	অগ্রগতির হার	:	আর্থিক		বাস্তব			
	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	:	৯৯.৯৬%		১৩.৭২%			
	প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির শতকরা হার	:	৬৮.৫৩%		৯৪.৫৩%			

২/২

-২০-

২/২

খ) প্রকল্পের নাম: সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন, ১ম সংশোধিত

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট স্ট্রাকচারে নর্দান ক্রোজারে ২৫৭৬ মিটার গভীরতায় একটি অনুসন্ধান কূপ (সিলেট-১০) এবং এ কূপের আওতায় অধিকহারে গ্যাস উত্তোলনের জন্য মূল ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩৩০০ (± ১০০) মিটার গভীরতায় আরো একটি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ (সিলেট-১০এক্স) খনন করা;	
			সিলেট-১০ ও সিলেট-১০এক্স কূপ খনন করত: ১০৬ বিসিএফ গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি এবং প্রথম ৫ বছর দৈনিক প্রায় ৪০ (সিলেট-১০: ২০ ও সিলেট-১০এক্স: ২০) মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছর দৈনিক প্রায় ৩৫ (সিলেট-১০: ২০ ও সিলেট-১০এক্স: ১৫) মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক প্ররণ করা।	
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (আরডিপিপি অনুযায়ী) ব্যয়: লক্ষ টাকায়	:	স্থানীয় মুদ্রা: বৈদেশিক মুদ্রা: মোট:	১৩৯০১.০০ ৩৭৮০৯.০০ ৫১৭১০.০০
৩	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৩-১২-২০২১ এবং আরডিপিপি: ২৭-০৫-২০২৪	
৪	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (আরডিপিপি অনুযায়ী)	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২১ সমাপ্তি: জুন ২০২৫	
৫	প্রকল্প অর্থায়ন উৎস	:	নিজস্ব অর্থ এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)	
৬	প্রকল্প পরিচালক	:	প্রকৌ. আব্দুল কাদের ভূঞা পদবী: প্রকল্প পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক মোবাইল নং-০১৭৩০০০৬৯৫৩ Email: pdsylhet10@sgfl.org.bd	
৭	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায় : সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর “সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন” শীর্ষক প্রকল্পটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে ২৩-১২-২০২১ তারিখে অনুমোদিত হয়। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে ২৭-০৫-২০২৪ তারিখে অনুমোদিত ১ম আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় মোট ৫১৭১০.০০ লক্ষ টাকা [জিডিএফ: ১৯৭১৭.০০ লক্ষ টাকা ও কোম্পানির নিজস্ব: ৩১৯৯৩.০০ লক্ষ টাকা] এবং বাস্তবায়নকাল ০১ অক্টোবর ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত। ভূমি অধিগ্রহণ: প্রকল্পের আওতায় ৮.৪৮১ একর জমি অধিগ্রহণ কাজ গত ২২-০৯-২০২২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: মোট তিনজন বৈদেশিক পরামর্শক সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প সাইটে কাজ করেছেন। ইআইএ (EIA) স্টাডি ও পরিবেশগত ছাড়পত্র: পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ২০-০৮-২০২৪ তারিখে পরবর্তী ১ বছর মেয়াদের জন্য প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন সনদ পাওয়া গেছে। জিটিও : বাপেক্স হতে জিটিও (Geological Technical Order) সংগ্রহ করা হয়েছে। এরিয়া সার্ভে : এরিয়া সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। খনন ঠিকাদার নিয়োগ: - সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্পের আওতায় টার্গ-কি ভিত্তিতে কূপ খনন অপারেশন, মালামাল সরবরাহ, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য সিসিজিপি'র অনুমোদনক্রমে নির্বাচিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান Sinopec International Petroleum Service Corporation, China-এর সাথে ০৭-০৯-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। টার্গ-কি চুক্তিভুক্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে প্রকল্পের সংযোগ সড়ক নির্মাণ, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্প সাইটে রিগ ও যন্ত্রপাতি মোবাইলাইজেশন, রিগ আপ, টেস্টিং, কমিশনিং ইত্যাদি সম্পন্ন করে গত ২৪-০৬-২০২৩ তারিখে খনন কাজ শুরু (স্পাড-ইন) করে ২৫৭৬ মিটার গভীরতা পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। - কূপ খনন সম্পন্ন করে ২৬-১১-২০২৩ তারিখে ১ম ডিএসটি চলাকালীন দৈনিক ২২-২৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে ফ্লো এর বিপরীতে ওয়েলহেড প্রেসার ৩২৫০ পিএসআইজি পাওয়া গেছে। উক্ত কূপ হতে দৈনিক ১৫-২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। ০২-১২-২০২৩ তারিখে ২২৮৯-২৩০০ মিটার গভীরতার স্তরে ২য় ডিএসটি অপারেশন পরিচালনা করা হলে উক্ত স্তরে গ্যাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়। পরবর্তী ১৩৯৭-১৪৪৫ মিটার জোনে ০৮-১২-২০২৩ তারিখে ৩য় ডিএসটি পরিচালনা করা হয়। উক্ত জোনে পরীক্ষাকালে ক্রুড অয়েলের উপস্থিতি জানা যায়। ২ ঘণ্টা ১৭ মিনিটে পানি ও স্লাজ সহ সেলফ প্রেসারে প্রতি ঘণ্টায় ৩৫ ব্যারেল ক্রুড অয়েলের পরিমাণ ১২.২৪০ লিটার (৭৭ ব্যারেল), যা সারফেস gauge ট্যাংকে ধারণ করা হয়। উক্ত ক্রুড অয়েলের রাসায়নিক, ভৌত ধর্ম পরীক্ষণ সম্পন্নকরণ ও ফলাফল রিপোর্ট ইন্টার্ন রিফাইনারী (ERL), পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (BUET) থেকে সংগ্রহ করা হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা সম্পন্ন হলে তেলের মজুদ জানা যাবে। গত ১৮-১২-২০২৩ তারিখে ২২১৮-২২২৩ মিটার গভীরতায় Perforation করে ৪র্থ ডিএসটি করা হলে সেখানেও গ্যাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়। বটম ইন্টারভাল ২৫৪০-২৫৬৫ মিটার জোনের গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যে Well Completion এর কাজ ০৭-০২-২০২৪ তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে। সিকিউরিটি পোস্টসহ আনসার সেড নির্মাণ, ডেইন নির্মাণ ও সীমানা ফেলিং নির্মাণ: প্রকল্প সাইটে সিকিউরিটি পোস্টসহ আনসার সেড নির্মাণ ও সীমানা ফেলিং নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গ্যাস প্রাপ্তি সাপেক্ষে গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ: - গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের রাইট অফ ওয়ে ব্যবহারের অনুমোদনের জন্য সড়ক বিভাগ, সিলেট বরাবর ০৯-১১-২০২২ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	

১/১১ - ২০ - ২০২৩

গ্যাস প্রাপ্তি সাপেক্ষে গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ:

- গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের রাইট অফ ওয়ে ব্যবহারের অনুমোদনের জন্য সড়ক বিভাগ, সিলেট বরাবর ০৯-১১-২০২২ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২৮-০৯-২০২৪ তারিখে জেলা প্রশাসক, সিলেট সরেজমিনে পাইপলাইন স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত রাইট-অফ-ওয়ে পরিদর্শন করেন। সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক প্রথম এসএমডিটি লেনসহ ০৪ লেনে উন্নতিকরণ প্রকল্প দপ্তরের সাথে ৩০-১০-২০২৪ তারিখের বৈঠকে সওজ এর আওতাধীন জমিতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে রাইট-অফ-ওয়ে ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।
- সিলেট-১০নং কূপ হতে হরিপুর ফিল্ডের প্রসেস প্লান্ট পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ৪ইঞ্চি ব্যাসের উচ্চচাপ গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ কাজের জন্য এনসিটি পদ্ধতিতে নির্বাচিত দরদাতা GasMin Limited, Dhaka এর সাথে ২৮-০৩-২০২৪ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান GasMin Limited এর মাধ্যমে পাইপলাইন নির্মাণের মালামালের ১ম শিপমেন্ট ২৪-১০-২০২৪ তারিখ এবং ২য় শিপমেন্টে মালামাল ১১-১১-২০২৪ তারিখে প্রকল্প সাইটে এসে পৌঁছেছে।
- ১২-১১-২০২৪ তারিখ থেকে হরিপুর ফিল্ডের প্রসেস প্লান্ট থেকে সিলেট-৭নং কূপ লোকেশন পর্যন্ত প্রায় ৩.০ কিলোমিটার এবং কূপ লোকেশন হতে সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক পর্যন্ত ৬০০ মিটার রাস্তায় পাইপলাইন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। মোট ১০ কিলোমিটার পাইপলাইনের মধ্যে ৪ কিলোমিটার জায়গা এসজিএফএল এর নিজস্ব রাস্তা ব্যবহার করা হয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের রাইট অফ ওয়ে ব্যবহার করার অনুমতি না পাওয়ায় বিকল্প হিসেবে কাপনা নদীর তীর বরাবর নদীর শূকনা অংশ দিয়ে সিলেট-৩ নং ও সিলেট-৬নং কূপের রুট ব্যবহার করে পাইপলাইন নির্মাণ করা হচ্ছে। বর্তমানে পাইপলাইন স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

পিপিপি'র সভা:

বিশেষ বিধান এর আওতায় বাস্তবায়নধীন সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্পের জন্য ০৭-১১-২০২১, ২০-১২-২০২১, ০২-০৩-২০২২, ০৬-০৪-২০২২, ০২-০৬-২০২২, ২৯-০৬-২০২২, ০৬-০৩-২০২৪, ০১-০৪-২০২৪, ১১-০৭-২০২৪ ও ১৮-০৭-২০২৪ তারিখে প্রস্তাবনা প্রক্রিয়াকরণ কমিটি (পিপিপি)'র মোট ১০টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পিআইসি'র সভা:

২০-০৩-২০২২, ২৫-০৭-২০২২, ২২-১২-২০২২, ০৩-০৫-২০২৩, ২০-০৮-২০২৩, ২২-১১-২০২৩, ২৩-০৫-২০২৪, ০২-০৯-২০২৪ ও ৩১-১২-২০২৪ তারিখে পিআইসি'র মোট ৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পিএসসি'র সভা:

০৩-০৪-২০২২, ২৪-০৮-২০২২, ০৮-০১-২০২৩, ১৭-০৫-২০২৩, ২২-০৮-২০২৩, ২৭-১২-২০২৩, ০৮-০২-২০২৪, ২১-০৮-২০২৪, ০১-১২-২০২৪ ও ২৭-০২-২০২৫ তারিখে পিএসসি'র মোট ১০টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সিলেট-১০ এক্স নং কূপ:

- সিলেট-১০নং কূপটি সফলভাবে খননের মাধ্যমে কয়েকটি লেয়ারে গ্যাস ও তেলের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়ায় এ কূপের আওতায় অধিক হারে গ্যাস উত্তোলনের লক্ষ্যে ৩৩০০ (±১০০) মিটার গভীরতায় মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ (সিলেট-১০এক্স) খননের জন্য প্রকল্পের ১ম সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (১ম আরডিপিপি) ২৭-০৫-২০২৪ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে অনুমোদিত হয়েছে।
- নতুন একটি গ্যাস কূপ সিলেট-১০এক্স এর জন্য "মালামাল প্রকৌশল সেবা, মোবাইলাইজেশন ও ডি-মোবাইলাইজেশন ইত্যাদিসহ খনন অপারেশন" কাজের ক্রয় প্রক্রিয়া ও পরিকল্পনা পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে "আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র (এক ধাপ দুই খাম)" পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক টেন্ডার ডকুমেন্টস তৈরীর কাজ শেষে ২১-১০-২০২৪ তারিখে কোম্পানির পরিচালক পর্যদের ৬৪০তম সভায় উপস্থাপন করা হলে বোর্ড প্রস্তুতকৃত দরপত্র দলিলটির প্রত্যাশা অনুমোদন করে। বোর্ডের প্রত্যাশা অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ২১-১০-২০২৪ তারিখে সিপিটিইউ, পেট্রোবাংলা, এসজিএফএল এর ওয়েবসাইট এবং বহুল প্রচারিত দুটি বাংলা ও ইংরেজি জাতীয় পত্রিকায় উক্ত দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশিত দরপত্র দলিল বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ২৮-১০-২০২৪ হতে ১৭-১২-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত দরপত্র বিক্রয় করা হয়েছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ১৮-১২-২০২৪ তারিখে দরপত্র গ্রহণ ও উন্মুক্তকালে দুটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান দরপত্র জমা প্রদান করেছে।
- এসজিএফএল-এর বোর্ডে অনুমোদনক্রমে ২৩-০১-২০২৫ তারিখে কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নে উত্তীর্ণ সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), PR China এর অনুকূলে Notification of Award (NoA) জারী করা হয়েছে। ১৯-০২-২০২৫ তারিখে ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পাদন করা হয়েছে। খনন সাইটে মবাইলাইজেশনের জন্য ২৫-০২-২০২৫ তারিখে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

চ	আর্থিক অগ্রগতি	:	চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)					
			বিগত বছরের জুন'২৪ পর্যন্ত ব্যয়	জুন'২৪ পর্যন্ত আরডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	এডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	ব্যয়		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
						প্রতিবেদন মাস ফেব্রুয়ারি ২০২৫	চলতি বছরের মোট (২০২৪-২০২৫)	
			স্বা: মূ: ৩৫২১.১৭ বৈ: মূ: ১৭৫৮৪.৯৬ মোট: ২১১০৬.১৩	আর্থিক: ৪০.৮২% বাস্তব: ৪১.৪৫%	স্বা: মূ: ৬৪২৬.০০ বৈ: মূ: ৭২৪২.০০ মোট: ১৩৬৬৮.০০	স্বা: মূ: ০.৯৫ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.৯৫	স্বা: মূ: ২৫৭৬.৪০ বৈ: মূ: ৮৮৩.৬৫ মোট: ৩৪৬০.০৫	স্বা: মূ: ৬০৯৭.৫৭ বৈ: মূ: ১৮৪৬৮.৬১ মোট: ২৪৫৬৬.১৮
৯	অগ্রগতির হার	:				আর্থিক	বাস্তব	
	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	:				২৫.৩১%	২৪.২৩%	
	প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির শতকরা হার	:				৪৭.৫১%	৬৫.৬৮%	

গ) প্রকল্পের নাম: হরিপুর গ্যাস ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন (১ম সংশোধিত)।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য হরিপুর গ্যাস ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন; হরিপুর ফিল্ডের কুপসমূহ হতে উত্তোলিত গ্যাস প্রসেস করে তা সরবরাহের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।		
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (আরডিপিপি অনুযায়ী) ব্যয়: লক্ষ টাকায়	:	স্থানীয় মূদ্রা: বৈদেশিক মূদ্রা: মোট:	২৩০৮.০০ ১২৮৭২.০০ ১৫১৮০.০০	
৩	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ৩১-০৮-২০২২ এবং আরডিপিপি: ০৯-১২-২০২৪		
৪	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (আরডিপিপি অনুযায়ী)	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২২ সমাপ্তি: জুন ২০২৫		
৫	প্রকল্প অর্থায়ন উৎস	:	নিজস্ব অর্থ এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)		
৬	প্রকল্প পরিচালক	:	প্রকৌ. সুমন বিকাশ দাস পদবী: প্রকল্প পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক মোবাইল নং- ০১৭৩০০০৬৯৫৮ Email: sbdasmste@gmail.com		
৭	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ক) প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়: সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন “হরিপুর গ্যাস ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ৩১-০৮-২০২২ তারিখে ডিপিপি এবং ০৯-১২-২০২৪ তারিখে ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫১৮০.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিডিএফ ফান্ড হতে ১১০৭৯.০০ লক্ষ টাকা এবং কোম্পানীর নিজস্ব অর্থায়ন ৪১০১.০০ লক্ষ টাকা। খ) প্লান্ট স্থাপন কাজ: - প্রসেস প্লান্ট নির্মাণের লক্ষ্যে ইপিসি ঠিকাদার ZICOM EQUIPMENT PTE LTD- এর সাথে ০৩-১০-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ০৮-০২-২০২৩ তারিখে প্রকল্পের ইপিসি কাজের বিপরীতে এলসি স্থাপন করা হয়। ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত Design & Drawing রিভিউ কাজ এবং রশিদপুর গ্যাস ফিল্ড হতে স্থানান্তরযোগ্য ইকুইপমেন্ট সমূহের Dismantling/Relocation কাজ এবং মালামাল শিপমেন্ট কার্যক্রম শেষ হয়েছে। - প্রকল্পের আওতায় ইপিসি ঠিকাদার কর্তৃক প্রসেস প্লান্ট স্থাপন কাজ ০২-১০-২০২৪ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। ১৭-১১-২০২৪ তারিখ হতে ৩০-১১-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্লান্ট কমিশনিং এবং ০১-১২-২০২৪ হতে ০৭-১২-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্লান্টের টেস্ট রান সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ইপিসি ঠিকাদার কর্তৃক নবনির্মিত প্রসেস প্লান্ট বিষয়ক অন-সাইট প্রশিক্ষণ ১৫-০১-২০২৫ তারিখে শেষ হয়েছে। Acceptance এর পর ০৮-১২-২০২৪ তারিখ হতে আলোচ্য প্রসেস প্লান্ট এসজিএফএল এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে এবং দৈনিক কমবেশি ১১.৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস প্রসেস করে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। গ) বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: প্রকল্পের কার্যাদি সুষ্ঠু তদারকি ও বুঝে নেয়ার স্বার্থে ৩ জন বৈদেশিক পরামর্শক (Process Engineer, Mechanical Engineer এবং Welding Inspector) সংশ্লিষ্ট কাজে তদারকি ও পরামর্শ সেবা প্রদান করেছেন। বর্তমানে ১জন বৈদেশিক পরামর্শক প্লান্টের কমিশনিং কাজে তদারকি ও পরামর্শ সেবা প্রদান করছেন। ঘ) EIA স্টাডি ও পরিবেশগত ছাড়পত্র: পরিবেশ অধিদপ্তর হতে প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান EQMS Consulting Limited, Dhaka কর্তৃক ইআইএ সমীক্ষা কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে, সমীক্ষা প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ০২-০৮-২০২৩ তারিখ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং উক্ত ছাড়পত্র ০১-০৮-২০২৪ তারিখ হতে ১ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়েছে।		
৮	আর্থিক অগ্রগতি	:	চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)		
			বিগত বছরের জুন’২৪ পর্যন্ত ব্যয়	জুন’২৪ পর্যন্ত ডিপিপি’র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	এডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫) ব্যয়
			স্থ: মু: ৩১৮.০০ বৈ: মু: ৭২১২.০০ মোট: ৭৫৩০.০০	আর্থিক: ৬১.১৭% বাস্তব: ৭৭.৬৩%	স্থ: মু: ১৯৫৬.০০ বৈ: মু: ২৩৯৪.০০ মোট: ৪৩৫০.০০
					প্রতিবেদন মাস ফেব্রুয়ারি ২০২৫ স্থ: মু: ০.০০ বৈ: মু: ০.০০ মোট: ০.০০
					চলতি বছরের মোট (২০২৪-২০২৫) স্থ: মু: ১৩৫৫.৪৩ বৈ: মু: ২২২৭.১৫ মোট: ৩৫৮২.৫৮
					স্থ: মু: ১৬৭৩.৪৩ বৈ: মু: ৯৪৩৯.১৫ মোট: ১১১১২.৫৮
৯	অগ্রগতির হার	:	আর্থিক	বাস্তব	
	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	:	৮২.৩৬%	২১.৩৮%	
	প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির শতকরা হার	:	৭৩.২১%	৯৯.০১%	

১৬ - ২৬ - ২০২৪

ঘ) প্রকল্পের নাম: কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭নং কূপ ওয়ার্কওভার, ১ম সংশোধিত

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭নং বন্ধ কূপসমূহ ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে পুনঃউৎপাদনে আনয়ন; ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭নং কূপসমূহ হতে প্রথম ৫ বছরে ৫৪ বিসিএফ এবং পরবর্তী ৫ বছরে ৪১ বিসিএফ অর্থাৎ ১০ বছরে আনুমানিক ৯৫ বিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করে দেশের জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।			
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (আরডিপিপি অনুযায়ী) ব্যয়: লক্ষ টাকায়	:	স্থানীয় মূদ্রা:	২১৯৭৭.০০	বৈদেশিক মূদ্রা:	৫৮৩১.০০
			মোট:	২৭৮০৮.০০		
৩	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৯-০১-২০২৩ এবং আরডিপিপি: ১৯-১২-২০২৪			
৪	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (আরডিপিপি অনুযায়ী)	:	আরম্ভ: জানুয়ারি ২০২৩ সমাপ্তি: জুন ২০২৫			
৫	প্রকল্প অর্থায়ন উৎস	:	নিজস্ব তহবিল			
৬	প্রকল্প পরিচালক	:	ড. মো: ফরহাদুজ্জামান পদবী: প্রকল্প পরিচালক ও ব্যবস্থাপক মোবাইল নং-০১৭১৬৪২৪১৪০ Email: farhadgeo@gmail.com			
৭	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ক) অনুমোদনের পর্যায়: প্রকল্পের ডিপিপি ২৯-০১-২০২৩ তারিখে এবং ১৯-১২-২০২৪ তারিখে ১ম সংশোধিত ডিপিপি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। খ) মালামাল ক্রয়/সংগ্রহ: বৈদেশিক মালামাল ৬ লট (লট-১: ডাউনহোল কমপ্লিশন ইকুইপমেন্ট, লট-২: মাড কেমিক্যালস, লট-৩: প্যাকার মিলিং টুলস, লট-৪: ওয়েলহেড এন্ড এক্সমাস-ট্রি, লট-৫: টিউবিং এন্ড এক্সেসরিজ, লট-৬: ব্রিজ প্লাগ) ক্রয় করত: এসজিএফএল ভান্ডারে গ্রহণ করা হয়েছে। গ) বৈদেশিক পরামর্শ সেবা: ওয়ার্কওভার সাইটে বৈদেশিক পরামর্শক কর্মরত আছে। ঘ) ইআইএ সম্পাদন: প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা হতে অবস্থানগত ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে। ঙ) থার্ড পার্টি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস: সিমেন্টিং, ডিএসটি, ওয়ারারলাইন লগিং এবং স্লিকলাইন এর বাস্তব কাজ কূপ সাইটে চলমান। চ) ওয়ার্কওভার অপারেশন: কৈলাশটিলা-২: কৈলাশটিলা-২নং কূপে ২৭-০৬-২০২৩ তারিখে ওয়ার্কওভার শুরু করে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতঃ ডিপার হরাইজেন হতে (৩১২৬-৩১৩০ মিটার গভীরতা) ২৩-১১-২০২৩ তারিখ থেকে দৈনিক ৬.২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা হয় এবং বর্তমানে উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। রশিদপুর-২: রশিদপুর-২নং কূপে ০৩-১২-২০২৩ তারিখে ওয়ার্কওভার শুরু করে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতঃ আপার গ্যাস স্যান্ড টপ জোন (পারফোরেশন ১৩৯১.৩-১৩৯৪.৩ ও ১৪০৩.৫-১৪০৭ মিটার গভীরতায়) হতে ০৯-০২-২০২৪ তারিখ থেকে দৈনিক ৮.৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা হয় এবং বর্তমানে উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। রশিদপুর-৫: ২৫-০৩-২০২৪ তারিখ স্পাড-ইন করত: ২৮৬০ মিটার পর্যন্ত হোল ক্লিন করে ওয়ারারলাইন লগিং করা হয়েছে। ১৮-০৪-২০২৪, ০৪-০৫-২০২৪ ও ০৬-০৫-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনটি ডিএসটি সম্পন্ন করা হয়। উক্ত টেস্টে বাণিজ্যিকভাবে গ্যাস উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত গ্যাসের ফ্লো পাওয়া যায়নি বিধায় কারিগরি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কূপটিকে ওয়াটার ডিসপোজাল ওয়েল হিসেবে ১৭-০৫-২০২৪ তারিখে কমপ্লিট করা হয়েছে। সিলেট-৭: সিলেট-৭নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ ১৬-০৭-২০২৪ তারিখে শুরু (স্পাড-ইন) করে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতঃ আপার বোকাবিল জোন (১১৯২.৪-১২০২ মিটার) হতে ০৪-১১-২০২৪ তারিখ থেকে দৈনিক ৮.৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা হয়েছে এবং বর্তমানে উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া প্রকল্প কার্যক্রমের গুণগত মান বজায় রাখা সংক্রান্ত কয়েকটি বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লগিং ইন্টারপ্রিটেশন রিপোর্ট, ডিএসটি ইন্টারপ্রিটেশন রিপোর্ট, সিমেন্টিং ইভালুয়েশন রিপোর্ট, স্লিকলাইন অপারেশন রিপোর্ট, কন্সালটেন্সি রিপোর্ট ও ওয়ার্কওভার রিপোর্ট ইত্যাদি বিষয়ে ৪টি কূপের ক্ষেত্রে মোট ২০টি টেকনিক্যাল রিপোর্ট প্রণয়ন কাজ চলমান রয়েছে। বর্ণিত চূড়ান্ত রিপোর্টসমূহ পেলে চুক্তির আলোকে পেমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।			
৮	আর্থিক অগ্রগতি	:	চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)			
			বিগত বছরের জুন'২৪ পর্যন্ত ব্যয়	জুন'২৪ পর্যন্ত ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	এডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	ব্যয়
			স্থি: মূ: ৫১১৮.০০ বৈ: মূ: ৩৮২.০০ মোট: ৫৫০০.০০	আর্থিক: ১৯.১৪% বাস্তব: ৭৭.০৭%	স্থি: মূ: ১১৪০৯.০০ বৈ: মূ: ৩৫৯১.০০ মোট: ১৫০০০.০০	প্রতিবেদন মাস ফেব্রুয়ারি ২০২৫ স্থি: মূ: ২৭১.৫০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ২৭১.৫০
						চলতি বছরের মোট (২০২৪-২০২৫) স্থি: মূ: ১১৩৬৭.৪৫ বৈ: মূ: ৩৫৯১.০০ মোট: ১৪৯৫৮.৪৫
						প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় স্থি: মূ: ১৬৪৮৫.৪৫ বৈ: মূ: ৩৯৭৩.০০ মোট: ২০৪৫৮.৪৫
৯	অগ্রগতির হার	:	আর্থিক		বাস্তব	
	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	:	৯৯.৭২%		২১.৯২%	
	প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির শতকরা হার	:	৭৩.৫৭%		৯৮.৯৯%	

— ২৪ —

৬) প্রকল্পের নাম: সিলেট-১১নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট ও রশিদপুর স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ২০০০ (±১০০) মিটার ও ৪২০০ (±১০০) মিটার (TVD) গভীরতায় একটি উন্নয়ন কূপ (সিলেট-১১) ও একটি অনুসন্ধান কূপ (রশিদপুর-১৩) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে সিলেট-১১ ও রশিদপুর- ১৩নং কূপ দুটি হতে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১৬ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।					
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) ব্যয়: লক্ষ টাকায়	:	স্থানীয় মুদ্রা:	১৮২৬৭.০০				
			বৈদেশিক মুদ্রা:	৪১৬৮৩.০০				
			মোট:	৫৯৯৫০.০০				
৩	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১৮-০৪-২০২৪					
৪	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (ডিপিপি অনুযায়ী)	:	আরম্ভ: মার্চ ২০২৪ সমাপ্তি: জুন ২০২৬					
৫	প্রকল্প অর্থায়ন উৎস	:	নিজস্ব তহবিল					
৬	প্রকল্প পরিচালক	:	প্রকৌ. মুহাঃ মাহমুদুল ইসলাম পদবী: প্রকল্প পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক মোবাইল নং-০১৭১২ ২৩৬৪৪৫ Email: pdrp13@sgfl.org.bd					
৭	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ক) অনুমোদনের পর্যায়: প্রকল্পের ডিপিপি ১৮-০৪-২০২৪ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। খ) খনন ঠিকাদার নিয়োগ: বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০ (২০২১ সালের সর্বশেষ সংশোধনসহ) এর আওতায় সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর সিলেট-১১ ও রশিদপুর-১৩, খনন প্রকল্পের চুক্তি সম্পাদন বিষয়ে ১২-০৫-২০২৪ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে অনুষ্ঠিত প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ কমিটি (পিপিপি)'র সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খনন ঠিকাদার Sinopec International Petroleum Service Corporation, China এর সহিত চুক্তি সম্পাদনের জন্য ০৩-০৭-২০২৪ তারিখে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সিপিটিইউ-এর মতামতের প্রেক্ষিতে কূপ খনন কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে ১৫-১০-২০২৪ তারিখে Sinopec International Petroleum Service Corporation, China এর সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গ) ইআইএ/আইইই/পরিবেশ ছাড়পত্র: প্রকল্পের অনুকূলে ১৪-০১-২০২৫ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। ঘ) ভূমি অধিগ্রহণ: রশিদপুর-১৩নং কূপের জন্য ৯.৭৭৮ একর ভূমি অধিযাচনের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক হবিগঞ্জ বরাবর ১০-০২-২০২৪ তারিখে প্রস্তাবনা দাখিল করা হয়েছে। জমির সম্ভাব্যতা যাচাই-এর জন্য ১৪-০৭-২০২৪ তারিখে কমিটি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন এবং ৩০-০৭-২০২৪ তারিখে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৭-১০-২০২৪ তারিখে ভূমি অধিযাচন এর পূর্বানুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসক হবিগঞ্জের ভূমি অধিগ্রহণ শাখা হতে ভূমি মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ২৮-১১-২০২৫ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাবনাতে কিছু ত্রুটি বিচ্ছৃতি আছে জানিয়ে পত্র প্রেরণ করায় প্রস্তাবনা সংশোধন করে পুনরায় উপস্থাপন করার জন্য হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। সিলেট-১১নং কূপের জন্য ৩.৯৩১ একর ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক সিলেট বরাবর ১১-০২-২০২৪ তারিখে প্রস্তাবনা দাখিল করা হয়েছে। জমির সম্ভাব্যতা যাচাই-এর জন্য ৩০-০৫-২০২৪ তারিখে কমিটি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন এবং ২৯-০৮-২০২৪ তারিখে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৭-১০-২০২৪ তারিখে হালনাগাদ রেকর্ড ("চ" ফরম পূরন) ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় পৌঁছায়। ২৪-১১-২০২৪ তারিখে ৪ ধারা জারী করা হয়েছে। ০৩-১২-২০২৪ তারিখে যৌথ তদন্তসহ ভূমি ডিমার্কেশন করা হয়েছে এবং ভূমির মালিকগণের কোন আপত্তি না থাকলে নিয়মানুযায়ী ০৭ ধারা জারী করা হবে। ঙ) বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত ০৯-০১-২০২৫ তারিখে ইওআই আহ্বান করা হয়েছে। ৩১-০১-২০২৫ তারিখে ৯টি প্রতিষ্ঠান ইওআই দাখিল করেছে। মূল্যায়ন শেষে গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে আরএফপি প্রেরণ করা হবে।					
৮	আর্থিক অগ্রগতি	:	চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)					
			বিগত বছরের জুন'২৪ পর্যন্ত ব্যয়	জুন'২৪ পর্যন্ত ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	এডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	ব্যয়		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপঞ্জিত ব্যয়
			স্থ: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০	আর্থিক: ০.০০% বাস্তব: ০.০০%	স্থ: মূ: ৪৬.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ৪৬.০০	প্রতিবেদন মাস ফেব্রুয়ারি ২০২৫	চলতি বছরের মোট (২০২৪-২০২৫)	
						স্থ: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০	স্থ: মূ: ৪৮.৮৮ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ৪৮.৮৮	
৯	অগ্রগতির হার	:	আর্থিক		বাস্তব			
	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	:	১০৬.২৬%		১২%			
	প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতির শতকরা হার	:	০.০৮%		১২%			

— ২৫ —

চ) প্রকল্পের নাম: কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২নং কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্প।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২নং কূপসমূহকে পূর্ণরায় গ্যাস উৎপাদন আনয়ন: সংশ্লিষ্ট কূপের টার্গেটেড স্যান্ডসমূহে মজুদকৃত ৭১২ বিসিএফ গ্যাসের মধ্যে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে (কৈলাশটিলা-১: ৫, রশিদপুর-৩: ১০ ও বিয়ানীবাজার-২: ৮) এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে (কৈলাশটিলা-১: ৫, রশিদপুর-৩: ৭ ও বিয়ানীবাজার-২: ৬) অর্থাৎ মোট ৭১.৭৫ বিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করে দেশের জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।					
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) ব্যয়: লক্ষ টাকায়	:	স্থানীয় মূদ্রা:	১৬১২৯.০০	বৈদেশিক মূদ্রা:	৬২৬৬.০০	মোট:	২২৩৯৫.০০
৩	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১১-১২-২০২৪					
৪	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (ডিপিপি অনুযায়ী)	:	আরম্ভ: জানুয়ারি ২০২৫ সমাপ্তি: জুন ২০২৬					
৫	প্রকল্প অর্থায়ন উৎস	:	নিজস্ব তহবিল					
৬	প্রকল্প পরিচালক	:	প্রকৌ. কাজী মো: শহীদ উল্লা পদবী: প্রকল্প পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক মোবাইল নং-০১৮১৮ ৪০৪০৬৩ Email: pd3wellswo@sgfl.org.bd					
৭	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ক) অনুমোদনের পর্যায়: প্রকল্পের ডিপিপি ১১-১২-২০২৪ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। খ) মালামাল ক্রয়/সংগ্রহ: প্রকল্পের ওয়ার্কওভার অপারেশন কাজ বাপেক্স-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার নিমিত্ত ০৪-১১-২০২৪ তারিখে এসজিএফএল এবং বাপেক্স এর মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এসজিএফএল এবং বাপেক্স-এর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এ সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ওয়ার্কওভার কাজে প্রয়োজনীয় সকল মালামাল এসজিএফএল ও বাপেক্স এর মধ্যে সম্পাদিতব্য চুক্তির আওতায় বাপেক্স কর্তৃক প্রদান করা হবে। গ) বৈদেশিক পরামর্শ সেবা: বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে বহিঃসদস্য অন্তর্ভুক্ত করে গঠিত কমিটি কর্তৃক দরপত্র দলিল তৈরীর কাজ চলমান আছে। শীঘ্রই দরপত্র আহবান করা হবে। ঘ) ইআইএ সম্পাদন: EIA সম্পাদনের নিমিত্ত QCBS পদ্ধতিতে নির্বাচিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান EQMS Consulting Limited, Dhaka এর সাথে ২১-০১-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মাঠ পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন করেছে। ঙ) থার্ড পার্টি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস: থার্ড পার্টি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস সংগ্রহের লক্ষ্যে কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত দরপত্র দলিলের আলোকে ২০-০২-২০২৫ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। চ) ওয়ার্কওভার অপারেশন: প্রকল্পের ওয়ার্কওভার অপারেশন কাজ বাপেক্স-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার নিমিত্ত ০৪-১১-২০২৪ তারিখে এসজিএফএল এবং বাপেক্স এর মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এসজিএফএল এবং বাপেক্স-এর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এ সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ওয়ার্কওভার অপারেশন সেবা এসজিএফএল ও বাপেক্স এর মধ্যে সম্পাদিতব্য চুক্তির আওতায় বাপেক্স কর্তৃক প্রদান করা হবে। ছ) রিগ ফাউন্ডেশন মডিফিকেশন: রশিদপুর-৩নং কূপের রিগ ফাউন্ডেশন মডিফিকেশনের জন্য নির্বাচিত ঠিকাদার বরাবর ২১-০২-২০২৫ তারিখে NoA জারি করা হয়েছে। কৈলাশটিলা-১ নং কূপের রিগ ফাউন্ডেশন মডিফিকেশনের জন্য ২০-০২-২০২৫ তারিখ এবং বিয়ানীবাজার-২নং কূপের রিগ ফাউন্ডেশন মোডিফিকেশনের জন্য ২৩-০২-২০২৫ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।					
৮	আর্থিক অগ্রগতি	:	চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)					
			বিগত বছরের জুন'২৪ পর্যন্ত ব্যয়	জুন'২৪ পর্যন্ত ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	এডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	ব্যয়		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
			স্থানীয়: ০.০০ বৈদেশিক: ০.০০ মোট: ০.০০	আর্থিক: ০.০০% বাস্তব: ০.০০%	স্থানীয়: ০.০০ বৈদেশিক: ০.০০ মোট: ০.০০	প্রতিবেদন মাস ফেব্রুয়ারি ২০২৫	চলতি বছরের মোট (২০২৪-২০২৫)	স্থানীয়: ০.০০ বৈদেশিক: ০.০০ মোট: ০.০০
৯	অগ্রগতির হার	:	আর্থিক		বাস্তব			
	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	:	০.০০%		০.৫০%			
	প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির শতকরা হার	:	০.০০%		০.৫০%			

স্বাক্ষর

— ২৬ —

স্বাক্ষর

হ) প্রকল্পের নাম: ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন।









১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডুপিটিলা ও কৈলাশটিলা স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ৩৪৬০ (±১০০) মিটার ও ৩৬০০ (±১০০) মিটার (TVD) গভীরতায় দু'টি অনুসন্ধান কূপ (ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা;				
			নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ দুটি হতে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে অর্থাৎ ১০ বছরে মোট ৫৬ বিসিএফ গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।				
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) ব্যয়: লক্ষ টাকায়	:	স্থানীয় মুদ্রা:	১৯৯১২.০০			
			বৈদেশিক মুদ্রা:	৪৪৭৩৬.০০			
			মোট:	৬৪৬৪৮.০০			
৩	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৭-০১-২০২৫				
৪	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (ডিপিপি অনুযায়ী)	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২৪ সমাপ্তি: সেপ্টেম্বর ২০২৬				
৫	প্রকল্প অর্থায়ন উৎস	:	জিওবি ও নিজস্ব তহবিল				
৬	প্রকল্প পরিচালক	:	প্রকৌ. মো: মুশতাক আহমেদ পদবী: প্রকল্প পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক মোবাইল নং-০১৭৩০-০৭৩৬৪৯ Email: PDDPL1KTL9@sgfl.org.bd				
৭	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ক) অনুমোদনের পর্যায়: প্রকল্পের ডিপিপি ২৭-০১-২০২৫ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। খ) ভূমি অধিগ্রহণ: কৈলাশটিলা-৯নং কূপের খননস্থল উন্নয়ন ও সংযোগ রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যে ১৯-০৫-২০২৪ তারিখে ৬.০৩৫ একর ভূমি হকুমদখলের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করে। ১৪-০৮-২০২৪ তারিখে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, সিলেট বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ডিপিপি অনুমোদনের পর পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত ০২-০২-২০২৫ তারিখে পুণরায় জেলা প্রশাসক, সিলেট বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ডুপিটিলা-১নং কূপের খননস্থল উন্নয়ন ও সংযোগ রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যে ০৫-১২-২০২৪ তারিখে ৭.৮২৩ একর ভূমি হকুমদখলের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করে। ডিপিপি অনুমোদনের পর পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত ৩০-০১-২০২৫ তারিখে জেলা প্রশাসক, সিলেট বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গ) খনন ঠিকাদার নিয়োগ: “রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন” এবং “ডুপিটিলা-১নং কূপ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন” শীর্ষক প্রকল্পসমূহের আওতায় উল্লেখিত কূপসমূহ খননের লক্ষ্যে Turn-key ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে ১৫-০২-২০২৫ তারিখে খসড়া চুক্তিপত্রের ওপর আইনি মতামতের জন্য আইন বিশেষজ্ঞ-এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও কারিগরি মূল্যায়নে উত্তীর্ণ দু'টি দরদাতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আর্থিক মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য ও সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC)-এর সাথে ২৭-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ঘ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ: ০৯-০১-১০১৪ তারিখে REOI বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হয়েছে এবং ৩০-০১-২০২৫ তারিখে ৯টি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র খোলা হয়েছে এবং মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ঙ) ইআইএ/আইইই/পরিবেশ ছাড়পত্র: প্রকল্পের অনুকূলে ডুপিটিলা-১নং কূপের জন্য ১১-০৭-২০২৪ তারিখে এবং কৈলাশটিলা-৯নং কূপের জন্য ০৯-০৪-২০২৪ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া গেছে।				
৮	আর্থিক অগ্রগতি	:	চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)				
			বিগত বছরের জুন'২৪ পর্যন্ত ব্যয়	জুন'২৪ পর্যন্ত ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	এডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	ব্যয়	প্রকল্পের শুরুর হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
			স্থ: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০	আর্থিক: ০.০০% বাস্তব: ০.০০%	স্থ: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০	প্রতিবেদন মাস ফেব্রুয়ারি ২০২৫ স্থ: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০	চলতি বছরের মোট (২০২৪-২০২৫) স্থ: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০
৯	অগ্রগতির হার	:	আর্থিক		বাস্তব		
	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	:	০.০০%		০.০০%		
	প্রকল্পের শুরুর হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির শতকরা হার	:	০.০০%		০.০০%		

জ) প্রকল্পের নাম: রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রশিদপুর স্ট্রাকচারে ২৯০০ (±১০০) মিটার গভীরতায় একটি অনুসন্ধান কূপ (রশিদপুর-১১) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে ২৯.৪৯ বিসিএফ গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি করা এবং প্রথম ৩ বছরে দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।					
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) ব্যয়: লক্ষ টাকায়	:	স্থানীয় মুদ্রা: বৈদেশিক মুদ্রা: মোট:	৭৫১৮.০০ ১৯৬৬৯.০০ ২৭১৮৭.০০				
৩	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১৪-০১-২০২৫					
৪	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (ডিপিপি অনুযায়ী)	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২৪ সমাপ্তি: জুন ২০২৬					
৫	প্রকল্প অর্থায়ন উৎস	:	জিওবি ও নিজস্ব তহবিল					
৬	প্রকল্প পরিচালক	:	প্রকৌ. মো: আবুল মনছুর চৌধুরী পদবী: প্রকল্প পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক মোবাইল নং-০১৭৩০-০৩৬৩৯৯ Email: pdrp11@sgfl.org.bd					
৭	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ক) অনুমোদনের পর্যায়: প্রকল্পের ডিপিপি ১৪-০১-২০২৫ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। খ) খনন ঠিকাদার নিয়োগ: “রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন” প্রকল্পের বর্ণিত কূপ খনন, মালামাল সরবরাহ, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য Turn-key ভিত্তিতে ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে আহবানকৃত দরপত্রের বিপরীতে প্রাথমিক ও কারিগরি মূল্যায়নে উত্তীর্ণ দু’টি দরদাতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আর্থিক মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য ও সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান CNPC Chuangqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC) এর সাথে “রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্পের বর্ণিত কূপ খনন, মালামাল সরবরাহ, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য Turn-key ভিত্তিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে বৈদেশিক মুদ্রায় ৪,৩২,৪১,৪৩০.০০ (চার কোটি ত্রিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার চারশত ত্রিশ) মার্কিন ডলার এবং স্থানীয় মুদ্রায় ১১৭,০৯,০৮,২৮০.০০ (একশত সতেরো কোটি নয় লক্ষ আট হাজার দুইশত আশি) টাকাসহ ২৭-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। গ) ইআইএ/আইইই/পরিবেশ ছাড়পত্র: প্রকল্পের অনুকূলে ১৬-০১-২০২৫ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। ঘ) ভূমি অধিগ্রহণ: প্রকল্পের ৮.৩৮৭ একর ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্তে জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ বরাবর ১০-০২-২০২৪ তারিখে প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে। ০৪-০১-২০২৫ তারিখে জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। গত ১৫-০১-২০২৫ ও ২২-০১-২০২৫ তারিখে জেলা প্রশাসক হবিগঞ্জের এলএ শাখা কর্তৃক একটি যৌথ তদন্ত সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত তদন্তে ভূমির ম্যাপে কিছু বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হওয়ার তা সংশোধন করে পুনরায় প্রেরণ করা হলে ১৩-০২-২০২৫ তারিখে পুনরায় যৌথ তদন্ত সম্পন্ন করা হয়েছে। ঙ) বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত Rich Spread Group Limited,China এর সাথে চুক্তি নবায়ন করা হয়েছে।					
৮	আর্থিক অগ্রগতি	:	চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)					
			বিগত বছরের জুন’২৪ পর্যন্ত ব্যয়	জুন’২৪ পর্যন্ত ডিপিপি’র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	এডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	ব্যয়		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
			স্থ: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০	আর্থিক: ০.০০% বাস্তব: ০.০০%	স্থ: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০	প্রতিবেদন মাস ফেব্রুয়ারি ২০২৫	চলতি বছরের মোট (২০২৪-২০২৫)	
						স্থ: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০	স্থ: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০	স্থ: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০
৯	অগ্রগতির হার	:			আর্থিক	বাস্তব		
	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	:			০.০০%	০.০০%		
	প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির শতকরা হার	:			০.০০%	০.০০%		

— ২৮ —

কোম্পানির চলমান প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত

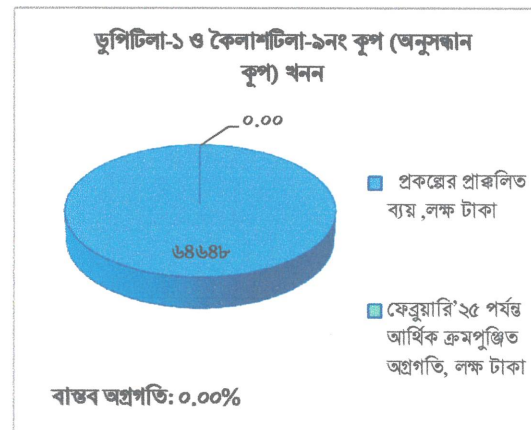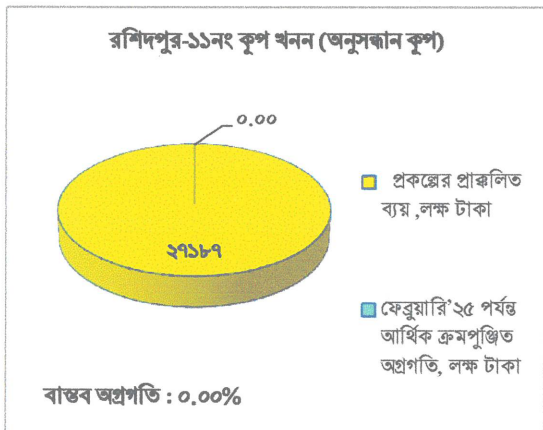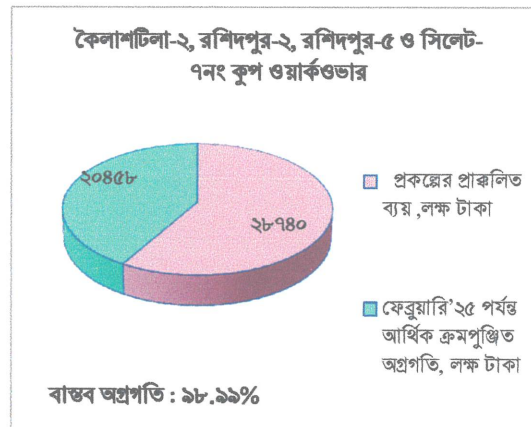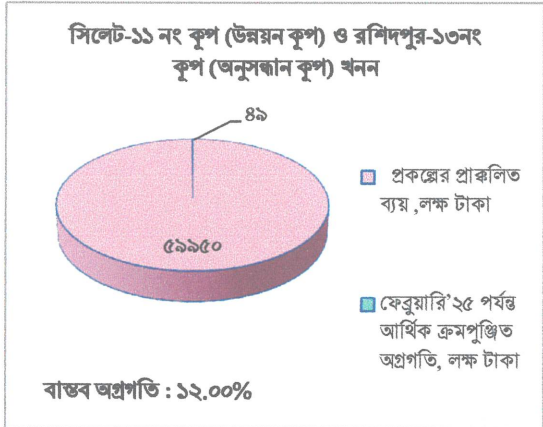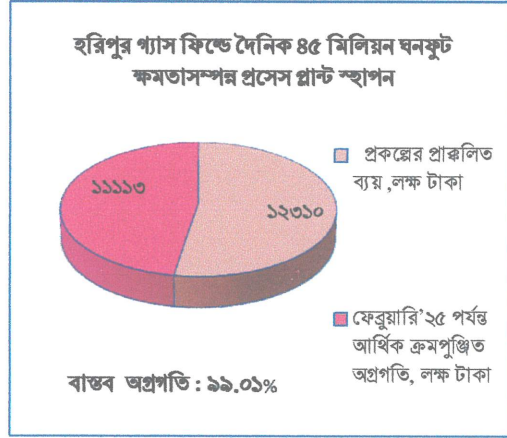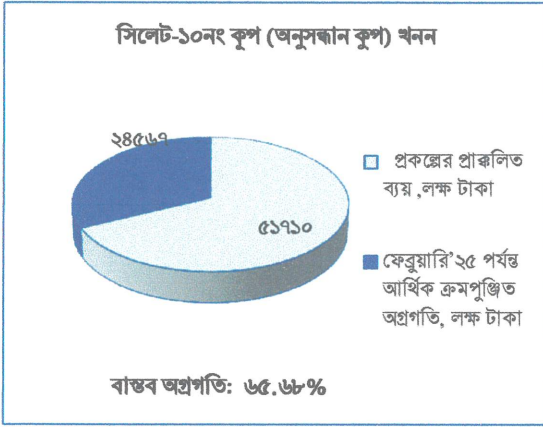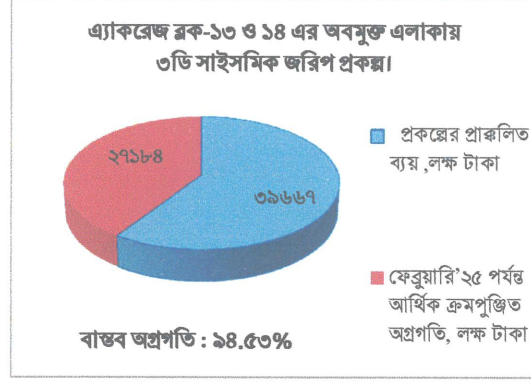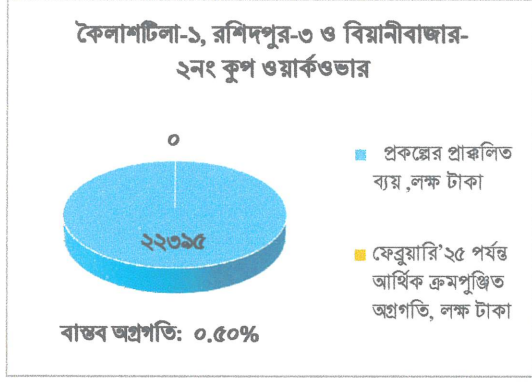

উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট

ফেব্রুয়ারি ২০২৫

উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট :

- ক) উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড : “সিলেট-১২নং কূপ খনন (তেল কূপ)” শীর্ষক প্রকল্পটি ২২-০২-২০২৫ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়।
- খ) আগামী দুই মাসে সম্পাদিতব্য গুরুত্বপূর্ণ : নাই।
কাজের তালিকা।
- গ) আগামী দুই মাসে বড় রকমের কোন : নাই।
সমস্যা/সংকটের আশঙ্কা করা হলে তার
বিবরণ



— ৩০ —



জনবলের পরিসংখ্যান

মাসের নাম : ফেব্রুয়ারি ২০২৫

জনবলের পরিসংখ্যান :

১। কর্মকর্তা

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫	কর্মরত পদের সংখ্যা
১।	৭৮০০০ (নির্ধারিত)	-
২।	৬৬০০০-৬৮৮৮০-৭১০৫০-৭৩৭২০-৭৬৪৯০	-
৩।	৫৫৫০০-৫৮৭৬০-৬১১২০-৬৩৫৭০-৬৬১২০-৬৮৭৭০-৭১৫৩০-৭৪৪০০	৯
৪।	৫০০০০-৫২০০০-৫৪০৮০-৫৬২৫০-৫৮৫০০-৬০৮৪০-৬৩২৮০-৬৫৮২০-৬৮৪৬০-৭১২০০	৬২
৫।	৪৩০০০-৪৪৯৮০-৪৬৯৭০-৪৯০৯০-৫১৩০০-৫৩৬১০-৫৬০৩০-৫৮৫৬০-৬১২০০-৬৩৬৬০-৬৬৮৪০-৬৯৮৫০	৬১
৬।	৩৫৫০০-৩৭২৮০-৩৯১৫০-৪১১১০-৪৩১৭০-৪৫৩৩০-৪৭৬০০-৪৯৯৮০-৫২৪৮০-৫৫১১০-৫৭৮৭০-৬০৭৭০-৬৩৮১০-৬৭০১০	৬৪
৭।	২৯০০০-৩০৪৫০-৩১৯৮০-৩৩৫৮০-৩৫২৬০-৩৭০৩০-৩৮৯৮০-৪০৮৪০-৪২৮৯০-৪৫০৪০-৪৭৩০০-৪৯৬৭০-৫২১৬০-৫৪৭৭০-৫৭৫১০-৬০৩৯০-৬৩৪১০	-
৮।	২৩০০০-২৪১৫০-২৫৩৬০-২৬৬৩০-২৭৯৭০-২৯৩৭০-৩০৮৪০-৩২৩৯০-৩৪০১০-৩৫৭২০-৩৭৫১০-৩৯৩৯০-৪১৩৬০-৪৩৪৩০-৪৫৬১০-৪৭৯০০-৫০৩০০-৫২৮২০-৫৫৪৭০	২
৯।	২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০	৯২
১০।	১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০	৪৩
মোট কর্মকর্তা :		৩৩৩

২। কর্মচারী

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫	কর্মরত পদের সংখ্যা
১।	২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০	০০
২।	১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০	০০
৩।	১২৫০০-১৩১৩০-১৩৭৯০-১৪৪৮০-১৫২১০-১৫৯৮০-১৬৭৮০-১৭৬২০-১৮৫১০-১৯৪৪০-২০৪২০-২১৪৫০-২২৫৩০-২৩৬৬০-২৪৮৫০-২৬১০০-২৭৪১০-২৮৭৯০-৩০২৩০	০৭
৪।	১১৩০০-১১৮৭০-১২৪৭০-১৩১০০-১৩৭৬০-১৪৪৫০-১৫১৮০-১৫৯৪০-১৬৭৪০-১৭৫৮০-১৮৪৬০-১৯৩৯০-২০৩৬০-২১৩৮০-২২৪৫০-২৩৫৮০-২৪৭৬০-২৬০০০-২৭৩০০	২৪
৫।	১১০০০-১১৫৫০-১২১৩০-১২৭৪০-১৩৩৮০-১৪০৫০-১৪৭৬০-১৫৫০০-১৬২৮০-১৭১০০-১৭৯৬০-১৮৮৬০-১৯৮১০-২০৮১০-২১৮৬০-২২৯৬০-২৪১১০-২৫৩২০-২৬৫৯০	৫৪
৬।	১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০-২১৩১০-২২৩৮০-২৩৫০০-২৪৬৮০	২২
৭।	৯৭০০-১০১৯০-১০৭০০-১১২৪০-১১৮১০-১২৪১০-১৩০৪০-১৩৭০০-১৪৩৯০-১৫১১০-১৫৮৭০-১৬৬৭০-১৭৫১০-১৮৩৯০-১৯৩১০-২০২৮০-২১৩০০-২২৩৭০-২৩৪৯০	০৪
৮।	৯৩০০-৯৭৭০-১০২৬০-১০৭৮০-১১৩২০-১১৮৯০-১২৪৯০-১৩১২০-১৩৭৮০-১৪৪৭০-১৫২০০-১৫৯৬০-১৬৭৬০-১৭৬০০-১৮৪৮০-১৯৪১০-২০৩৯০-২১৪১০-২২৪৯০	৬৭
৯।	৯০০০-৯৪৫০-৯৯৩০-১০৪৩০-১০৯৬০-১১৫১০-১২০৯০-১২৭০০-১৩৩৪০-১৪০১০-১৪৭২০-১৫৪৬০-১৬২৪০-১৭০৬০-১৭৯২০-১৮৮২০-১৯৭৭০-২০৭৬০-২১৮০০	০৩
১০।	৮৮০০-৯২৪০-৯৭১০-১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০	০
১১।	৮৫০০-৮৯৩০-৯৩৮০-৯৮৫০-১০৩৫০-১০৮৭০-১১৪২০-১২০০০-১২৬০০-১৩২৩০-১৩৯০০-১৪৬০০-১৫৩৩০-১৬১০০-১৬৯১০-১৭৭৬০-১৮৬৫০-১৯৫৯০-২০৫৭০	০
১২।	৮২৫০-৮৬৭০-৯১১০-৯৫৭০-১০০৫০-১০৫৬০-১১০৯০-১১৬৫০-১২২৪০-১২৮৬০-১৩৫১০-১৪১৯০-১৪৯০০-১৫৬৫০-১৬৪৪০-১৭২৭০-১৮১৪০-১৯০৫০-২০০১০	০৫
মোট কর্মচারী :		১৮৬
মোট কর্মকর্তা এবং কর্মচারী (৩৩৩+১৮৬) :		৫১৯ জন

১ জন কর্মকর্তার পদত্যাগ, ১ জন কর্মচারীর চাকরি হতে অবসর ও ১ জন কর্মচারীর মৃত্যুজনিত কারণে গত মাসের প্রতিবেদনের সাথে প্রতিবেদনাধীন মাসে জনবলের সংখ্যার তারতম্য হয়েছে।

— ৩২ —
