



সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

SYLHET GAS FIELDS LIMITED

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

প্রতিবেদনকাল

জুন ২০২৫



মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

MONTHLY MIS REPORT

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

জুন ২০২৫

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১)	উৎপাদন পরিসংখ্যান (ফিল্ড/স্থাপনা ভিত্তিক)	১
২)	কোম্পানির সামগ্রিক উৎপাদন পরিসংখ্যান	২
৩)	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণী	৩
৪)	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণী	৪
৫)	বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের আয়/ব্যয়ের তারতম্য বিশ্লেষণ	৫
৬)	আয়-ব্যয় বিবরণী	৬-৭
৭)	বিক্রয় বিবরণী (গ্যাস)	৮
৮)	বিক্রয় বিবরণী (উপজাত তেল)	৯
৯)	গ্রাহকওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণী	১০
১০)	প্রদেয় ভ্যাট এর বিবরণী	১১
১১)	সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা বিবরণী	১২
১২)	মাসের মজুদ বিবরণী	১৩
১৩)	নগদ তহবিল বিবরণী	১৪
১৪)	আয়-ব্যয় এবং বকেয়া পাওনার বিশ্লেষণ বিবরণী	১৫
১৫)	মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী	১৬
১৬)	বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী	১৭
১৭)	কোম্পানির উৎপাদন ও বিক্রয়ের তুলনামূলক চিত্র	১৮-১৯
১৮)	কোম্পানির চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ও চিত্র	২০-৩২
১৯)	উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট	৩৩
২০)	জনবলের পরিসংখ্যান	৩৪

উৎপাদন পরিসংখ্যান (ফিল্ড/স্থাপনা ভিত্তিক)

ক্রমিক নং	গ্যাস ক্ষেত্র/ স্থাপনা	বিদ্যমান কুপ	উৎপাদনরত কুপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	সংশোধিত নক্ষমাণ্ডা (২০২৪-২০২৫)	বিবর্তন মাস (মে ২০২৫)	সম্পত্তি মাস (জুন ২০২৫)	বিকৃত বকসের (২০২৩-২০২৪) মোট	চলতি বকসের (২০২৪-২০২৫) ক্রমসূত্রিত	ভর হইতে ক্রমসূত্রিত গ্যাস (এম এম এস সি এম) পেট্রোলিয়ামজাত প্রযোজ্য (লিটার)	ভর হইতে ক্রমসূত্রিত গ্যাস (এম এম এস সি এম) পেট্রোলিয়ামজাত প্রযোজ্য (বাক্সেল)
১	সিগেট	কুপ নং-৩, ৬, ৭, ৮ ও সিগেট-১৩ সিগেট-১০	৪টি	গ্যাস	০.৬৪৬	১২৮.৩৩১৭	১৬.৫১৫	২২.৮১৫	১০৫.৬৬৭	১০৫.৬৬৭	২২৯.১৭১, ২২৯.১৭১	২২৯.১৭১, ২২৯.১৭১
				পানি	-	-	১.৪৪২	২.৬০৫	১.৪৪২	১.৪৪২	১.৪৪২, ১.৪৪২	১.৪৪২, ১.৪৪২
				অপঃ তৈল	-	-	-	-	-	-	৫৬০, ৫৬০	৫৬০, ৫৬০
				মটর স্পিরিট	-	-	৩১১.৬০৫	২১১.২৯৬	৩১১.৬০৫	৩১১.৬০৫	৬৬৬.৬০৫, ৬৬৬.৬০৫	৬৬৬.৬০৫, ৬৬৬.৬০৫
				RON 81	৪,৪০০.০০	৯৬১.১৯২.০০	-	-	৯৬১.১৯২	৯৬১.১৯২	৬৬৬.৬০৫, ৬৬৬.৬০৫	৬৬৬.৬০৫, ৬৬৬.৬০৫
২	কৈলাশচিলা	কুপ নং-১, ৪	০টি	গ্যাস	৫.২০০০০০	৫.২০০০০০	৫.২০০০০০	৫.২০০০০০	৫.২০০০০০	৫.২০০০০০	৫.২০০০০০, ৫.২০০০০০	৫.২০০০০০, ৫.২০০০০০
				পানি	-	-	-	-	-	-	৫.২০০০০০, ৫.২০০০০০	৫.২০০০০০, ৫.২০০০০০
				মটর স্পিরিট	-	-	-	-	-	-	৫.২০০০০০, ৫.২০০০০০	৫.২০০০০০, ৫.২০০০০০
				RON 81	-	-	-	-	-	-	৫.২০০০০০, ৫.২০০০০০	৫.২০০০০০, ৫.২০০০০০
				ডিজেল	-	-	-	-	-	-	৫.২০০০০০, ৫.২০০০০০	৫.২০০০০০, ৫.২০০০০০
৩	এনএনটিই প্রাক্ত অপারেশন (কৈলাশচিলা)	কুপ নং-২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮	৪টি	গ্যাস	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১
				পানি	-	-	-	-	-	-	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১
				মটর স্পিরিট	-	-	-	-	-	-	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১
				ডিজেল	-	-	-	-	-	-	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১
৪	রশিদপুর	কুপ নং-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮	৭টি	গ্যাস	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১
				পানি	-	-	-	-	-	-	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১
				মটর স্পিরিট	-	-	-	-	-	-	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১
				ডিজেল	-	-	-	-	-	-	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১
৫	বিমানী বাজার	কুপ নং-১ ও ২	২টি	গ্যাস	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১
				পানি	-	-	-	-	-	-	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১
				মটর স্পিরিট	-	-	-	-	-	-	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১
				ডিজেল	-	-	-	-	-	-	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১
৬	রশিদপুর কমডেনসেট প্রাক্ত	কুপ নং-১	১টি	গ্যাস	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১
				পানি	-	-	-	-	-	-	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১
				মটর স্পিরিট	-	-	-	-	-	-	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১
				ডিজেল	-	-	-	-	-	-	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১
৭	রশিদপুর কমডেনসেট প্রাক্ত	কুপ নং-১	১টি	গ্যাস	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১
				পানি	-	-	-	-	-	-	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১
				মটর স্পিরিট	-	-	-	-	-	-	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১
				ডিজেল	-	-	-	-	-	-	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১
৮	রশিদপুর কমডেনসেট প্রাক্ত	কুপ নং-১	১টি	গ্যাস	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১
				পানি	-	-	-	-	-	-	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১
				মটর স্পিরিট	-	-	-	-	-	-	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১
				ডিজেল	-	-	-	-	-	-	০.৪০১, ০.৪০১	০.৪০১, ০.৪০১

স্বাক্ষর

১২

স্বাক্ষর

কোম্পানির সামগ্রিক উৎপাদন পরিসংখ্যান

গ্যাস : এম এম এস সি এম, পানি ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : লিটার										
গ্যাস ক্ষেত্র/ স্থাপনা	বিদ্যমান কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উপাদান	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪-২০২৫)	বিগত মাস (মে ২০২৫)	চলতি মাস (জুন ২০২৫)	বিগত বৎসরের (২০২৩-২০২৪) মোট	চলতি বৎসরের (২০২৪-২০২৫) ক্রমপুঞ্জিত	শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত
সিলেট, কৈলাশটিলা, এমএসটিই প্লান্ট অপারেশন, রশিদপুর, বিয়ানীবাজার, হাতক, রশিদপুর কনভেনসেন্ট ফ্রাকশনেশন প্লান্ট, ৪০০০ বিপিডি কনভেনসেন্ট ফ্রাকশনেশন প্লান্ট, ৩০০০ বিপিডি ক্যাটলাইটিক রিফরমিং ইউনিট ও কৈলাশটিলা এলপিগিজ প্লান্ট	২৬ টি	১৭ টি	গ্যাস	৪.০০৭৪	১,৩২৯.০৭৫	১৩০.৭১৯	১২১.৮৪৬	১,০৭৩.৭৭০	১,৩৯২.০০৬	৫৫,৩৫৭.৭৫৭
			পানি	--	--	১২,৬০৯,০০৩	১৩,৪৮৯,১৪০	১৬০,৬৭৫,৪৬৫	১৩৩,০৭০,৭৮৬	১,৬১০,৯৯৪,৫৬২
			অপ: তৈল	--	--	--	--	--	--	৮৯,১৪৯,৬৩০
			অকটেন	-	৭৭,৫৩৪,০০০	৫,০৫২,৬৯৮	৩,৭৪৮,৮৫৬	৭১,০৪৩,৯৮৮	৭০,৯৬৫,৫৩১	৩১৮,০৪৫,২১৬
			মটর স্পিরিট RON 81	৬১২,৮৪৩.০০০	১৮১,৯৮৩,১৯২	২১,৩৭০,১৪৬	১৮,৫৩৪,৫৯১	২২১,৫৩৬,২১৬	২২৬,৮৯৩,০৩২	২,২০৫,০৪২,৬৩২
			ডিজেল	২৬,৮৬৯.০০০	৮,২৭৭,০০০	৯৭৭,০০১	৮১২,১৩৫	৮,৯৩৮,৫১৯	৯,৭৩৩,৩২৫	৫২৩,১৩০,২৬১
			কেরোসিন	৪০,৭০২.০০০	১১,৭৫০,০০০	৯৩০,৫০৭	৯২০,৫১১	১৪,২২৮,৭৬৩	১১,৯৯৭,১৭৭	৩১৪,১৬৫,১৮৭
			কনভেনসেন্ট	৮৬,৪৯০	২৯,৫০২,৯৭৭	৩,৩৯৫,১১১	৩,১৪৩,১২৭	৩৭,৭৯৬,৯৪১	৩৪,৭২৬,৫৯৪	১,৯৩০,২১৮,২১৮
			এনজিএল	৬০,১৩০	১৭,৭৪৩,২৫৩	১,৭৫১,০০০	১,১৪১,১৪১	১,৩৭০,০০০	১৯,৬৯৯,০০০	৫৯৬,৭২৯,৯৯২
			পেট্রোল (বন ৮৯)	-	১৩০,৪৮২,০০০	১৪,৭৮৮,৭৯১	১৪,৬৪৪,৩৬৪	১৪৩,৫৪৩,৯৬৫	১৪৩,৯৪৮,৬৬৬	৫০৫,৮২৬,৫৮৪
			লাইট ন্যাফথা	১৬৬,৭৭৮	৪৭,৫৯৭,০০০	৪,৫৯১,৪৬৮	৪,৫২২,৬৫৩	৫৪,১৮২,৬০৩	৫৩,১২৬,৭৭৭	১৯৩,৬৬৩,০৪৭
			রিফরমেন্ট	৩২২,৭৪৪	১০০,৪০৯,০০০	৯,২৯৯,৩৬৭	৮,৬৪১,৬৯৫	১১২,০৯৯,৮৭৯	১০৭,৭৭৭,৭৭৭	৪২৪,২৪৪,১৬৩
			সুপার লাইট কনভেনসেন্ট	৯৬,১৮৭	-	১,১৭৪,০৫৯	৯৮৪,২০৬	৭০৭,৭৭৭	২২২,৭৭৭,৭৭৭	১৩,৭৬৯,৬৫৫
			এলপিগিজ	৮১,০৮১	৪৭০,৩৮৮,৩৬৮	৫৭৩,১৪২	৪৩৭,৬৯৯	৪০৭,৯৯৯	৭৭৭,৭৭৭	১১,৬৭৭,৬৬৬

২/৭/২৪

২/৭/২৪

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণী

ক্রমিক		উৎপাদন	চলতি মাস (জুন ২০২৫)	বিগত মাস (মে ২০২৫)	বৈশ্বিক/ কম শতকরা হার (৩ - ৪)	বিগত বৎসরের জুন ২০২৪ মাস	বৈশ্বিক/ কম শতকরা হার (৩ - ৬)	মন্তব্য
১	২		৩	৪	৫	৬	৭	৮
ক)		গ্যাস	১২১.৮৪৬	১৩০.৭১৯	-৮.৮৭% -৬.৭৯%	১০০.১৪২	২১.৭০৪ ২১.৬৭%	চলতি মাসে দিনের সংখ্যা ১ দিন কম থাকায় গ্যাস উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
খ)		কনডেনসেট	৩,১৪৩,১২৭	৩,৩৯৫,১১১	-২৫.১৯৮৮% -৭.৪২২%	২,৪৮১,১৪৪	৬৬.৯৮৩ ২৬.৬৮%	চলতি মাসে গ্যাস উৎপাদন কম হওয়ায় কনডেনসেট উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
গ)		এনজিএল	১,৪১৯,০০০	১,৭৫১,০০০	-৩৩.২০০০% -১৮.৯৬৬%	১,২৮১,০০০	১৩৮.০০০ ১০.৭৭%	চলতি মাসে এনজিএল উৎপাদন সামান্য হ্রাস পেয়েছে।
ঘ)		মটর স্পিরিট RON 81	১৮,৫৩৪,৫৯১	২১,৩৭০,১৪৬	-২.৮৩৫,৫৫৫% -১৩.২৬৭%	১৬,৪৬৬,০০৯	২,০৬৮,৫৮২ ১২.৫৬%	চলতি মাসে ১ দিন কম থাকায় মটর স্পিরিট উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
ঙ)		ডিজেল	৮১২,১৩১	৯৭৭,০০১	-১৬.৮৭০% -১৬.৮৭০%	৮৭৪,২১৩	-৬২,০৮২ -৭.১০%	চলতি মাসে ১ দিন কম থাকায় ডিজেল উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
চ)		কেরোসিন	৯২০,৫১১	৯৩০,৫০৭	-৯.৯৯৬% -১.০৭৭%	১,০৪১,৭৩৫	-১২১,২২৪ -১১.৬৪%	চলতি মাসে দিনের সংখ্যা ১ দিন কম থাকায় কেরোসিন উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
ছ)		পেট্রোল (রন ৮৯)	১৪,৬৪৪,৩৬৪	১৪,৭৮৮,৭৯১	(১৪৪,৪২৭) -০.৯৮৭%	৯,৩৩২,১২০	৫,৩১২,২৪৪ ৫৬.৯২%	চলতি মাসে দিনের সংখ্যা ১ দিন কম থাকায় পেট্রোল (রন ৮৯) সামান্য হ্রাস পেয়েছে।
জ)		অকটেন	৩,৭৪৮,৮৫৬	৫,০৫২,৬৯৮	(১,৩০৩,৮৪২.০০) -২৫.৮০০%	৪,৮৫৬,১৭৮	(১,১০৭,৩২২) -২২.৮০%	চলতি মাসে ৪০০০ সিএফপি-তে ব্রেভিং কম করায় এবং দিনের সংখ্যা ১ দিন কম থাকায় অকটেন উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
ঝ)		লাইট ন্যাকথা	৪,৫২২,৬৫৩	৪,৫৯১,৪৬৮	(৬৮,৮১৫) -১.৫০%	৪,৪৪১,৩৬৯	৮১,২৮৮ ১.৮৩%	চলতি মাসে দিনের সংখ্যা ১ দিন কম থাকায় লাইট ন্যাকথা এবং রিকরমেট উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
এ)		রিকরমেট	৮,৬৪১,৬৯৫	৯,২৯৯,৩৪৭	(৬৫৭,৬৫২) -৭.০৭৭%	৮,৯৬২,০৭৮	(৩২০,৩৮৩) -৩.৫৭%	
ট)		এলপিগিজ	৪৩৭,৬৯৯	৫৭৩,১৪২	(১৩৫,৪৪৩.০০) -২৩.৬৩%	৪৯০,০২২	(৫২,৩২৩) -১০.৬৮%	চলতি মাসে ৩০০০ বিপিডি সিমারাইট প্রাটে পাম্পের ত্রুটির কারণে, কৈলাশটীলা এলপিগিজ প্রাটে এনজিএল কম গ্রহণ করায় এবং ১ দিন কম থাকায় এলপিগিজ উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
ঠ)		সুপার লাইট কনডেনসেট	৯৮৪,২০৬	১,১৭৪,০৫৯	-১৮৯.৮৫৩ -১৬.১৭%	৭০৫০৬৭	২৭৯,১৩৯ ৩৯.৫৯%	চলতি মাসে কৈলাশটীলা এলপিগিজ প্রাটে এনজিএল কম প্রসেস করায় এবং ১ দিন কম থাকায় সুপার লাইট কনডেনসেট উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।




গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণী

গ্যাস : এমএমএসসিএম, পেট্রোলিয়াম পণ্যাদি : লিটার					
ক্রমিক	বিক্রয়	চলতি মাস ২০২৫	বিগত মাস (মে ২০২৫)	বৈশী/ কম শতকরা হার (৩ - ৪)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
ক)	গ্যাস	১২০.৫১০	১২৯.৩২০	-৮.৮১০ -৬.৮১%	চলতি মাসে বিগত মাসের তুলনায় গ্যাস উৎপাদন কম হওয়ায় এবং দিনের সংখ্যা ১ দিন কম হওয়ায় গ্যাস বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।
খ)	কনডেনসেট	১,৫৫২,৫০০	২,৪৯৭,৫০০	-৯৫.০০০ -৩৭.৮৪%	চলতি মাসে চাহিদা কম থাকায় কনডেনসেট বিক্রয় গত মাসের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।
ঘ)	পেট্রোল (রন ৮৯)	১৪,৪৯১,৭৯০	১৪,৪৯২,২০০	-৪১০ ০.০০%	গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে চাহিদা কম থাকায় পেট্রোল বিক্রয় সামান্য হ্রাস পেয়েছে।
ঙ)	ডিজেল	৯৩৫,৯২০	১,০৭৫,৪১০	-১৩৯,৪৯০ -১২.৯৭%	গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে ডিজেলের চাহিদা কম থাকায় বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।
চ)	কেরোসিন	৭৫৫,৫২০	৯১৭,৪৪০	-১৬১,৯২০ -১৭.৬৫%	গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে কেরোসিনের চাহিদা কম থাকায় বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।
ছ)	অকটেন	৪,১০৭,২৮০	৫,০৫৯,৩৫০	-৯৫২,০৭০ -১৮.৮২%	চাহিদা কম থাকায় গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে অকটেন বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।
জ)	এলপিগিজ	৫১৮,৫২০	৫৪৭,৫৯০	-২৯০৭০.০০ -৫%	চলতি মাসে এলপিগিজ উৎপাদন কম হওয়ায় বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।





বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের আয়/ব্যয়ের তারতম্য বিশ্লেষণ

প্রতিবেদনকালীন মাসঃ জুন ২০২৫

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস	চলতি মাস	হাস/বৃদ্ধি	হাস/বৃদ্ধি
		মে ২০২৫	জুন ২০২৫		
১	গ্যাস বিক্রয়	৪১.৩৮	৩৮.৫৪	-২.৮৩	গ্যাস বিক্রয় হাস পেয়েছে।
২	উপজাত তেল বিক্রয়	১৯৮.২২	১৮২.৮৭	-১৫.৩৫	উপজাত তেল বিক্রয় হাস পেয়েছে।
৩	অপরিশোধিত তেল বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	অপরিশোধিত তেল বিক্রয় অপরিবর্তিত আছে
৪	ভ্যাট				
	গ্যাস	২৮.৪৬	২৬.৫০	-১.৯৬	ভ্যাট হাস পেয়েছে।
৫	উপজাত তেল	২৬.৪১	২৪.১৫	-২.২৬	ভ্যাট হাস পেয়েছে।
	অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয়	৯৬.৬৮	১০৫.১২	৮.৪৪	ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬	আয়কর পূর্ব নীট মুনাফা	৯০.২৬	৬৮.৯৭	-২১.৩০	মুনাফা হাস পেয়েছে।
৭	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা	৪৮.০৫	৮১.৪৫	৩৩.৪১	জমা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮	বকেয়া পাওনা আদায়	৩২৩.৪৩	২৮১.০৭	-৪২.৩৬	আদায় হাস পেয়েছে।



—০০০০০০—

আয় - ব্যয় বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : জুন ২০২৫

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস		মে ২০২৫		জুন ২০২৫		বিগত বৎসরের মোট (২০২৩-২০২৪)		চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জীভূত	
		প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট		
ক) বিক্রয়											
১	গ্যাস	১৩০.১৪	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০
২	অকটেন	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০
২	মটর স্পিরিট	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০
৩	ডিজেল	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০
৪	কেবোসিন	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০
৫	কনডেনসেট	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০
৬	এন জি পি জি	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০
৬	এন জি পি জি	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০
খ) ব্যয়											
১। সম্পূরক কর ও ভ্যাট											
i	গ্যাস	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২
i	অকটেন	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২
ii	মটর স্পিরিট	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২
iii	ডিজেল	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২
iv	কেবোসিন	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২
v	কনডেনসেট	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২
vi	এন জি এল	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২
vii	এল পি জি	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২
মোট সম্পূরক কর ও ভ্যাট											

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

আয় - ব্যয় বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : জুন ২০২৫

(কোট টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস	মে ২০২৫	চলতি মাস	জুন ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট (২০২৩-২০২৪)	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জীভূত
		প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট
২।	কনডেনসেট ক্রয় ব্যয়	৬৬.২৬	১৪০.০৬	৭৩.৯৫	১০০.৬১	৮২৫.৮৫	১২০৭.৩৭
৩।	উৎপাদন ব্যয়	৩.৯০	৪.২৪	৩.৯০	৫.০২	৬২.১৩	৬০.১৯
৪।	বেতন ও ভাতাদি	৬.৪৫	৭.৯২	৬.৪৫	৬.৭৯	০৪৭.০৯	৮১.৪৬
৫।	প্রশাসনিক ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬।	সুদ	০.৩৫	০.০০	০.৩৫	০.০০	৪১.৮৪	২.৬৯
৭।	অবচয়	০.৫৫	০.০০	০.৫৫	০.০০	০.০০	০.০০
৮।	ডিস্ট্রিশন অব ওয়েল কস্ট	০.০১	০.০১	০.০১	০.০১	০.০১	০.০১
৯।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩.৫২	৫.২৫	৩.৫২	৬.৬৮	৪২.২২	৪২.২২
১০।	অন্যান্য ব্যয় (পেট্রোলিয়াম পণ্য পরিবহন সহ)	৬.০৭	৬.১১	৬.০৭	৬.০৭	০.০৭	০.০৭
মোট ব্যয় 'খ' (১ হতে ১০)		৯৫.১৫	১০৪.৫৫	৯৫.১৫	১০৪.৫৫	৯৫.১৫	১০৪.৫৫
গ)	পরিচালনা খুলাফা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	বিবিধ আয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঙ)	আয়কর ও শেওড়পূর্ব খুলাফা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
চ) কতন সমূহ							
১।	শেওড়পূর্ব	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২।	আয়কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩।	লভ্যাংশ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট কতন (চ)		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
নাইট উদ্ধৃতি (ঙ - চ)		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

(Signature)

(Signature)

বিক্রয় বিবরণী (গ্যাস)

প্রতিবেদনকালীন মাস : জুন ২০২৫

পরিমাণ : এম এম সি এম, মূল্য : কোটি টাকায়

	তিতাস		জালালাবাদ		বাখরাবাদ		কর্ণফুলি		পাটমাঞ্চল		মোট গ্যাস বিক্রয়	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১। চলতি মাস : জুন ২০২৫												
বাজেট	০.০০	০.০০	৫০.৪২	১৭.১১	৪০.২৫	১৩.৬৬	০.০০	০.০০	১৮.৭৫	৬.৩৬	১০৯.৪১	৩৭.১৪
প্রকৃত	০.০০	০.০০	৬৩.৭৪	২০.৭৬	৩৮.৬৩	১২.০৭	-	-	১৮.১৪	৫.৭২	১২০.৫১	৩৮.৫৪
২। বিগত মাস : মে ২০২৫												
বাজেট	০.০০	০.০০	৫৫.৫৮	১৮.৬৬	১১.৫০	৩.৭৭	০.০০	০.০০	২২.৯২	৭.৬৯	৯০.০০	৩০.২২
প্রকৃত	০.০০	০.০০	৬৯.৮৭	২২.৭৫	৪১.৩১	১২.৯১	-	-	১৮.১৪	৫.৭২	১২৯.৩২	৪১.৩৮
৩। ক্রমপঞ্জিভূত : চলতি বৎসর ২০২৪-২০২৫												
পর্যন্ত জুন ২০২৫												
বাজেট	০.০০	০.০০	৬০৫.০০	২০৫.০৮	৮৮.৩৮	১৬.৩৮	০.০০	০.০০	২২৪.৯৭	৭৬.৩৭	১৩১২.৯৭	৪৪৫.৭১
প্রকৃত	০.০০	০.০০	৬৭৬.০৬	২২০.১৫	৮৭.১৫	১৬.৩৮	০.০০	০.০০	২১৭.০৭	৬৫.৭৭	১৩৬৫.৬৫	৪৬৩.২২
৪। মোট বিগত বৎসর (২০২৩-২০২৪)												
বাজেট	০.০০	০.০০	৫৬০.০০	১৮১.৬১	১২৩.০০	৩৯.৯১	০.০০	০.০০	২৬৯.০০	৭৭.৭৭	১০৬৫.৬৭	৩০৮.৭৭
প্রকৃত	০.০০	০.০০	৫৭৮.৪৪	১৫৫.২১	১২৩.০০	৩৯.৯১	০.০০	০.০০	২৪৫.৩৫	৭৭.৭৭	১০৬৫.৬৭	৩০৮.৭৭
৫। ক্রমপঞ্জিভূত : আরম্ভকাল হতে												
পর্যন্ত জুন ২০২৫												
প্রকৃত	১১০৫৭.২১	১৯১২.৮১	২৪৪৬২.৯৬	৩৯৬২.৩৬	১৪৬৭৮	২৭৫৫.২৬	৭২৭৫১	৩১০০	২২৪৫২	০৭৪৪৬	৫৩৬২১.২২	৯৬২৫.১২





গ্রাহক ওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : জুন ২০২৫

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	কোম্পানী ও গ্রাহক খাত	বিলম্বিত শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া	চলতি মাস জুন ২০২৫		চলতি মাসের শেষ তারিখে বকেয়া পাওনা	চলতি বৎসর (২০২৪-২০২৫) ক্রমপুঞ্জীভূত জুন ২০২৫			বকেয়া কত মাসের গড় বিক্রয়	বকেয়া পাওনা কাল	বকেয়া আদায় কাল
			বিক্রয়	আদায়		বিক্রয়	আদায়	বকেয়া			
১	তিতাস	৭৩০০-	০০০	০০০	৭৩০০-	০০০	০০০	০০০	০০০	৭৩০০-	২০২৪-২০২৫
২	জালালাবাদ	১২৬২১	৬৩০	৩৭১৫	৭৯০৫১	৭৯০৫১	৭৯০৫১	৭৯০৫১	৩০০	৬৩০	২০২৪-২০২৫
৩	বাখরাবাদ	৬০৭৪৪	১২০১	১২১৯	৭২২০	৭২২০	৭২২০	৭২২০	৩০০	৬৩০	২০২৪-২০২৫
৪	কর্ণফুলি	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	২০২৪-২০২৫
৫	পশ্চিমাঞ্চল	৩৩২৬	৫৬২	১৭১	৩৩৬৬	৩৩৬৬	৩৩৬৬	৩৩৬৬	৩০০	৫৬২	২০২৪-২০২৫
৬	আরসিজিসিএল	৭০৫	০০০	০০০	৭০৫	৭০৫	৭০৫	৭০৫	৩০০	৭০৫	২০২৪-২০২৫
৭	বিপিসি	৬৩০	৬৩০	৬৩০	৬৩০	৬৩০	৬৩০	৬৩০	৩০০	৬৩০	২০২৪-২০২৫
৮	পদ্মা	৩৬০৫০	৬৬৪৯	২০৪৮৯	২২২১২	২২২১২	২২২১২	২২২১২	৩০০	৬৬৪৯	২০২৪-২০২৫
৯	মৈমনসিংহ	১৬৩৫৫	৬১২	০০০	১৬৩৫৫	১৬৩৫৫	১৬৩৫৫	১৬৩৫৫	৩০০	৬১২	২০২৪-২০২৫
১০	যমুনা	১৬২০৩	৩৩৩	২৩২	১৬২০৩	১৬২০৩	১৬২০৩	১৬২০৩	৩০০	২৩২	২০২৪-২০২৫
১১	উপমোটি (ভেল কোং)	৬৮৬৬	১৬৫১৪	২২২২২	৬৮৬৬	৬৮৬৬	৬৮৬৬	৬৮৬৬	৩০০	১৬৫১৪	২০২৪-২০২৫
১২	অ্যান্ডার্সন (স্পার)	০০০	৭৭৩	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	৩০০	৭৭৩	২০২৪-২০২৫
১৩	বিজিএফসিএল	৭১৫	০০০	০০০	৭১৫	৭১৫	৭১৫	৭১৫	৩০০	৭১৫	২০২৪-২০২৫
১৪	এলপি গ্যাস লিঃ	৭১৫	০০০	০০০	৭১৫	৭১৫	৭১৫	৭১৫	৩০০	৭১৫	২০২৪-২০২৫
১৫	মোট	১০২৯৩	২২১৮৭	১৩৩৫	১০২৯৩	১০২৯৩	১০২৯৩	১০২৯৩	১০২৯৩	১০২৯৩	২০২৪-২০২৫

স্বাক্ষর

-০৫-

স্বাক্ষর

প্রদেয় ভ্যাট এর বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : জুন ২০২৫

(কোটি টাকায়)

এজেন্সীর নাম	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত দেয় অংক	চলতি মাস জুন ২০২৫		চলতি মাসের শেষ তারিখে ক্রমপঞ্জীভূত দেয় অংক	উদ্ধৃতি কাল (এজিং)			চলতি বছরের ক্রমপঞ্জীভূত দেয় অংক ২০২৪-২০২৫	চলতি বছরের ক্রমপঞ্জীভূত পরিশোধিত অংক ২০২৪-২০২৫	বিগত বছরের ৩০শে জুন দেয় অংক ২০২৩-২০২৪
		দেয়	পরিশোধিত		এপ্রিল ২০২৫	মে ২০২৫	জুন ২০২৫			
হরিপুর ফিল্ড	৭.০০	৩.২৫	২.৮২	৭.৪৪	২.৪৭	০১.৪	৩.২৫	২৫.৩৫	২১.০৩	১৩.৭১
কৈলাশটিলা	২০.০০	০০.০০	০০.০০	২০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	৬১.১০	১১.০০	০.১৩
এমএসটিই	৬৬.৯১	৮.৮২	১৭.৮৮	৮৬.৬১	৪৪.২১	৮০.৪১	৮৮.২১	৯৯.৩৪	২৯.৯৮	৬০.৫১
রশিদপুর	৫৫.৫৫	১২.৮৮	৬৯.১১	৭৮.৫৬	৯২.৮৮	৮৬.৮৮	১২.৮৮	০৮.০০	০৮.০০	৫৫.৫৫
বিয়ানী বাজার	৮৯.৮৮	৬৮.৮৮	৩০.৮৮	৮৯.৮৮	৯৮.৮৮	০৮.৮৮	৬৮.৮৮	২৮.৮৮	৮৮.৮৮	৮৮.৮৮
আরসিএফপি	১৬৬.১৬	৮৯.৮৮	৩১.০০	১৬৬.১৬	৬০.৮৮	৯০.৮৮	৮৯.৮৮	০১.৬৮	৬৮.৮৮	৩৬.৬৮
৪০০০ বিপিডি	১০৩.৭৬	০৯.৯৬	২৪.১৬	১১০.০৫	০৮.৮৮	২২.৮৮	০৯.৬৮	৬৬.৯৬	৬৬.৯৬	১৯২.৫২
মোট	১২০.৬৬	৮০.৬০	৫২.৫২	১১৯.১১	৮৮.৮৮	৬৮.৮৮	৮৮.৮৮	০৬.৮৮	৮৮.৮৮	৫১.৬৬

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : জুন ২০২২

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণী	বিগত মাস মে ২০২২	চলতি মাস জুন ২০২২	বিগত বৎসরের মোট ২০২১-২০২২	চলতি বৎসরের মোট ২০২২-২৩	প্রারম্ভিক
ক) প্রকৃত প্রদান ভিত্তিক :						
১	ভ্যাট	৫০.৭৪	৪০.২২	৫০.৭৪	৪০.২২	৫০.৭৪
২	আয়কর	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
৪	কাষ্টম কর	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
৫	ডি এস এল	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
৬	অন্যান্য	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
মোট প্রদান		৫০.৭৪	৪০.২২	৫০.৭৪	৪০.২২	৫০.৭৪

খ) ট্যাক্সফ্র্যাগ (প্রভিশনাল ভিত্তিক)

১	ভ্যাট	৬৭.৪২	৫০.৬০	৬৭.৪২	৫০.৬০	৬৭.৪২
২	আয়কর	৭০.৬২	৬০.২০	৭০.৬২	৬০.২০	৭০.৬২
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫
৪	কাষ্টম কর	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
৫	ডি এস এল	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
৬	অন্যান্য	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
মোট		১৩৪.২৯	১১৭.২৫	১৩৪.২৯	১১৭.২৫	১৩৪.২৯

৫০.৭৪

৫০.৭৪

মাসের মজুদ বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : জুন ২০২৫

পরিমাপ : হাজার টিটার, মূল্য : কোটি টাকা

ক্রমিক ক.নং	বিবরণ	বিশত মাসের শেষ তারিখ ৩০-০৬-২০২৪										বিশত মাসের শেষ তারিখ ৩০-০৬-২০২৪											
		হরিপুর	কোচাল	এমকেটিই	আরসিএফ	বিজিএফ	আরসিএফ	বিজিএফ	আরসিএফ	কোচাল	এমকেটিই	হরিপুর	কোচাল	এমকেটিই	আরসিএফ	বিজিএফ	আরসিএফ	মোট					
১	অক্টোবর																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
২	নভেম্বর																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
৩	ডিসেম্বর																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
৪	জানুয়ারি																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
৫	ফেব্রুয়ারি																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
৬	মার্চ																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
৭	এপ্রিল																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
৮	মে																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
৯	জুন																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
১০	জুলাই																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
১১	আগস্ট																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
১২	সেপ্টেম্বর																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
১৩	অক্টোবর																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
১৪	নভেম্বর																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
১৫	ডিসেম্বর																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
১৬	জানুয়ারি																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
১৭	ফেব্রুয়ারি																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
১৮	মার্চ																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
১৯	এপ্রিল																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
২০	মে																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
২১	জুন																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
২২	জুলাই																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
২৩	আগস্ট																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
২৪	সেপ্টেম্বর																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
২৫	অক্টোবর																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
২৬	নভেম্বর																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
২৭	ডিসেম্বর																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
২৮	জানুয়ারি																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
২৯	ফেব্রুয়ারি																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
৩০	মার্চ																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
৩১	এপ্রিল																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
৩২	মে																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
৩৩	জুন																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
৩৪	জুলাই																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
৩৫	আগস্ট																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
৩৬	সেপ্টেম্বর																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
৩৭	অক্টোবর																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						
৩৮	নভেম্বর																						
	পরিমাণ																						
	মূল্য																						</

Signature

১৩৮

Signature

নগদ তহবিল বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : জুন ২০২৫

(কেটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	ক্যাশ ব্যালান্স	ব্যাংক ব্যালান্স				মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালান্স
			চলতি হিসাব	স্বল্প মেয়াদী হিসাব	দীর্ঘ মেয়াদী হিসাব	মোট ব্যাংক ব্যালান্স	
১	চলতি মাসের শেষ তারিখ ৩০-০৬-২০২৫	০.০০৪	২.১৫০	৪০০.০১২	৯৪৪.৬৫৮	১৩৪৬.৮২০	১৩৪৬.৮২৪
২	বিগত মাসের শেষ তারিখ ৩১-০৫-২০২৫	০.০০৫	১.৬০২	৩৭৩.২৭২	৯৪৪.৬৫৮	১৩১৯.৫৩২	১৩১৯.৫৩৭
৩	বিগত বছরের শেষ তারিখ ৩০-০৬-২০২৪	০.০০৫	০.৬২২	৩.৪৮১	১৩৩২.৭৯৩	১৪০২.৩৮৬	১৪০২.৩৯১

Handwritten signature

Handwritten signature

বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের গ্যাস ও উপজাত তেল বিক্রয়

আয়-ব্যয় এবং বকেয়া পাওনার বিশ্লেষণ বিবরণী

ক্রমিক নং	মাস	গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ (এম এম সি এম)	উপজাত তেল বিক্রয়ের পরিমাণ (হাজার লিটার)	আয় (কোটি টাকায়)	ব্যয় (এসডি ভ্যাটিসহ) (কোটি টাকায়)	বকেয়া পাওনা (কোটি টাকায়)
১	চলতি মাস জুন ২০২৫	১২০.৫১	২২,৩৬১.৫৩	২২১.৪১	১৫৫.৭৭	৯৬২.৮০
২	বিগত মাস মে ২০২৫	১২৯.৩২	২৪,৫৮৯.৪৯	২৩৯.৬০	১৫১.৫৪	১০২৯.৭৩
৩	কম/বেশী (বিগত মাস হতে চলতি মাস)					
ক)	পরিমাণ	-৮.৮১	-২২২৭.৯৬	-১৮.১৯	৪.২৩	-৬৬.৯৪
খ)	পরিমাণ হ্রাস / বৃদ্ধির শতকরা হার (%)	-৬.৮১%	-৯.০৬%	-৭.৫৯%	২.৭৯%	-৬.৫০%
৪	বিগত বছরের জুন ২০২৪	৯৯.০০	১৭৪৩৭.৯৮	১৭৫.৮০	১৪১.১৩	১১১৬.৯১
৫	কম/বেশী (বিগত বৎসরের চলতি মাস হতে চলতি বৎসরের চলতি মাস)					
ক)	পরিমাণ	২১.৫১	৪৯২৩.৫৫	৪৫.৬১	১৪.৬৪	-১৫৪.১১
খ)	পরিমাণ হ্রাস / বৃদ্ধির শতকরা হার (%)	২১.৭৩%	২৮.২৩%	২৫.৯৫%	১০.৩৭%	-১৩.৮০%

[Signature]

[Signature]

মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ বৎসরের বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ: এমএমসিএম, মূল্য: মিলিয়ন টাকায়

মাস	তিতাস		জালালাবাদ		বাখরাবাদ		কর্ণফুলী		পশ্চিমাঞ্চল		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
জুলাই ২৪	০.০০	০.০০	৪৫.৫৩	১১২.২৫	৩৭.৫২	১১৭.২৬	০০.০	০০.০	১৮.১৭	৫৭.১৬	১০১.১৯	৩২২.৬৭
আগস্ট ২৪	০.০০	০.০০	৫২.৬৭	১৬১.৮৫	৩৮.৩৩	১১৯.৭৩	০০.০	০০.০	৪১.৮১	৫৭.১৬	১০৯.১৩	৩৪৮.৪৩
সেপ্টেম্বর ২৪	০.০০	০.০০	৫১.৮৫	১৬৭.৮৫	৩৯.৬৯	১২৪.৩৭	০০.০	০০.০	৪১.৮১	৫৭.১৬	১০৯.৮০	৩৪৯.১২
অক্টো ২৪	০.০০	০.০০	৫২.৫২	১৬১.৮৫	৪৮.৪৮	১৩০.৭৬	০০.০	০০.০	৪১.৮১	৫৭.১৬	১১২.৫০	৩৫৮.৯৩
নভে ২৪	০.০০	০.০০	৫৯.৮৫	১৬৭.৮৫	৫৯.৬৩	১৭১.১৫	০০.০	০০.০	৪১.৮১	৫৭.১৬	১১১.৬১	৩৫৬.৬৩
ডিসে ২৪	০.০০	০.০০	৬৬.৮৫	১৭১.৮৫	৬৬.৮৫	১৭১.৮৫	০০.০	০০.০	৪১.৮১	৫৭.১৬	১১১.৬১	৩৫৬.৬৩
জানু ২৫	০.০০	০.০০	৬৬.৮৫	১৭১.৮৫	৬৬.৮৫	১৭১.৮৫	০০.০	০০.০	৪১.৮১	৫৭.১৬	১১১.৬১	৩৫৬.৬৩
ফেব্রু ২৫	০.০০	০.০০	৬৬.৮৫	১৭১.৮৫	৬৬.৮৫	১৭১.৮৫	০০.০	০০.০	৪১.৮১	৫৭.১৬	১১১.৬১	৩৫৬.৬৩
মার্চ ২৫	০.০০	০.০০	৬৬.৮৫	১৭১.৮৫	৬৬.৮৫	১৭১.৮৫	০০.০	০০.০	৪১.৮১	৫৭.১৬	১১১.৬১	৩৫৬.৬৩
এপ্রিল ২৫	০.০০	০.০০	৬৬.৮৫	১৭১.৮৫	৬৬.৮৫	১৭১.৮৫	০০.০	০০.০	৪১.৮১	৫৭.১৬	১১১.৬১	৩৫৬.৬৩
মে ২৫	০.০০	০.০০	৬৬.৮৫	১৭১.৮৫	৬৬.৮৫	১৭১.৮৫	০০.০	০০.০	৪১.৮১	৫৭.১৬	১১১.৬১	৩৫৬.৬৩
জুন ২৫	০.০০	০.০০	৬৬.৮৫	১৭১.৮৫	৬৬.৮৫	১৭১.৮৫	০০.০	০০.০	৪১.৮১	৫৭.১৬	১১১.৬১	৩৫৬.৬৩
সমগ্র	০.০০	০.০০	৬৬.৮৫	১৭১.৮৫	৬৬.৮৫	১৭১.৮৫	০০.০	০০.০	৪১.৮১	৫৭.১৬	১১১.৬১	৩৫৬.৬৩
মোট	০.০০	০.০০	৬৬.৮৫	১৭১.৮৫	৬৬.৮৫	১৭১.৮৫	০০.০	০০.০	৪১.৮১	৫৭.১৬	১১১.৬১	৩৫৬.৬৩

০০.০০

০০.০০

বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ বৎসরের বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ: এম এস সি এম, মূল্য: মিলিয়ন টাকায়








বৎসর	তিতাস		জালালাবাদ		বাখরাবাদ		কর্ণফুলী		পশ্চিমাঞ্চল		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
২০১০ - ২০১১	১৬.০০	০০.০৮	৭৫.৮৪	২০০০.৬৮	৪৯৬.৩০	১৩৪৮.৪১	৩৫২.৫৩	৯৩৩.৫২	-	-	১৬১৯.৭০	৪৩২৭.৫৯
২০১১ - ২০১২	২৭.৬০	০০.৮৮	৭৬.৮৪	১৯৯৮.৯৫	২১৮.৬২	১৩১৯.২২	৩৬.২৫	৯০০.৯৮	-	-	১৫৬৪.৮২	৪০৬৯.৬০
২০১২ - ২০১৩	২৭.৬০	০০.৮৮	৭৬.৮৪	১৯৯৮.৯৫	২১৮.৬২	১৩১৯.২২	৩৬.২৫	৯০০.৯৮	২৩৩.২২	৫২৬.৭০	১৫৯১.৩১	৪৩০৫.৫০
২০১৩ - ২০১৪	২৭.৬০	০০.৮৮	৭৬.৮৪	১৯৯৮.৯৫	২১৮.৬২	১৩১৯.২২	৩৬.২৫	৯০০.৯৮	২৩৩.২২	৫২৬.৭০	১৫৯১.৩১	৪৩০৫.৫০
২০১৪ - ২০১৫	২৭.৬০	০০.৮৮	৭৬.৮৪	১৯৯৮.৯৫	২১৮.৬২	১৩১৯.২২	৩৬.২৫	৯০০.৯৮	২৩৩.২২	৫২৬.৭০	১৫৯১.৩১	৪৩০৫.৫০
২০১৫ - ২০১৬	২৭.৬০	০০.৮৮	৭৬.৮৪	১৯৯৮.৯৫	২১৮.৬২	১৩১৯.২২	৩৬.২৫	৯০০.৯৮	২৩৩.২২	৫২৬.৭০	১৫৯১.৩১	৪৩০৫.৫০
২০১৬ - ২০১৭	২৭.৬০	০০.৮৮	৭৬.৮৪	১৯৯৮.৯৫	২১৮.৬২	১৩১৯.২২	৩৬.২৫	৯০০.৯৮	২৩৩.২২	৫২৬.৭০	১৫৯১.৩১	৪৩০৫.৫০
২০১৭ - ২০১৮	২৭.৬০	০০.৮৮	৭৬.৮৪	১৯৯৮.৯৫	২১৮.৬২	১৩১৯.২২	৩৬.২৫	৯০০.৯৮	২৩৩.২২	৫২৬.৭০	১৫৯১.৩১	৪৩০৫.৫০
২০১৮ - ২০১৯	২৭.৬০	০০.৮৮	৭৬.৮৪	১৯৯৮.৯৫	২১৮.৬২	১৩১৯.২২	৩৬.২৫	৯০০.৯৮	২৩৩.২২	৫২৬.৭০	১৫৯১.৩১	৪৩০৫.৫০
২০১৯ - ২০২০	২৭.৬০	০০.৮৮	৭৬.৮৪	১৯৯৮.৯৫	২১৮.৬২	১৩১৯.২২	৩৬.২৫	৯০০.৯৮	২৩৩.২২	৫২৬.৭০	১৫৯১.৩১	৪৩০৫.৫০
২০২০ - ২০২১	২৭.৬০	০০.৮৮	৭৬.৮৪	১৯৯৮.৯৫	২১৮.৬২	১৩১৯.২২	৩৬.২৫	৯০০.৯৮	২৩৩.২২	৫২৬.৭০	১৫৯১.৩১	৪৩০৫.৫০
২০২১ - ২০২২	২৭.৬০	০০.৮৮	৭৬.৮৪	১৯৯৮.৯৫	২১৮.৬২	১৩১৯.২২	৩৬.২৫	৯০০.৯৮	২৩৩.২২	৫২৬.৭০	১৫৯১.৩১	৪৩০৫.৫০
২০২২ - ২০২৩	২৭.৬০	০০.৮৮	৭৬.৮৪	১৯৯৮.৯৫	২১৮.৬২	১৩১৯.২২	৩৬.২৫	৯০০.৯৮	২৩৩.২২	৫২৬.৭০	১৫৯১.৩১	৪৩০৫.৫০
২০২৩ - ২০২৪	২৭.৬০	০০.৮৮	৭৬.৮৪	১৯৯৮.৯৫	২১৮.৬২	১৩১৯.২২	৩৬.২৫	৯০০.৯৮	২৩৩.২২	৫২৬.৭০	১৫৯১.৩১	৪৩০৫.৫০
২০২৪-২০২৫ এর জুন ২০২৫ মাস পর্যন্ত	০.০০	০.০০	৬৭৬.০৬	২২০১.৫২	৪৭১.৮৯	১৪৯৮.৭৮	০.০০	০.০০	২১৭.৭০	৬৮৫.৯০	১৩৬৫.৬৫	৪৩৬২.২০

[Signature]

[Signature]

কোম্পানির ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন চিত্র

প্রতিবেদনাধীনঃ জুন ২০২৫

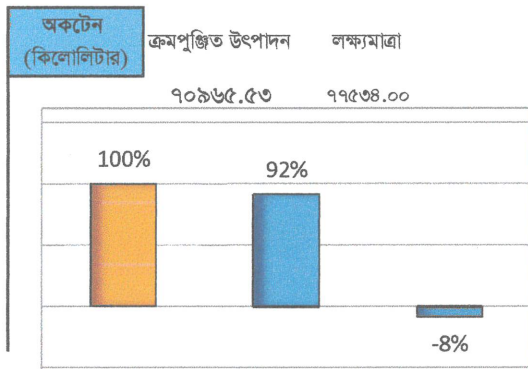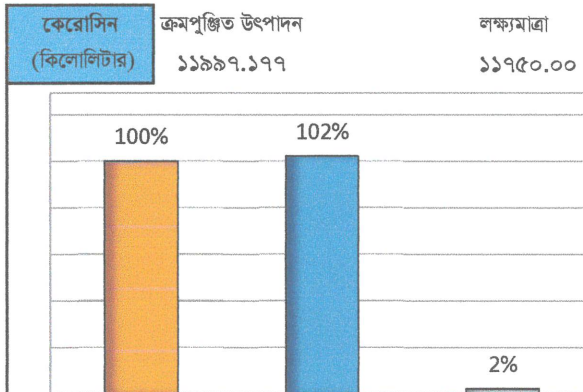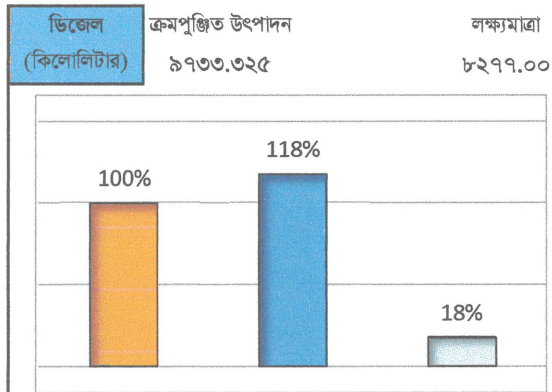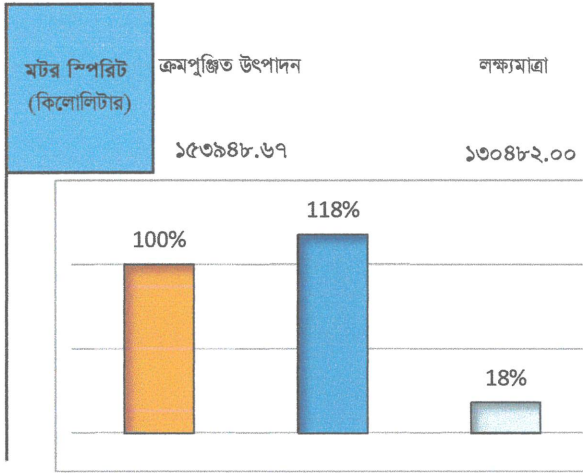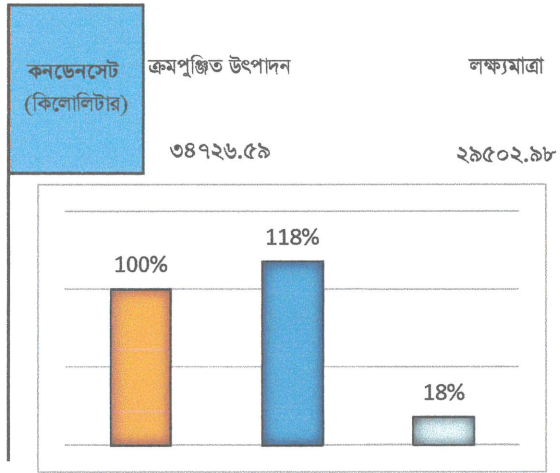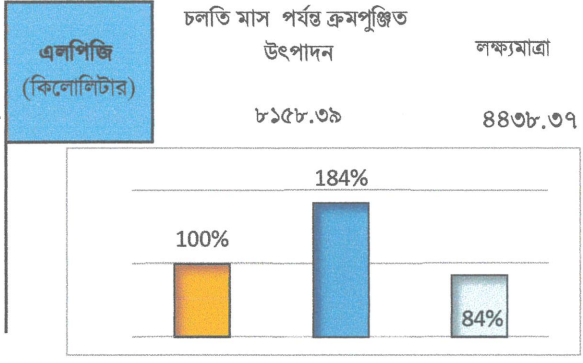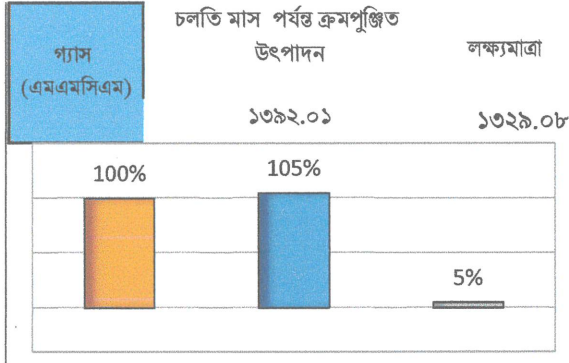








পরিচিতি

লক্ষ্যমাত্রা	
চলতি মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন-	
ঘাটতি (-)/বর্ধিত (+)	

Signature

Signature

কোম্পানির ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিত বিক্রয় চিত্র
প্রতিবেদনাধীন মাস: জুন ২০২৫

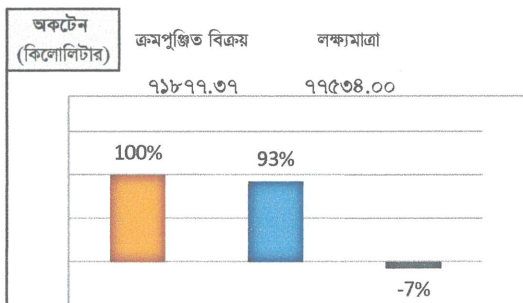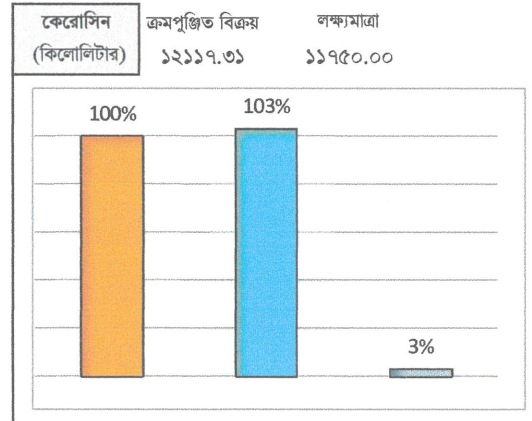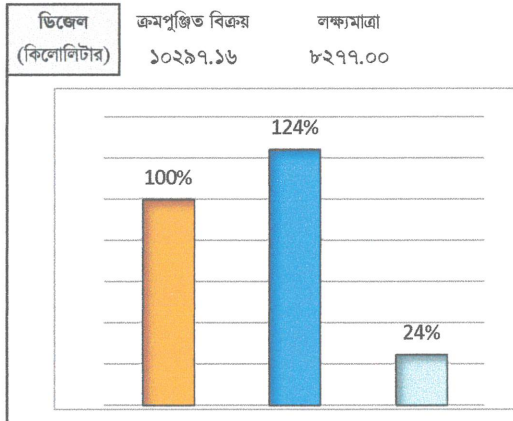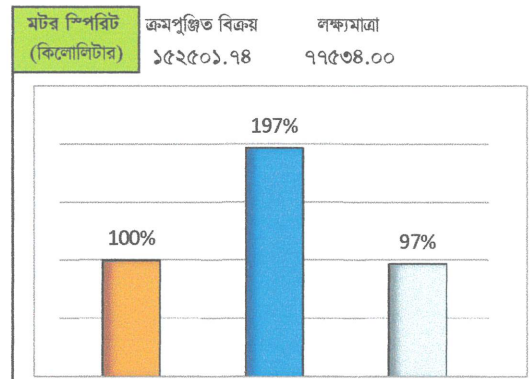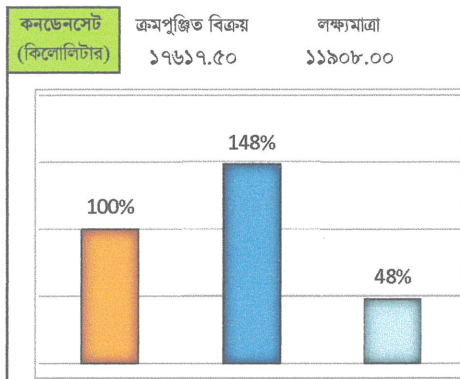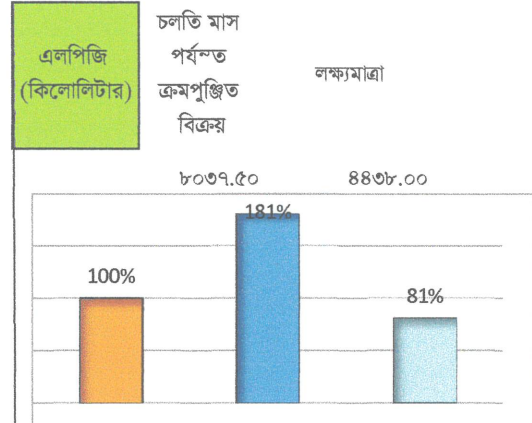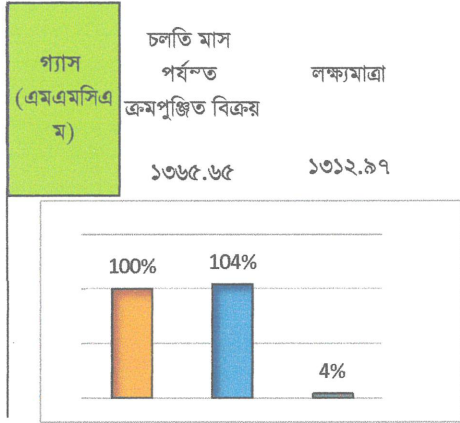

পরিচিতি	
লক্ষ্যমাত্রা	
চলতি মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বিক্রয়	
ঘটতি (-)/ বর্ধিত (+)	

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর আওতায় ৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নধীন রয়েছে। উক্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে ৩টি নিজস্ব অর্থায়নে, ৩টি নিজস্ব ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল এবং ৩টি নিজস্ব ও জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসজিএফএল-এর চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন ২০২৫ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন:

(ক) এ্যাকরেজ ব্লক- ১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প, ১ম সংশোধিত।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	: এ্যাকরেজ ব্লক- ১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় গ্যাস রিজার্ভ ও রিসোর্স মূল্যায়নে অধিকতর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ভবিষ্যত গ্যাস চাহিদা মেটাতে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা; এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় (৮৬৫+১২৯=) ৯৯৪ বর্গকিলোমিটার ৩ডি সাইসমিক জরিপ পরিচালনা করা এবং কম-বেশী ৮ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত হাইড্রোকার্বন পে-জোন চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করা।																									
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	: <table><tr><td>স্থানীয় মুদ্রা</td><td>:</td><td>৭৯৫৭.০০</td></tr><tr><td>বৈদেশিক মুদ্রা</td><td>:</td><td>৩১৭১০.০০</td></tr><tr><td>মোট</td><td>:</td><td>৩৯৬৬৭.০০</td></tr></table>						স্থানীয় মুদ্রা	:	৭৯৫৭.০০	বৈদেশিক মুদ্রা	:	৩১৭১০.০০	মোট	:	৩৯৬৬৭.০০											
স্থানীয় মুদ্রা	:	৭৯৫৭.০০																									
বৈদেশিক মুদ্রা	:	৩১৭১০.০০																									
মোট	:	৩৯৬৬৭.০০																									
৩	বাস্তবায়নকাল	: আরম্ভ: জুলাই ২০২১ সমাপ্তি: ডিসেম্বর ২০২৫																									
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	: ডিপিপি: ২৬-০৮-২০২১ এবং আরডিপিপি: ০৪-১১-২০২৪																									
৫	অর্থায়নের উৎস	: কোম্পানির নিজস্ব অর্থ এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)																									
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	: <table><tr><td colspan="2">জুন'২৪ পর্যন্ত অর্জন</td><td rowspan="2">আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)</td><td colspan="2">২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জুন ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি</td><td colspan="2">প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি</td></tr><tr><td>আর্থিক</td><td>বাস্তব</td><td>আর্থিক</td><td>বাস্তব</td><td>আর্থিক</td><td>বাস্তব</td></tr><tr><td>১৪১৮৯.০০</td><td>৮০.৮১%</td><td>২২৩৭৫.০০</td><td>২২৩৩২.৯৩</td><td>১৬.১৯%</td><td>৩৬৫২১.৯৩</td><td>৯৭%</td></tr></table>						জুন'২৪ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জুন ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	১৪১৮৯.০০	৮০.৮১%	২২৩৭৫.০০	২২৩৩২.৯৩	১৬.১৯%	৩৬৫২১.৯৩	৯৭%
জুন'২৪ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জুন ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি																						
আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব																					
১৪১৮৯.০০	৮০.৮১%	২২৩৭৫.০০	২২৩৩২.৯৩	১৬.১৯%	৩৬৫২১.৯৩	৯৭%																					
৭	জুন ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	: এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৮৬৫ বর্গকিলোমিটার ৩ডি সাইসমিক ডাটা একুইজিশন, প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশনসহ প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগের লক্ষ্যে কোম্পানি পরিচালনা পর্যদের অনুমোদনক্রমে BGP Inc, China- এর সাথে ২৯-০৬-২০২২ তারিখে চুক্তি সম্পাদন এবং ১৩-১১-২০২৪ তারিখে চুক্তি সংশোধন করা হয়েছে। এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর প্রকল্প এলাকায় সর্বমোট ৮৬৫ বর্গকিলোমিটার ডাটা একুইজিশন, প্রসেসিং, ইন্টারপ্রিটেশন, পেট্রোফিজিক্যাল এনালাইসিস, স্ট্যাটিক ও ডাইনামিক মডেলিং, হাইড্রোকার্বন রিসোর্স এস্টিমেশন, ফিল্ড ডেভলপমেন্ট প্লান এবং ১০টি ডিলেবল কুপ লোকেশন চিহ্নিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রসপেক্টসমূহে ১০টি অনুসন্ধান কুপ খননের লোকেশন প্রদান করেছে-তন্মধ্যে ডুপিটলা প্রসপেক্ট-এ ১টি কুপ খননের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ডুপিটলা-২, সিলেট সাউথ-১, বাতচিয়া-১ ও হারারগঞ্জ-১ সহ মোট ৪টি কুপ খনন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে-যা অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত প্রসপেক্টসমূহে সর্বমোট ২৫২৯.১৯ বিসিএফ গ্যাস ও ৮৮.৬৪ মিলিয়ন ব্যারেল তেলের রিসোর্স এস্টিমেট করা হয়েছে। প্রকল্পের বর্ধিত কুড়িগাঁও (১২৯ বর্গ কি.মি) এলাকায় ২১-১১-২০২৪ তারিখ হতে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদনের লক্ষ্যে সার্ভে, শ্যুট -হোল ড্রিলিং ও এক্সপ্লোসিভ লোডিং শুরু করে ০৯-০১-২০২৫ তারিখে ডাটা একুইজিশন/রেকর্ডিং এবং ০২-০৬-২০২৫ তারিখে ডাটা প্রসেসিং সম্পন্ন সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত ডাটার ইন্টারপ্রিটেশন এর কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল বর্ধিতকরণ: প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব জালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২২-০৬-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।																									

- ২০ -

(খ) সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন, ১ম সংশোধিত।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য :	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট স্ট্রাকচারে নর্দান ক্রোজারে ২৫৭৬ মিটার গভীরতায় একটি অনুসন্ধান কূপ (সিলেট-১০) এবং এ কূপের আওতায় অধিকহারে গ্যাস উত্তোলনের জন্য মূল ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩৩০০ (± ১০০) মিটার গভীরতায় আরো একটি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ (সিলেট-১০এক্স) খনন করা; সিলেট-১০ ও সিলেট-১০এক্স কূপ খনন করত: ১০৬ বিসিএফ গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি এবং প্রথম ৫ বছর দৈনিক প্রায় ৪০ (সিলেট-১০: ২০ ও সিলেট-১০এক্স: ২০) মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছর দৈনিক প্রায় ৩৫ (সিলেট-১০: ২০ ও সিলেট-১০এক্স: ১৫) মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।																									
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	<table><tr><td>স্থানীয় মুদ্রা</td><td>:</td><td colspan="4">১৩৯০১.০০</td></tr><tr><td>বৈদেশিক মুদ্রা</td><td>:</td><td colspan="4">৩৭৮০৯.০০</td></tr><tr><td>মোট</td><td>:</td><td colspan="4">৫১৭১০.০০</td></tr></table>						স্থানীয় মুদ্রা	:	১৩৯০১.০০				বৈদেশিক মুদ্রা	:	৩৭৮০৯.০০				মোট	:	৫১৭১০.০০					
স্থানীয় মুদ্রা	:	১৩৯০১.০০																									
বৈদেশিক মুদ্রা	:	৩৭৮০৯.০০																									
মোট	:	৫১৭১০.০০																									
৩	বাস্তবায়নকাল	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২১ সমাপ্তি: জুন ২০২৬																									
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	ডিপিপি: ২৩-১২-২০২১ এবং আরডিপিপি: ২৭-০৫-২০২৪																									
৫	অর্থায়নের উৎস	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)																									
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	<table><tr><td colspan="2">জুন'২৪ পর্যন্ত অর্জন</td><td rowspan="2">আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)</td><td colspan="2">২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জুন ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি</td><td colspan="2">প্রকল্পের শুরুর হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি</td></tr><tr><td>আর্থিক</td><td>বাস্তব</td><td>আর্থিক</td><td>বাস্তব</td><td>আর্থিক</td><td>বাস্তব</td></tr><tr><td>১৮৩১৫.১৭</td><td>৪১.৪৫%</td><td>৬২৭৫.০০</td><td>৬২৭৩.৭০</td><td>২৯.৬২%</td><td>২৪৫৮৮.৮৭</td><td>৭১.০৭%</td></tr></table>						জুন'২৪ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জুন ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরুর হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	১৮৩১৫.১৭	৪১.৪৫%	৬২৭৫.০০	৬২৭৩.৭০	২৯.৬২%	২৪৫৮৮.৮৭	৭১.০৭%
জুন'২৪ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জুন ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরুর হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি																						
আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব																					
১৮৩১৫.১৭	৪১.৪৫%	৬২৭৫.০০	৬২৭৩.৭০	২৯.৬২%	২৪৫৮৮.৮৭	৭১.০৭%																					
৭	জুন ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	ভূমি অধিগ্রহণ: প্রকল্পের আওতায় ৮.৪৮১ একর জমি অধিগ্রহণ কাজ গত ২২-০৯-২০২২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। খনন ঠিকাদার নিয়োগ: সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্পের আওতায় টার্গ-কি ভিত্তিতে কূপ খনন অপারেশন, মালামাল সরবরাহ, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য সিসিজিপি'র অনুমোদনক্রমে নির্বাচিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান Sinopec International Petroleum Service Corporation, China-এর সাথে ০৭-০৯-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ২৪-০৬-২০২৩ তারিখে খনন কাজ শুরু (স্পাড-ইন) করে ২৫৭৬ মিটার গভীরতায় খনন সমাপ্ত করা হয়েছে। কূপটির বটম ইন্টারভাল ২৫৪০-২৫৬৫ মিটার জোনের গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যে Well Completion এর কাজ গত ০৭-০২-২০২৪ তারিখে সম্পন্ন হয়। গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ: ১০ কিলোমিটার উচ্চচাপ গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান GasMin Limited, Dhaka এর সাথে ২৮-০৩-২০২৪ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ১০ কিলোমিটার গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন স্থাপন শেষে ২৭-০৪-২০২৫ তারিখে সিলেট-১০ নং কূপ হতে কম-বেশি ১০-১২.৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উত্তোলন করে জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা হয়। বর্তমানে উক্ত কূপ হতে কম-বেশি দৈনিক ৫-৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জেজিটিডিএসএল-এ সরবরাহ করা হচ্ছে এবং প্রতি মিলিয়ন গ্যাসের সাথে আনুমানিক ১৫ ব্যারেল হারে কনডেনসেট পাওয়া যাচ্ছে।																									

Handwritten signature

Handwritten signature

		বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: প্রকল্পের আওতায় সিলেট-১০নং কূপ খননে মোট তিনজন বৈদেশিক পরামর্শক প্রকল্প সাইটে কাজ করেছেন। সিলেট-১০এক্স কূপ খনন চলাকালীন সময়ে ৩ ক্যাটাগরিতে বৈদেশিক পরামর্শক সেবা গ্রহণের নিমিত্ত ১২.১২.২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। কূপ খননকালীন সময়ে উক্ত সেবা গ্রহণ করা হবে। বাস্তব কাজ ১৫% সম্পন্ন হয়েছে। সিলেট-১০এক্স নং কূপ: সিলেট-১০নং কূপটি সফলভাবে খননের মাধ্যমে কয়েকটি লেয়ারে গ্যাস ও তেলের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়ায় এ কূপের আওতায় অধিক হারে গ্যাস উত্তোলনের লক্ষ্যে ৩৩০০ (±১০০) মিটার গভীরতায় মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ (সিলেট-১০এক্স) খননের জন্য প্রকল্পের ১ম সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (১ম আরডিপিপি) ২৭-০৫-২০২৪ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে অনুমোদিত হয়েছে। সিলেট-১০এক্স কূপ খননের লক্ষ্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CNPC Chuangning Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), China এর সাথে ১৯-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CCDC, China কর্তৃক খনন রিগ ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক, খনন মালামাল এবং প্রয়োজনীয় জনবল খনন সাইটে মবিলাইজেশনের জন্য ২৫-০২-২০২৫ তারিখে ঠিকাদারকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CCDC, China-এর অনুকূলে ২৯-০৪-২০২৫ তারিখে Letter of Credit (LC) খোলা হয়েছে। কূপ খনন মালামালের ১ম শিপমেন্ট ২২-০৪-২০২৫ তারিখে এবং ০২-০৫-২০২৫ তারিখে রিগ ও এক্সেসরিজ, মাদ কেমিক্যালস, সিমেন্ট এডিটিভস ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ সমূহের কিছু মালামাল ইতোমধ্যে প্রকল্প সাইটে এসে পৌঁছেছে ও অবশিষ্ট মালামাল চট্টগ্রাম বন্দরে খালাসের জন্য অপেক্ষমান যা অতি শীঘ্রই প্রকল্প সাইটে পৌঁছাবে। চুক্তিবদ্ধ স্থানীয় ঠিকাদার মেসার্স বেলাল এন্টারপ্রাইজ এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১৬টি সিটু পাইল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১৭-০৬-২০২৫ তারিখে রিগ ফ্লোরের ঢালাই এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২৫-০৬-২০২৫ তারিখ হতে ৩০ ইঞ্চি কন্ডাকটর কেসিং ৩০±৫ মিটার রান করার জন্য হাইড্রলিক রোটোরি বোরিং রিগ মেশিনের মাধ্যমে ৩৬ ইঞ্চি হোল শুরুর করা হয়েছে। হোল করা শেষে কন্ডাকটর কেসিং স্থাপন করতঃ উক্ত সেকশনের সিমেন্টেশনের কাজ সম্পন্ন করা হবে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CCDC, China কর্তৃক রিগ ও যন্ত্রপাতি রিগ প্যাডে স্থাপন, রিগ আপ, টেস্টিং ও কমিশনিং শেষে জুলাই'২৫ এর শেষ সপ্তাহে কূপ খনন কাজ শুরু হবে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল বর্ধিতকরণ: প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২২-০৬-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।
--	--	---

(গ) হরিপুর গ্যাস ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন (১ম সংশোধিত)।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	: গ্যাস প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য হরিপুর গ্যাস ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন; হরিপুর ফিল্ডের কূপসমূহ হতে উত্তোলিত গ্যাস প্রসেস করে তা সরবরাহের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।									
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	<table> <tr> <td>স্থানীয় মূল্য</td><td>:</td><td>২৩০৮.০০</td></tr> <tr> <td>বৈদেশিক মূল্য</td><td>:</td><td>১২৮৭২.০০</td></tr> <tr> <td>মোট</td><td>:</td><td>১৫১৮০.০০</td></tr> </table>	স্থানীয় মূল্য	:	২৩০৮.০০	বৈদেশিক মূল্য	:	১২৮৭২.০০	মোট	:	১৫১৮০.০০
স্থানীয় মূল্য	:	২৩০৮.০০									
বৈদেশিক মূল্য	:	১২৮৭২.০০									
মোট	:	১৫১৮০.০০									

৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২২ সমাপ্তি: জুন ২০২৫						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ৩১-০৮-২০২২ এবং আরডিপিপি: ০৯-১২-২০২৪						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৪ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জুন ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
			৭৫৩০.০০	৭৭.৬৩%	৭১৩৫.০০	৭১৩৪.১৫	২২.৩৭%	১৪৬৬৪.১৫	১০০%
৭	জুন ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	প্লান্ট স্থাপন কাজ: প্রকল্পের আওতায় ইপিপি ঠিকাদার কর্তৃক প্রসেস প্লান্ট স্থাপন কাজ ০২-১০-২০২৪ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। ১৭-১১-২০২৪ হতে ৩০-১১-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্লান্ট কমিশনিং এবং ০১-১২-২০২৪ হতে ০৭-১২-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্লান্টের টেস্ট রান সফলভাবে সম্পন্ন শেষে Acceptance কমিটি কর্তৃক নবনির্মিত প্রসেস প্লান্ট বুঝে নেয়া হয়েছে। Acceptance এর পর ০৮-১২-২০২৪ তারিখ হতে আলোচ্য প্রসেস প্লান্ট এসজিএফএল এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। ইপিপি ঠিকাদার কর্তৃক প্রসেস প্লান্ট বিষয়ক অন-সাইট প্রশিক্ষণ ১৫-০১-২০২৫ তারিখে শেষ হয়েছে। উক্ত প্লান্টের মাধ্যমে সিলেট-৭, সিলেট-৮, সিলেট-৯ ও সিলেট-১০ নং কুপ হতে উৎপাদিত কমবেশি ১৬ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস প্রসেস করে জেজিটিডিএসএল এর সঞ্চালন লাইনে সরবরাহ করা হচ্ছে। ঠিকাদারের বিল পরিশোধ সম্পন্ন করা হয়েছে। বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণ ও বিল পরিশোধ সম্পন্ন করা হয়েছে। EIA স্টাডি ও পরিবেশগত ছাড়পত্র: EIA স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ও নবায়ন করা হয়েছে।						

(ঘ) কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭নং কুপ ওয়ার্কওভার, ১ম সংশোধিত।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭নং বন্ধ কুপসমূহ ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে পুনঃউৎপাদনে আনয়ন; ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭নং কুপসমূহ হতে প্রথম ৫ বছরে ৫৪ বিসিএফ এবং পরবর্তী ৫ বছরে ৪১ বিসিএফ অর্থাৎ ১০ বছরে আনুমানিক ৯৫ বিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করে দেশের জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)		স্থানীয় মুদ্রা	:	২১৯৭৭.০০				
			বৈদেশিক মুদ্রা	:	৫৮৩১.০০				
			মোট	:	২৭৮০৮.০০				
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: জানুয়ারি ২০২৩ সমাপ্তি: জুন ২০২৫						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৯-০১-২০২৩ এবং আরডিপিপি: ১৯-১২-২০২৪						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৪ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জুন ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
				৫৫০০.০০	৭৭.০৭%	২০১৫৬.০০	২০১৫৬.০০	২২.৯৩%	২৫৬৫৬.০০

[Signature]

[Signature]

৭	জুন ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	মালামাল সংগ্রহ: বৈদেশিক মালামাল ৬ লট (লট-১: ডাউনহোল কমপ্লিশন ইকুইপমেন্ট, লট-২: মাড কেমিক্যালস, লট-৩: প্যাকার মিলিং টুলস, লট-৪: ওয়েলহেড এন্ড এক্সমাস-ট্রি, লট-৫: টিউবিং এন্ড এক্সেসরিজ, লট-৬: ব্রিজ প্লাগ) ক্রয় করত: এসজিএফএল ভান্ডারে গ্রহণ করা হয়েছে এবং যথা নিয়মে প্রকল্পে ব্যবহার করা হয়েছে। থার্ড পার্টি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস: সিমেন্টিং, ডিএসটি, ওয়ারলাইন লগিং এবং স্লিকলাইন সংক্রান্ত কূপ সাইটে বাস্তব কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। বৈদেশিক পরামর্শ সেবা: বৈদেশিক পরামর্শক সংক্রান্ত কূপ সাইটে বাস্তব কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। ওয়ার্কওভার অপারেশন: কৈলাশটিলা-২: কৈলাশটিলা-২নং কূপে ২৭-০৬-২০২৩ তারিখে ওয়ার্কওভার শুরু করে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতঃ ডিপার হরাইজেন হতে (৩১২৬-৩১৩০ মিটার গভীরতা) ২৩-১১-২০২৩ তারিখ থেকে দৈনিক ৬.২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা হয় এবং বর্তমানে উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। রশিদপুর-২: রশিদপুর-২নং কূপে ০৩-১২-২০২৩ তারিখে ওয়ার্কওভার শুরু করে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতঃ আপার গ্যাস স্যান্ড টপ জোন (পারফোরেশন ১৩৯১.৩-১৩৯৪.৩ ও ১৪০৩.৫-১৪০৭ মিটার গভীরতায়) হতে ০৯-০২-২০২৪ তারিখ থেকে দৈনিক ৮.৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা হয় এবং বর্তমানে উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। রশিদপুর-৫: রশিদপুর-৫নং কূপের ৩টি গ্যাস স্যান্ডে (ডুবন, আপার গ্যাস স্যান্ড ও আপার গ্যাস স্যান্ড-১) ডিএসটি সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত টেস্টে বাণিজ্যিকভাবে গ্যাস উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত গ্যাসের ফ্লো পাওয়া যায়নি। ০৪-০৫-২০২৪ এবং ০৬-০৫-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কূপটিকে ওয়াটার ডিসপোজাল ওয়েল হিসেবে ১৭-০৫-২০২৪ তারিখে কমপ্লিট করা হয়েছে। সিলেট-৭: সিলেট-৭নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ ১৬-০৭-২০২৪ তারিখে শুরু (স্পাড-ইন) করা হয়েছে। ১৬-০৭-২০২৪ তারিখে ওয়ার্কওভার শুরু করে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতঃ আপার বোকাবিল জোন (পারফোরেশন ১১৯২.৪-১২০২ মিটার) হতে ০৪-১১-২০২৪ তারিখ থেকে দৈনিক ৮.৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা হয় এবং বর্তমানে উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। কূপ সমূহের ওয়ার্কওভার সম্পন্ন করে মোট ৩টি কূপকে পুনঃউৎপাদনে আনা সম্ভব হয়েছে এবং জাতীয় গ্রিডে দৈনিক প্রায় ২৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস নিরবচ্ছিন্নভাবে সঞ্চালন করা হচ্ছে।
---	------------------------------------	--

(৬) সিলেট-১১নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট ও রশিদপুর স্ট্রীকচারে যথাক্রমে ২০০০ (±১০০) মিটার ও ৪২০০ (±১০০) মিটার (TVD) গভীরতায় একটি উন্নয়ন কূপ (সিলেট-১১) ও একটি অনুসন্ধান কূপ (রশিদপুর-১৩) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে সিলেট-১১ ও রশিদপুর-১৩নং কূপ দুটি হতে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১৬ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।
---	------------------------	--





২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	স্থানীয় মুদ্রা : ১৮২৬৭.০০												
		বৈদেশিক মুদ্রা : ৪১৬৮৩.০০												
		মোট : ৫৯৯৫০.০০												
৩	বাস্তবায়নকাল	: আরম্ভ: মার্চ ২০২৪ সমাপ্তি: জুন ২০২৬												
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	: ডিপিপি: ১৮-০৪-২০২৪												
৫	অর্থায়নের উৎস	: কোম্পানির নিজস্ব অর্থ												
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	<table><tr><td>জুন'২৪ পর্যন্ত অর্জন</td><td>আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)</td><td>২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জুন ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি</td><td>প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি</td></tr><tr><td>আর্থিক</td><td>বাস্তব</td><td>আর্থিক</td><td>বাস্তব</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>৪৫৮.০০</td><td>৪৫৮.০০ ১৮.১৯% ৪৫৮.০০ ১৮.১৯%</td></tr></table>	জুন'২৪ পর্যন্ত অর্জন	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জুন ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	-	-	৪৫৮.০০	৪৫৮.০০ ১৮.১৯% ৪৫৮.০০ ১৮.১৯%
জুন'২৪ পর্যন্ত অর্জন	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জুন ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি											
আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব											
-	-	৪৫৮.০০	৪৫৮.০০ ১৮.১৯% ৪৫৮.০০ ১৮.১৯%											
৭	জুন ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	ভূমি অধিগ্রহণ: সিলেট-১১নং কুপ (উন্নয়ন) খননের জন্য ৩.৯৩১ একর ভূমি অধিগ্রহণ করার লক্ষ্যে ২২-০৪-২০২৫ তারিখে ৭ ধারা নোটিশ জারি করা হয়েছে। জমিতে অবস্থিত গাছপালা, স্থাপনা, ফসলাদি ও ফলমূলের মূল্য নির্ধারণের জন্য ভূমি কর্মকর্তা, সিলেট হতে ১২-০৫-২০২৫ তারিখে বন কর্মকর্তা, গণপূর্ত ও সাব-রেজিস্টার দপ্তরসমূহে পত্র প্রেরণ করেছে। জমিতে অবস্থিত গাছপালা ও স্থাপনার মূল্য নির্ধারণের জন্য বন কর্মকর্তা, সিলেট এবং গণপূর্ত অফিসে প্রতিনিধিসহ সাইট ভিজিট করে ব্যয় প্রাক্কলন জেলা প্রশাসক, সিলেট অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া জৈন্তাপুর সিলেট সাব-রেজিস্টার অফিস হতে ভূমির মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি জেলা প্রশাসক অফিস কর্তৃক সংগ্রহ করা হয়েছে। শীঘ্রই জেলা প্রশাসক, সিলেট জমি অধিগ্রহণ বাবদ মূল্য পরিশোধের জন্য এসজিএফএল বরাবর পত্র প্রেরণ করবে। এসজিএফএল কর্তৃক মূল্য পরিশোধের পর জেলা প্রশাসক, সিলেট জমি হস্তান্তর করবে। রশিদপুর-১৩নং কুপের জন্য ৯.৭৭৮ একর (কম/বেশি) ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ভূমি মন্ত্রণালয় ১৭-০৩-২০২৫ তারিখে ২ (দুই) বছরের জন্য অনুমোদন প্রদান করে জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ভূমি কর্মকর্তা, হবিগঞ্জ জমিতে অবস্থিত গাছপালা, স্থাপনা, ফসলাদি ও ফলমূলের মূল্য নির্ধারণের জন্য ০৮-০৪-২০২৫ তারিখে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জমিতে অবস্থিত গাছপালা ও স্থাপনার মূল্য নির্ধারণের জন্য বন কর্মকর্তা, সিলেট এবং গণপূর্ত অফিসে প্রতিনিধিসহ সাইট ভিজিট করেছেন। খনন ঠিকাদার নিয়োগ: Sinopec International Petroleum Service Corporation, China-এর মাধ্যমে টার্ন-কি ভিত্তিতে সিলেট-১১ নং (উন্নয়ন কুপ) ও রশিদপুর-১৩ নং (অনুসন্ধান কুপ) কুপ খননের লক্ষ্যে ১৫-১০-২০২৪ তারিখে এসজিএফএল-এর সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ঠিকাদারের অনুকূলে ০৬-০৪-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। খনন অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় মালামালসমূহের মধ্যে প্রায় ৯০% মালামাল ইতোমধ্যে আমদানি সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট মালামাল ১/২ মাসের মধ্যে আমদানি সম্পন্ন হবে। বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত ০৯-০১-২০২৫ তারিখে EOI (Expression of Interest) আহ্বানের বিপরীতে ৩০-০১-২০২৫ তারিখে প্রাপ্ত ৯টি আবেদনসমূহ হতে মূল্যায়নে উত্তীর্ণ ৬টি প্রতিষ্ঠানের নিকট ১৮-০৩-২০২৫ তারিখে Request for Proposal (RFP) প্রেরণ করা হয়। আহ্বানকৃত RFP অনুযায়ী ২৯-০৪-২০২৫ তারিখে দরপ্রস্তাবসমূহ গ্রহণ ও খোলা হলে ৩টি দরপ্রস্তাব পাওয়া যায়, যার কারিগরি মূল্যায়ন শেষে অনুমোদন গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজ: প্রকল্প এলাকায় মাস্টার প্লান, সয়েল টেস্ট, বাল্লি-পাইলিং, ড্রেন নির্মাণসহ মাটি ভরাটের												

		কাজ গত ২৭-০২-২০২৫ তারিখ হতে চলমান রয়েছে। পাশাপাশি মাটি কম্পেকশন/রোলিং ও লেভেলিং কাজ চলমান রয়েছে। অদ্যাবধি মাটি ভরাট/ভূমি উন্নয়নের প্রায় ৯০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৭-০৫-২০২৫ তারিখ হতে রিগ ফাউন্ডেশন নির্মাণ কাজ এবং ২টি গভীর নলকূপ স্থাপন কাজ শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সেলার নির্মাণ, বল্লি-পাইলিং এবং মাড পাম্প বেজ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে জেনারেটর বেজ, ব্রিকস হেরিং বন্ড নির্মাণ, মাড ট্যাংক বেজ নির্মাণ এবং আরসিসি পাইলিং এর কাজ চলমান আছে। প্রকল্প এলাকায় 3-Phase Electric Line স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। ইআইএ/আইইই, ডিওআই ক্লিয়ারেন্স/পরিবেশ ছাড়পত্র: প্রকল্পের অনুকূলে ১৪-০১-২০২৫ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া গেছে।
--	--	---

(চ) কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২নং কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্প।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২নং কূপসমূহকে পূরণায় গ্যাস উৎপাদন আনয়ন: সংশ্লিষ্ট কূপের টার্গেটেড স্যান্ডসমূহে মজুদকৃত ৭১২ বিসিএফ গ্যাসের মধ্যে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে (কৈলাশটিলা-১: ৫, রশিদপুর-৩: ১০ ও বিয়ানীবাজার-২: ৮) এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে (কৈলাশটিলা-১: ৫, রশিদপুর-৩: ৭ ও বিয়ানীবাজার-২: ৬) অর্থাৎ মোট ৭১.৭৫ বিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করে দেশের জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)		স্থানীয় মুদ্রা		:	১৬১২৯.০০			
			বৈদেশিক মুদ্রা		:	৬২৬৬.০০			
			মোট		:	২২৩৯৫.০০			
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: জানুয়ারি ২০২৫ সমাপ্তি: জুন ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১১-১২-২০২৪						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)		জুন'২৪ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জুন ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
			-	-	৭৫.০০	৭৫.০০	৮.২০%	৭৫.০০	৮.২০%
৭	জুন ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	মালামাল ক্রয়/সংগ্রহ: প্রকল্পের ওয়ার্কওভার বাপেক্স-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এসজিএফএল এবং বাপেক্স-এর মধ্যে ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত চুক্তি মোতাবেক ওয়ার্কওভার কাজে প্রয়োজনীয় সকল মালামাল বাপেক্স কর্তৃক প্রদান করা হবে। বৈদেশিক পরামর্শ সেবা: বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে আহ্বানকৃত ইওআই এর বিপরীতে প্রাপ্ত আবেদনসমূহের মূল্যায়ন কাজ ২০-০৪-২০২৫ তারিখে শেষ হয়েছে। নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান বরাবর আরএফপি দলিল প্রেরণ করা হয়েছে। ইআইএ সম্পাদন: নির্বাচিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ইআইএ রিপোর্ট অনুমোদন এবং অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য ২৩-০৩-২০২৫ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর বরাবর আবেদন করা হয়েছে। আবেদনপত্রটি পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির ৫২৭তম সভায় উপস্থাপন করা হলে EIA Report অনুমোদন এবং অবস্থানগত ছাড়পত্র অনুমোদন করা হয়েছে। এসজিএফএল কর্তৃক ছাড়পত্রের ফি পরিবেশ অধিদপ্তর বরাবর						

		দাখিল করা হয়েছে। থার্ড পার্টি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস: থার্ড পার্টি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস সংগ্রহের লক্ষ্যে পরিচালক পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদনপূর্বক যথাক্রমে ডিএসটি, ওয়ারারলাইন লগিং এবং স্লিকলাইন সেবা গ্রহণের নিমিত্ত নির্বাচিত সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান বরাবর NOA জারি করা হয়েছে। শীঘ্রই চুক্তি সম্পাদন করা হবে। ওয়ার্কওভার অপারেশন সেবা: প্রকল্পের ওয়ার্কওভার অপারেশন কাজ বাপেক্স-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এসজিএফএল এবং বাপেক্স-এর মধ্যে ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। রশিদপুর-৩নং কুপে রিগ মবিলাইজেশনের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। রিগ ফাউন্ডেশন মডিফিকেশন: রশিদপুর-৩নং কুপের রিগ ফাউন্ডেশন মডিফিকেশনের জন্য নির্বাচিত ঠিকাদার কর্তৃক রিগ মডিফিকেশনের মূল কাজ শেষ হয়েছে। ১৫-০৪-২০২৫ তারিখে বাপেক্সকে রিগ মোবিলাইজেশন নোটিশ দেয়া হয়েছে। কৈলাশটিলা-১ এবং বিয়ানীবাজার-২নং কুপের রিগ ফাউন্ডেশন মোডিফিকেশনের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
--	--	---

(ছ) ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-১নং কুপ (অনুসন্ধান কুপ) খনন।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডুপিটিলা ও কৈলাশটিলা স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ৩৪৬০ (±১০০) মিটার ও ৩৬০০ (±১০০) মিটার (TVD) গভীরতায় দু'টি অনুসন্ধান কূপ (ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-১) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা;							
			নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-১নং কূপ দুটি হতে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে অর্থাৎ ১০ বছরে মোট ৫৬ বিসিএফ গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।							
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)		স্থানীয় মুদ্রা		:	১৯৯১২.০০				
			বৈদেশিক মুদ্রা		:	৪৪৭৩৬.০০				
			মোট		:	৬৪৬৪৮.০০				
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২৪ সমাপ্তি: সেপ্টেম্বর ২০২৬							
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৭-০১-২০২৫							
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি							
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৪ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জুন ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
			-	-	১০.০০	১০.০০	৫.৩৬%	১০.০০	৫.৩৬%	
৭	জুন ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	পরিবেশের অবস্থানগত ছাড়পত্র: কৈলাশটিলা-১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খননের লক্ষ্যে ০৯-০৪-২০২৪ তারিখে এবং ডুপিটিলা-১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খননের লক্ষ্যে ১১-০৭-২০২৪ তারিখে পরিবেশের অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়। ভূমি অধিগ্রহণ: কৈলাশটিলা-১নং কূপের খননস্থল উন্নয়ন ও সংযোগ রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যে ১৯-০৫-২০২৪							

	তারিখে ৬.০৩৫ একর ভূমি হকুমদখলের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করে। ১২-০৬-২০২৪ তারিখে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, সিলেট বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ডিপিপি অনুমোদনের পর পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত ০২-০২-২০২৫ তারিখে পুনরায় জেলা প্রশাসক, সিলেট বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট ২০-০৩-২০২৫ তারিখে কৈলাশটিলা-৯নং কূপের ভূমি হকুমদখলের সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করেছে এবং ২৯-০৪-২০২৫ তারিখে কৈলাশটিলা-৯নং কূপের ভূমি হকুমদখলের বিষয়ে জেলা ভূমি অধিগ্রহণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু সংশোধন করে ২০-০৫-২০২৫ তারিখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট-এ প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ১৮-০৬-২০২৫ তারিখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট-এ ভূমি অধিগ্রহণ কমিটির সভা পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডুপিটিলা-১নং কূপের খননস্থল উন্নয়ন ও সংযোগ রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যে ০৫-১২-২০২৪ তারিখে ৭.৮২৩ একর ভূমি হকুমদখলের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করে। ডিপিপি অনুমোদনের পর পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত ৩০-০১-২০২৫ তারিখে জেলা প্রশাসক, সিলেট বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ৩০-০৪-২০২৫ তারিখে ডুপিটিলা-১নং কূপের ভূমি হকুমদখলের সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে। ১৮-০৬-২০২৫ তারিখে ডুপিটিলা-১নং কূপের ভূমি হকুমদখলের বিষয়ে জেলা ভূমি অধিগ্রহণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। খনন ঠিকাদার নিয়োগ: “রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন” এবং “ডুপিটিলা-১নং কূপ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন” শীর্ষক প্রকল্পসমূহের আওতায় উল্লেখিত কূপসমূহ খননের লক্ষ্যে CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC)-এর সাথে ২৭-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০-০৫-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ: “সিলেট-১২ নং কূপ (তেল কূপ) খনন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় তেল কূপটি খননের লক্ষ্যে দরপত্র প্রণয়নের কাজে ড্রিলিং সুপারভাইজার ক্যাটাগরীতে এবং “সিলেট-১২ নং কূপ (তেল কূপ) খনন”, “সিলেট-১১ নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন” ও “ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন” শীর্ষক প্রকল্পসমূহের আওতায় ৫টি কূপ খনন কাজে বৈদেশিক পরামর্শক [(খনন সুপারভাইজার, পেট্রোলিয়াম জিওলজিস্ট এবং পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার (কমপ্লিশন)] সেবা গ্রহণের নিমিত্ত আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে আগ্রহী আবেদনকারীদের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়নের নিমিত্ত প্রণীত আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ সম্বলিত Request for Expression of Interest (REOI) ০৯-০১-২০২৫ তারিখে চারটি দৈনিক পত্রিকা এবং এসজিএফএল, পেট্রোবাংলা ও বিপিপিএ-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত REOI এর বিপরীতে ৩০-০১-২০২৫ তারিখে মোট ০৯(নয়)টি EOI পাওয়া যায়। EOI মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও প্রণীত RFP Document ১৫-০৩-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির বোর্ড সভায় অনুমোদিত হলে কমিটির মূল্যায়নে Shortlisted ০৬(ছয়)টি প্রতিষ্ঠানের নিকট ১৮-০৩-২০২৫ তারিখে RFP Document প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরিত RFP Document অনুযায়ী ২৯-০৪-২০২৫ তারিখে দাখিল ও উন্মুক্ত করা হলে ৩টি দরপ্রস্তাব পাওয়া যায়, যার মূল্যায়ন কাজ শেষ হয়েছে। কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং আর্থিক প্রস্তাব খোলার প্রস্তাব গত ২৪-০৬-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির ৬৫৮তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়েছে। কারিগরি মূল্যায়নে উত্তীর্ণ ০৩ (তিন)টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রস্তাব ২৯-০৬-২০২৫ তারিখে খোলা হয়েছে।
--	--





(জ) রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রশিদপুর স্ট্রাকচারে ২৯০০ (±১০০) মিটার গভীরতায় একটি অনুসন্ধান কূপ (রশিদপুর-১১) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে ২৯.৪৯ বিসিএফ গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি করা এবং প্রথম ৩ বছরে দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা		:	৭৫১৮.০০			
		:	বৈদেশিক মুদ্রা		:	১৯৬৬৯.০০			
		:	মোট		:	২৭১৮৭.০০			
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২৪ সমাপ্তি: জুন ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১৪-০১-২০২৫						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৪ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জুন ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরুর হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
			-	-	৩১.০০	৩১.০০	০.১৩%	৩১.০০	০.১৩%
৭	জুন ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ভূমি অধিগ্রহণ: প্রকল্পের কাজে ৮.৩৮৭ একর ভূমি অধিযাচনের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ২৩-০৩-২০২৫ তারিখে ভূমি মালিকদের পাওনা অর্থ পরিশোধের শর্তে ২ বছরের জন্য হকুম দখলের নিমিত্তে অনুমোদন পাওয়া যায়। দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে, জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ প্রকল্প এলাকায় ভূমি উন্নয়নের কাজ শুরু করার জন্য মৌখিক অনুমোদন প্রদান করে। গত ২৯-০৫-২০২৫ তারিখ থেকে ভূমি উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে ভূমি উন্নয়নের কাজ ৩০% সম্পন্ন হয়েছে। ভূমি কর্মকর্তা, হবিগঞ্জ প্রকল্প এলাকার জমিতে অবস্থিত গাছপালা, স্থাপনা, ফসলাদি ও ফলমূলের মূল্য নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে ০৮-০৫-২০২৫ তারিখে পত্র প্রেরণ করেছে। দপ্তরসমূহ হতে ব্যয় প্রাক্কলন জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। শীঘ্রই জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ হতে ৮.৩৮৭ একর ভূমি ২(দুই) বছরের জন্য অধিযাচন বাবদ মূল্য পরিশোধের জন্য এসজিএফএল বরাবর পত্র প্রেরণ করবে। এসজিএফএল কর্তৃক মূল্য পরিশোধের পর জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ভূমি হস্তান্তর করবে। খনন ঠিকাদার নিয়োগ: “রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন” এবং “ডুপিটিলা-১নং কূপ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন” শীর্ষক প্রকল্পসমূহের আওতায় উল্লেখিত কূপসমূহ খননের লক্ষ্যে Turn-key ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে ১৫-০২-২০২৫ তারিখে খসড়া চুক্তিপত্রের ওপর আইনি মতামতের জন্য আইন বিশেষজ্ঞ-এর নিকট প্রেরণ করা হয়। প্রাথমিক ও কারিগরি মূল্যায়নে উত্তীর্ণ দু’টি দরদাতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আর্থিক মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য ও সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC)-এর সাথে ২৭-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০-০৫-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত Rich Spread Group Limited, China এর সাথে ৭-১১-২০২১ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তির মেয়াদ ৩১-১২-২০২৫ তারিখে						






		উত্তীর্ণ হবে। চুক্তির মেয়াদ ৩০-০৬-২০২৬ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য ঠিকাদারের সম্মতি পাওয়া গেছে। ইআইএ/আইইই, ডিওআই ক্লিয়ারেন্স/পরিবেশ ছাড়পত্র: পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের অনুকূলে ১১/০৬/২০২৫ তারিখে উত্তীর্ণ হওয়ায় মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য গত ২৯-০৪-২০২৫ তারিখে পুনরায় আবেদন করা হয়। পরিবেশ ছাড়পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
--	--	---

(বা) সিলেট-১২ নং কূপ খনন (তেল কূপ)।









১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	তেল উৎপাদনের লক্ষ্যে সিলেট স্ট্রাকচারের নর্দান ক্রোজারে ২৪৯১ (± ৫০) মিটার গভীরতায় ২৪ মাসে একটি তেল কূপ (সিলেট-১২) খনন করা; সিলেট-১২নং তেল কূপ খনন করত: ১০ বছর দৈনিক প্রায় ৮০০ ব্যারেল হারে তেল উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)		স্থানীয় মূদ্রা		:	৫৭৪৩.০০			
			বৈদেশিক মূদ্রা		:	১৯৭৮২.০০			
			মোট		:	২৫৫২৫.০০			
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: জানুয়ারি ২০২৫ সমাপ্তি: ডিসেম্বর ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২২-০২-২০২৫						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)		জুন'২৪ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জুন ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
			-	-	-	-	৬.০৭%	-	৬.০৭%
৭	জুন ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	বৈদেশিক পরামর্শক সেবা : তিন ক্যাটাগরির বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে কিউসিবিএস পদ্ধতিতে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ২৪-০৬-২০২৫ তারিখে এসজিএফএল বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ২৯-০৬-২০২৫ তারিখে আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্ত করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ: প্রকল্পের আওতায় ২.০০ (দুই) একর ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসমূহ প্রস্তুত করা হয় এবং প্রকল্প অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ প্রাপ্তির সাথে সাথেই ২৩-০২-২০২৫ তারিখে পূর্ণাঙ্গ অধিগ্রহণ প্রস্তাব সিলেট ডিসি অফিসে প্রেরণ করা হয়। পেট্রোবাংলার ১০০টি কূপ খনন সংক্রান্ত কমিটির সিদ্ধান্ত/ সুপারিশ এর প্রেক্ষিতে বাপেক্স এর সহায়তায় রিভিউতে হালনাগাদকৃত প্রস্তাবিত লোকেশন SLB Proposed-1 খননস্থান সরেজমিনে চিহ্নিত করায় নতুনভাবে প্রায় ৯.০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করতে হবে। পরিবেশগত ছাড়পত্র: প্রকল্পের অনুকূলে ২০-০৮-২০২৪ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া গিয়াছে। কূপ খননের লোকেশন চিহ্নিতকরণ: পেট্রোবাংলার ১০০টি কূপ খনন সংক্রান্ত কমিটির সিদ্ধান্ত/ সুপারিশ এর প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত SLB Proposed-1 লোকেশনে যাচাইপূর্বক খননস্থান সরেজমিনে চিহ্নিতকরণের অনুরোধ জানিয়ে ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে বাপেক্স বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বাপেক্স কর্তৃক ১৫-০৫-২০২৫ তারিখে সরেজমিনে খনন লোকেশন চিহ্নিত করা হয়েছে।						

		জিটিও প্রণয়ন: কুপ-এর হালনাগাদকৃত খনন লোকেশন সরেজমিনে চিহ্নিত করার পর বাপেক্স হতে কুপ খননের চূড়ান্ত জিটিও প্রণয়ন কাজ চলমান রয়েছে। খনন ঠিকাদার নিয়োগ : সিলেট-১২নং কুপ খনন (তেল কুপ) প্রকল্পের আওতায় টার্ন-কি ভিত্তিতে কুপ খনন অপারেশন, মালামাল সরবরাহ, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র দলিল প্রণয়নের কাজ শুরু করা হয়েছে। বাপেক্স কর্তৃক জিটিও প্রাপ্তির পর উক্ত দরপত্র দলিল চূড়ান্ত করা হবে।
--	--	--





কোম্পানির চলমান প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন, ২০২৫ পর্যন্ত

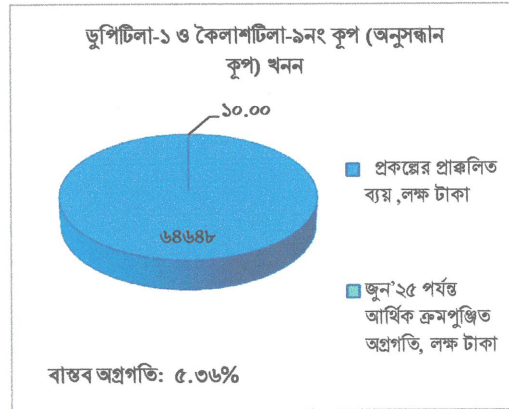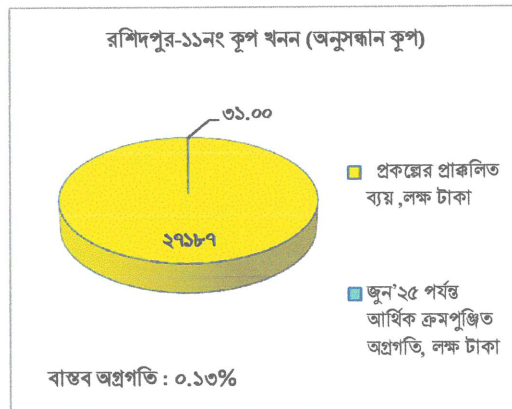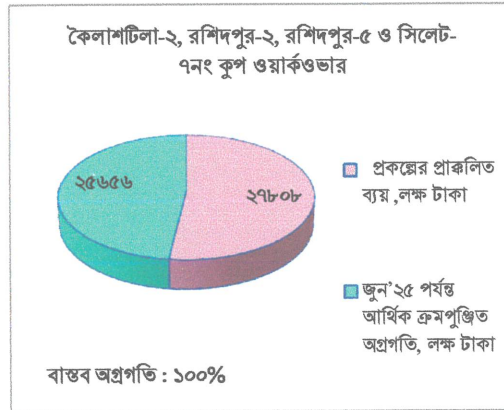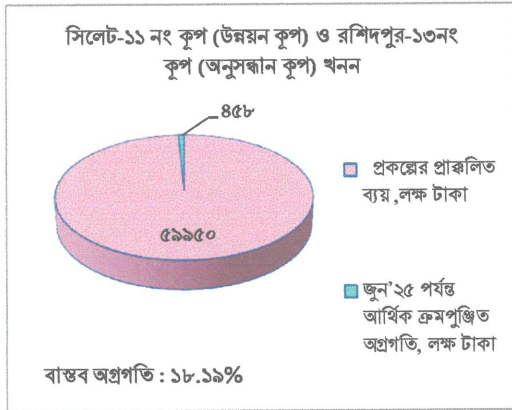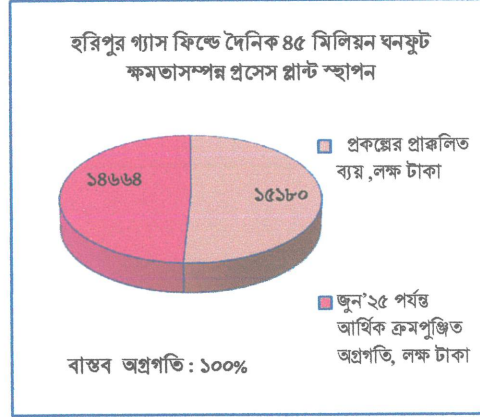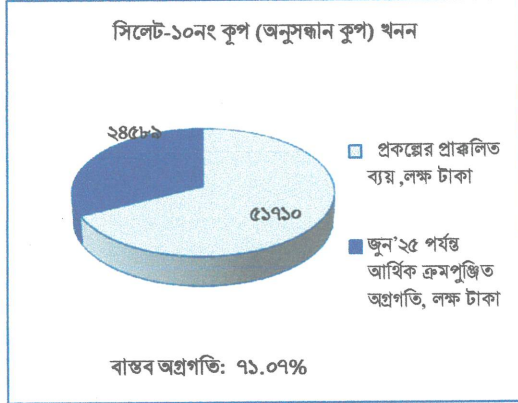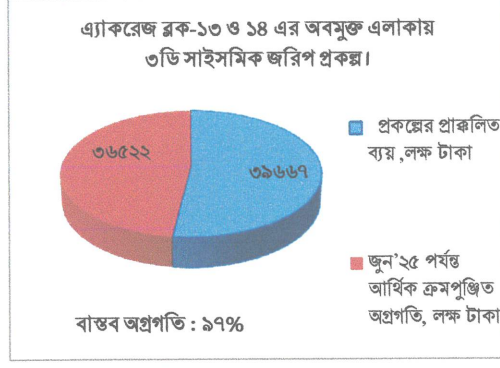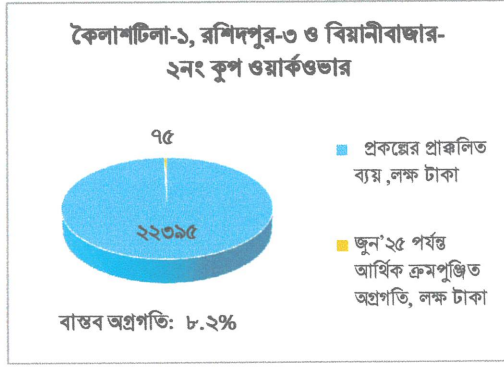

নোট: “সিলেট-১২নং কুপ (তেল কুপ) খনন” শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৬.০৭% এবং কোন আর্থিক অগ্রগতি না থাকায় চিত্রে দেখানো হয় নাই।

[Signature]

[Signature]

উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট

জুন ২০২৫

উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট :

- ক) উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড : ১) হরিপুর গ্যাস ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন ১ম সংশোধিত- শীর্ষক প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
- ২) কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭নং কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্প ১ম সংশোধিত- শীর্ষক প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
- খ) আগামী দুই মাসে সম্পাদিতব্য গুরুত্বপূর্ণ : নাই।
কাজের তালিকা।
- গ) আগামী দুই মাসে বড় রকমের কোন : নাই।
সমস্যা/সংকটের আশঙ্কা করা হলে তার
বিবরণ



জনবলের পরিসংখ্যান

মাসের নাম : মে ২০২৫

জনবলের পরিসংখ্যান :

১। কর্মকর্তা

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫	কর্মরত পদের সংখ্যা
১।	৭৮০০০ (নির্ধারিত)	-
২।	৬৬০০০-৬৮৪৮০-৭১০৫০-৭৩৭২০-৭৬৪৯০	-
৩।	৫৬৫০০-৫৮৭৬০-৬১১২০-৬৩৫৭০-৬৬১২০-৬৮৭৭০-৭১৫৩০-৭৪৪০০	৯
৪।	৫০০০০-৫২০০০-৫৪০৮০-৫৬২৫০-৫৮৫০০-৬০৮৪০-৬৩২৮০-৬৫৮২০-৬৮৪৬০-৭১২০০	৭০
৫।	৪৩০০০-৪৪৯৪০-৪৬৯৭০-৪৯০৯০-৫১৩০০-৫৩৬১০-৫৬০৩০-৫৮৫৬০-৬১২০০-৬৩৯৬০-৬৬৮৪০-৬৯৮৫০	৬৫
৬।	৩৫৫০০-৩৭২৮০-৩৯১৫০-৪১১১০-৪৩১৭০-৪৫৩৩০-৪৭৬০০-৪৯৯৮০-৫২৪৮০-৫৫১১০-৫৭৮৭০-৬০৭৭০-৬৩৮১০-৬৬৭০১০	৪৮
৭।	২৯০০০-৩০৪৫০-৩১৯৮০-৩৩৫৮০-৩৫২৬০-৩৭০৩০-৩৮৮৯০-৪০৮৪০-৪২৮৯০-৪৫০৪০-৪৭৩০০-৪৯৬৭০-৫২১৬০-৫৪৭৭০-৫৭৫১০-৬০৩৯০-৬৩৪১০	-
৮।	২৩০০০-২৪১৫০-২৫৩৬০-২৬৬৩০-২৭৯৭০-২৯৩৭০-৩০৮৪০-৩২৩৯০-৩৪০১০-৩৫৭২০-৩৭৫১০-৩৯৩৯০-৪১৩৬০-৪৩৪৩০-৪৫৬১০-৪৭৯০০-৫০৩০০-৫২৮২০-৫৫৪৭০	২
৯।	২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০	৯৯
১০।	১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০	৩৮
মোট কর্মকর্তা :		৩৩১

২। কর্মচারী

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫	কর্মরত পদের সংখ্যা
১।	২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০	০০
২।	১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০	০০
৩।	১২৫০০-১৩১৩০-১৩৭৯০-১৪৪৮০-১৫২১০-১৫৯৮০-১৬৭৮০-১৭৬২০-১৮৫১০-১৯৪৪০-২০৪২০-২১৪৫০-২২৫৩০-২৩৬৬০-২৪৮৫০-২৬১০০-২৭৪১০-২৮৭৯০-৩০২৩০	০৭
৪।	১১৩০০-১১৮৭০-১২৪৭০-১৩১০০-১৩৭৬০-১৪৪৫০-১৫১৮০-১৫৯৪০-১৬৭৪০-১৭৫৮০-১৮৪৬০-১৯৩৯০-২০৩৬০-২১৩৮০-২২৪৫০-২৩৫৮০-২৪৭৬০-২৬০০০-২৭৩০০	২৪
৫।	১১০০০-১১৫৫০-১২১৩০-১২৭৪০-১৩৩৮০-১৪০৫০-১৪৭৬০-১৫৫০০-১৬২৮০-১৭১০০-১৭৯৬০-১৮৮৬০-১৯৮১০-২০৮১০-২১৮৬০-২২৯৬০-২৪১১০-২৫৩২০-২৬৫৯০	৬৬
৬।	১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০-২১৩১০-২২৩৮০-২৩৫০০-২৪৬৮০	২৯
৭।	৯৭০০-১০১৯০-১০৭০০-১১২৪০-১১৮১০-১২৪১০-১৩০৪০-১৩৭০০-১৪৩৯০-১৫১১০-১৫৮৭০-১৬৬৭০-১৭৫১০-১৮৩৯০-১৯৩১০-২০২৮০-২১৩০০-২২৩৭০-২৩৪৯০	০৩
৮।	৯৩০০-৯৭৭০-১০২৬০-১০৭৮০-১১৩২০-১১৮৯০-১২৪৯০-১৩১২০-১৩৭৮০-১৪৪৭০-১৫২০০-১৫৯৬০-১৬৭৬০-১৭৬০০-১৮৪৮০-১৯৪১০-২০৩৯০-২১৪১০-২২৪৯০	৪৭
৯।	৯০০০-৯৪৫০-৯৯৩০-১০৪৩০-১০৯৬০-১১৫১০-১২০৯০-১২৭০০-১৩৩৪০-১৪০১০-১৪৭২০-১৫৪৬০-১৬২৪০-১৭০৬০-১৭৯২০-১৮৮২০-১৯৭৭০-২০৭৬০-২১৮০০	০২
১০।	৮৮০০-৯২৪০-৯৭১০-১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০	০
১১।	৮৫০০-৮৯৩০-৯৩৮০-৯৮৫০-১০৩৫০-১০৮৭০-১১৪২০-১২০০০-১২৬০০-১৩২৩০-১৩৯০০-১৪৬০০-১৫৩৩০-১৬১০০-১৬৯১০-১৭৭৬০-১৮৬৫০-১৯৫৯০-২০৫৭০	০
১২।	৮২৫০-৮৬৭০-৯১১০-৯৫৭০-১০০৫০-১০৫৬০-১১০৯০-১১৬৫০-১২২৪০-১২৮৬০-১৩৫১০-১৪১৯০-১৪৯০০-১৫৬৫০-১৬৪৪০-১৭২৭০-১৮১৪০-১৯০৫০-২০০১০	০২
মোট কর্মচারী :		১৮০
মোট কর্মকর্তা এবং কর্মচারী (৩৩১+১৮০) :		৫১১ জন

১ জন কর্মকর্তার অবসর জনিত কারণে গত মাসের প্রতিবেদনের সাথে প্রতিবেদনাধীন মাসে জনবলের সংখ্যার তারতম্য হয়েছে।

- ৩৪ -
