



সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড SYLHET GAS FIELDS LIMITED

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

প্রতিবেদনকাল

মে ২০২৬



মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন
MONTHLY MIS REPORT



সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

মে ২০২৬ মাসের এমআইএস প্রতিবেদন

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১)	ফিল্ড/স্থাপনা ভিত্তিক উৎপাদন পরিসংখ্যান	১
২)	কোম্পানির সামগ্রিক উৎপাদন পরিসংখ্যান	২
৩)	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণী	৩
৪)	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণী	৪
৫)	বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের আয়/ব্যয়ের তারতম্য বিশ্লেষণ	৫
৬)	আয়-ব্যয় বিবরণী	৬-৭
৭)	গ্যাস বিক্রয় বিবরণী	৮
৮)	উপজাত তেল বিক্রয় বিবরণী	৯
৯)	গ্রাহকওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণী	১০
১০)	প্রদেয় ভ্যাট এর বিবরণী	১১
১১)	সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা বিবরণী	১২
১২)	চলতি মাসের পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের মজুদ বিবরণী	১৩
১৩)	কোম্পানির নগদ তহবিল বিবরণী	১৪
১৪)	চলতি মাসের আয়-ব্যয় এবং বকেয়া পাওনার বিশ্লেষণ বিবরণী	১৫
১৫)	কোম্পানির মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী	১৬
১৬)	কোম্পানির বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী	১৭
১৭)	কোম্পানির উৎপাদন ও বিক্রয়ের তুলনামূলক চিত্র	১৮-১৯
১৮)	কোম্পানির চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ও চিত্র	২০-২৬
১৯)	উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট	২৭
২০)	কোম্পানির ষ্ঠেডভিত্তিক জনবলের পরিসংখ্যান	২৮

প্রকৌশলী. রতন কান্তি শাখা
উপ-মহাপরিচালক (ওয়েল টেকনিং)
সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

[illegible]

কোম্পানির সামগ্রিক উৎপাদন পরিসংখ্যান

গ্যাস : এম এম এস সি এম, পানি ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : লিটার										
গ্যাস ক্ষেত্র/ স্থাপনা	বিদ্যমান কুপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কুপ সংখ্যা	উপাদান	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা (৬-২০২৫-২০২৬) (২০২৬)	বিগত মাস (এপ্রিল ২০২৬)	চলতি মাস (মে ২০২৬)	বিগত বৎসরের মোট (২০২৪-২০২৫)	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত (২০২৫-২০২৬)	শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত
সিলেট, বৈলাশাটীনা, এমএসটিই প্রান্ট অপারেশন, রানিদিপুর, বিয়ানীবাজার, হাতক, রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্রান্ট, ৪০০০ বিপিডি কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্রান্ট, ৩০০০ বিপিডি কাটালহাটিক রিকর্মিং ইউনিট ও বৈলাশাটীনা এলাপিজি প্রান্ট	২৮ টি	১৯ টি	গ্যাস	৪.৪৪৫০	০৬২৩৬৩৬৩৪৪'১	০১৬'০২১	৪৮৬'৪২১	১২৩০০০'১	১,৩৬২	৫৬,৫৩২.৫৮৩
			পানি	--	--	৬৪৬'৮৮৬'৮	৬৮৬'৮৮৬'৮	১৩৩,০৮০'৮৮৬	৯০,৮৮৬'৮৮৬	১,৬৮৬'৮৮৬
			অপ: তৈল	--	--	--	--	--	--	--
			অকটেন	১৩২.৫৪২	৪৪৬'৬৮৬'৮	০২৩.৬৮৬'৮	০২৩.৬৮৬'৮	১৩৩.৬৮৬'৮	৩৮৬'৮৮৬'৮	৩৮৬'৮৮৬'৮
			মটর স্পিরিট RON 81	৬৪৫.৪৫৮	১০২'০১৬'৮২২	০৬৮'৬৮৬'৮	০৬৮'৬৮৬'৮	২২৫.৬৮৬'৮	২২৫.৬৮৬'৮	২,৩৮৬'৮৮৬'৮
			ডিজেল	৩০.২৬৩	০০০'২৬৩'০১	২১৪'৪৪৪'১	২১২'৩৬৪'১	৬৮৬'৮৮৬'৮	৬৮৬'৮৮৬'৮	৬৮৬'৮৮৬'৮
			কেরোসিন	২৩.৩০২	০০০'৬৮৬'৮	৬০৬'১৪৬	২৬৪'২৬২	৮৮৬'৮৮৬'৮	৮৮৬'৮৮৬'৮	৮৮৬'৮৮৬'৮
			কনডেনসেট	৮৬.৬৮৬	৪৪৬'৬৮৬'০৬	১০৪'৬০৪'০	৪৮৬'৮৮৬'০	৮৮৬'৮৮৬'০	৮৮৬'৮৮৬'০	৮৮৬'৮৮৬'০
			এনজিএল	৫৫.৪১৬	৬৮৬'৮৮৬'৮	০০০'৮৮৬'১	০০০'৪১৪'১	৮৮৬'৮৮৬'৮	৮৮৬'৮৮৬'৮	৮৮৬'৮৮৬'৮
			মটর স্পিরিট RON 89	৫০৫.৮৫২	১০২'৪৪০'৬৬১	৪৮৬'৮২৬'৪১	১৬০'০৪০'৮১	৮৮৬'৮৮৬'৮	৮৮৬'৮৮৬'৮	৮৮৬'৮৮৬'৮
			লাইট ন্যাক্সা	১৫৩.২০৬	০০০'২২৬'০৬	৪৪৬'০৬৬'৪	০৪০'০২৪'৪	৮৮৬'৮২৬'০৬	৮৮৬'৮২৬'০৬	৮৮৬'৮২৬'০৬
			রিকর্মেন্ট	৮৬৬'৮৮২	০০০'২৪৬'০০১	১২৪'৪২৪'৪	১২৪'০২৪'৬	৮৮৬'৮৮৬'৮	৮৮৬'৮৮৬'৮	৮৮৬'৮৮৬'৮
			সুপার লাইট কনডেনসেট	-	-	৬৮৬'৮৮২	৮৮৬'৮৮২	৮৮৬'৮৮২	৮৮৬'৮৮২	৮৮৬'৮৮২
			এলাপিজি	৪৮৬'১২	৪৮৬'৮৮৬'৮	৪৪৬'১৮৬	৬৮৬'৮৮৬	৮৮৬'৮৮৬	৮৮৬'৮৮৬	৮৮৬'৮৮৬

স্বাক্ষর

— ০২ —

স্বাক্ষর

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণী

গ্যাস : ওয়েসমএসসিএম, পেট্রোলিয়াম পণ্যাদি : স্টিমার						
ক্রমিক	উপাদান	চলতি মাস (মে ২০২৩)	বিগত মাস (এপ্রিল ২০২৩)	বৈশী/ কম শতকরা হার (৩ - ৪)	বিগত বৎসরের মে ২০২২ মাস	বৈশী / কম শতকরা হার (৩ - ৬)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক)	গ্যাস	১২৪.৭৭৮	১২০.৬০০	৪.১৬% ৩.৪৬%	১৩০.৭১৯	-৫.৯৪% -৪.৫৫%
খ)	কনডেনসেট	৩,৩৯৬,৮৪৮	৩,৪৩৯,৪০১	-৪.২৫% -১.২৪%	৩,৩৯৫,১১১	১.৭৩% ০.০৫%
গ)	এনজিএল	১,৮১৪,০০০	১,৭৪৫,০০০	৬৯,০০০ ৩.৯৫%	১,৭৫১,০০০	৬৩,০০০ ৩.৬০%
ঘ)	মটর স্পিরিট RON 81	১৮,৭৪৬,৮৫৯	১৭,৩৮৯,৪০০	১,৩৫৭,৪০৯ ৭.৮১%	২১,৩৭০,১৪৬	-২,৬২৩,২৮৭ -১২.২৮%
ঙ)	ডিজেল	১,৪৫৩,২৫১	১,৪৮৪,৪০০	-৩১,১৪৯ -২.১৩%	৯৭৭,০০১	৪৭৬,২৫০ ৪৮.৭৫%
চ)	কেরোসিন	২৭২,৪৯২	৩৪১,০৬৬	-৬৯,৫৭৪ -২০.৩০%	৯৩০,৫০৭	-৬৫৮,০১৫ -৭০.৭২%
ছ)	পেট্রোল (রেন ৮৯)	১৫,৩৪৩,০৯১	১৪,৯৭,৭২৪	৪৪৫,১৬৭ ২.৭৭%	১৪,৭৮৮,৭৯১	৫৫৪,৩০০ ৩.৭৫%
জ)	অকটেন	৪,১৬৮,৩২৩	৩,৯৪৯,৩২৩	২১৯,০০০ ৫.৫৫%	৫,০৫২,৬৯৮	(৮৮৪,৩৭৫) -১৭.৫০%
ঝ)	লাইট ন্যাক্সা	৪,৮২০,০৪৩	৪,৬৮০,৬৮৪	১৩৯,৩৫৯ ৩.২০%	৪,৫৯১,৪৬৭	২২৮,৫৭৫ ৪.৯৮%
ঞ)	রিফরমেট	৯,২৮৬,০৪৩	৯,২৮২,৭৮৭	৩,২৯৯,৩২২ ৫.২৩%	৯,২৯৯,৩৮৮	(১৩,৩০৪) -০.১৪%
ট)	এলপিগি	৭৫৬,৫৩৯	৭৫৬,৫৩৯	(১৪,৮০৯.০০) -১.৯২%	৭৫৬,৫৩৯	১৮৩,৩৯৭ ৩২.০০%
ঠ)	সুপার লাইট কনডেনসেট	১,০৫৫,০১৫	১,০২২,৩৮৯	৩২,৬২৬ ৩.১৯%	১১৭৪০৫৯	-১১৯,০৪৪ -১০.১৪%

কনডেনসেট

২/৫/২৩

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণী

গ্যাস : এমএমএসপিএম, পেট্রোলিয়াম পণ্যাদি : ক্রিটার					
ক্রমিক	বিক্রয়	চলতি মাস ২০২৬	বিগত মাস (এপ্রিল ২০২৬)	বেশী/ কম শতকরা হার (৩ - ৪)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
ক)	গ্যাস	১২৩,২৬০	১১৯,১৫০	৪.১১০	চলতি মাসে দিনের সংখ্যা বেশী হওয়ায় কারণে গ্যাস বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
খ)	কনডেনসেট	১৩৫,০০০	১০৮,০০০	২৭.০০০ ২৫.০০%	বেসরকারি রিফাইনারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হরিপুর ফিল্ড হতে কনডেনসেট বেশি উত্তোলন করায় বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
ঘ)	মটর স্পিরিট RON ৪৭	১৪,৪৯৮,১৫০	১৭,২৪৮,১৫০	-২,৭৫০,০০০ -১৫.৯৪%	চলতি মাসে তেল বিপণন কোম্পানি (পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা কোম্পানি লিমিটেড) কর্তৃক পেট্রোল কম উত্তোলন করায় বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।
ঙ)	ডিজেল	১,২৬৪,৩৮০	৮৭৯,৮৩০	৩৮৪,৫৫০ ৪৩.৭১%	তেল বিপণন কোম্পানি (পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা কোম্পানি লিমিটেড) কর্তৃক ডিজেল বেশী উত্তোলন করায় বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
চ)	কেরোসিন	৫৮০,১৬০	৪৯৪,৬৫০	৮৫,৫১০ ১৭.২৯%	তেল বিপণন কোম্পানি (পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা কোম্পানি লিমিটেড) কর্তৃক কেরোসিন বেশী উত্তোলন করায় বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
ছ)	অকটেন	৩,৯১০,০৪০	২,৯৬২,৬৩০	৯৪৭৪১০ ৩১.৯৮%	চলতি মাসে দিনের সংখ্যা বেশী এবং তেল বিপণন কোম্পানি (পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা কোম্পানি লিমিটেড) কর্তৃক অকটেন বেশী উত্তোলন করায় বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
জ)	এলপিজি	৭০২,৩৯০	৮০১,৪২০	-৯৯০৩০.০০ -১২%	চলতি মাসে এলপি গ্যাস লিমিটেড কর্তৃক কৈলাশাটলা এলপিগিজ প্লান্ট হতে কম উত্তোলন করায় এলপিজি বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের আয়/ব্যয়ের তারতম্য বিশ্লেষণ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস এপ্রিল ২০২৬	চলতি মাস মে ২০২৬	হাস/বৃদ্ধি	হাস/বৃদ্ধি
১	গ্যাস বিক্রয়	৪০.৫১	৪১.৯১	১.৪০	গ্যাস বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
২	উপজাত তেল বিক্রয়	১৭২.৭৭	১৭৫.৪৬	২.৬৯	উপজাত তেল বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩	অপরিশোধিত তেল বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	অপরিশোধিত তেল মজুদ নেই।
৪	ভ্যাট				
	গ্যাস	২৮.৬১	২৯.৬০	০.৯৯	ভ্যাট বৃদ্ধি পেয়েছে।
	উপজাত তেল	২২.৬৫	২২.৮৯	০.২৩	ভ্যাট বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫	অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয়	১৩৪.০০	১৪৭.৩৬	১৩.৩৭	ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬	আয়কর পূর্ব নীট মুনাফা	৩৬.২৩	২৬.০৫	-১০.১৮	মুনাফা হ্রাস পেয়েছে।
৭	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা	৫৮.৩০	৫৫.৬৬	-২.৬৪	জমা হ্রাস পেয়েছে।
৮	বকেয়া পাওনা আদায়	৩০৫.২৩	২৫৩.৭৭	-৫১.৪৬	আদায় হ্রাস পেয়েছে।



- ০৫ -



কোম্পানির আয় - ব্যয় বিবরণী

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস প্রকৃত	এপ্রিল ২০২৬ বাজেট	চলতি মাস প্রকৃত	মে ২০২৬ বাজেট	বিগত বছরের মোট প্রকৃত	বিগত বছরের মোট বাজেট	চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জিত প্রকৃত	বাজেট
ক) বিক্রয়									
১	গ্যাস	৪০.০৪	৩৬.৬৬	১৬.১৪	৪০.০৪	১৬.১৪	৪০.০৪	১৬.১৪	৪০.০৪
২	অকটেন	৩৬.৬৬	৩৬.৬৬	৩৬.৬৬	৩৬.৬৬	৩৬.৬৬	৩৬.৬৬	৩৬.৬৬	৩৬.৬৬
২	মটর স্পিরিট	১২৬.৬৬	১২৬.৬৬	১২৬.৬৬	১২৬.৬৬	১২৬.৬৬	১২৬.৬৬	১২৬.৬৬	১২৬.৬৬
৩	ডিজেল	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
৪	কেরোসিন	২৬.৬৬	২৬.৬৬	২৬.৬৬	২৬.৬৬	২৬.৬৬	২৬.৬৬	২৬.৬৬	২৬.৬৬
৫	কনডেনসেট	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
৬	এন জি এল	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
৭	এন জি পি জি	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
৮	মজুদ সময়	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
খ) ব্যয়									
১। সম্পূরক কর ও ভ্যাট									
i	গ্যাস	৬৬.৬৬	৬৬.৬৬	৬৬.৬৬	৬৬.৬৬	৬৬.৬৬	৬৬.৬৬	৬৬.৬৬	৬৬.৬৬
i	অকটেন	২৬.৬৬	২৬.৬৬	২৬.৬৬	২৬.৬৬	২৬.৬৬	২৬.৬৬	২৬.৬৬	২৬.৬৬
ii	মটর স্পিরিট	৮৬.৬৬	৮৬.৬৬	৮৬.৬৬	৮৬.৬৬	৮৬.৬৬	৮৬.৬৬	৮৬.৬৬	৮৬.৬৬
iii	ডিজেল	২৬.৬৬	২৬.৬৬	২৬.৬৬	২৬.৬৬	২৬.৬৬	২৬.৬৬	২৬.৬৬	২৬.৬৬
iv	কেরোসিন	৪৬.৬৬	৪৬.৬৬	৪৬.৬৬	৪৬.৬৬	৪৬.৬৬	৪৬.৬৬	৪৬.৬৬	৪৬.৬৬
v	কনডেনসেট	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
vi	এন জি এল	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
vii	এন জি পি জি	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
মোট সম্পূরক কর ও ভ্যাট									
৬৬.৬৬		৬৬.৬৬	৬৬.৬৬	৬৬.৬৬	৬৬.৬৬	৬৬.৬৬	৬৬.৬৬	৬৬.৬৬	৬৬.৬৬

১০০

১০০

কোম্পানির আয় - ব্যয় বিবরণী

(কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস প্রকৃত	এপ্রিল ২০২৬	চলতি মাস প্রকৃত	মে ২০২৬	বিত্ত বৎসরের মোট (২০২৪-২০২৫)		চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জীভূত	
						প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট
২।	কনভেনসেন্ট ক্রয় ব্যয়	১০৪০১	৯৩৩৬	৮৭৫১	১১১১	৮৪৩৫	১২০৭.৩৭	১০৯৩.৯৯	১২২১.৯৯
৩।	উৎপাদন ব্যয়								
৪।	বেতন ও ভাতাদি	৬.২৩	৬.৬	৪০.৭	৬.৭	০৪.৭৬	০৪.১৭	৭২.৯৯	৭৩.৭৩
৫।	প্রশাসনিক ব্যয়	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
৬।	সুদ	২২০	৬৫০	২২০	৬৫০	০২৪	২.২	৬৪২	৬৪১
৭।	অবচয়	৬.২৪	৬.৭	৬.৭	৬.৭	০০.২০	০০.৬১	২৭.০৯	৩৭.১১
৮।	ডিজিটাল অব ওয়েল কন্সট	২৪১	৬৬.১	২৪১	২৪১	০০.২১	০০.৭১	৬৬.৭১	০২.৬৪
৯।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৭০৪	৬৭.৬	৬৭.৬	৬৭.৬	৮৩০	২০.৬৭	২৬.২	৬৭.৭৭
১০।	অন্যান্য ব্যয় (পেট্রোলিয়াম পণ্য পরিবহন সহ)	২৭৬	২৩.২১	২৩.২১	২৩.২১	০৫.৭৭	৮৭.২২	৮৭.২২	৩৬.৬০
গ)	মোট ব্যয় (১০)	১০৪০১	৯৩৩৬	৮৭৫১	১১১১	৮৪৩৫	১২০৭.৩৭	১০৯৩.৯৯	১২২১.৯৯
ঘ)	পরিচালনা মূল্য								
১১।	বিবিধ আয়	৬৭.৬২	২৫.৬১	৬৭.৬২	২৫.৬১	৬৭.৬৬	৬৭.৬৬	৬৭.৬৬	৬৭.৬৬
জ)	আয়কর ও প্রাপ্যভোগ্য পূর্ব মূল্য	৮৭.৬২	২৫.৬১	৬৭.৬২	২৫.৬১	৬৭.৬৬	৬৭.৬৬	৬৭.৬৬	৬৭.৬৬
১২।	শেঃ অংক্রান্ত	১৭.১	৭.০১	১৭.১	৭.০১	১৭.১	১৭.১	১৭.১	১৭.১
১৩।	লভ্যাংশ	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬
১৪।	মোট উদ্ধৃতি (১৩ - ১৪)	৮৭.৬২	২৫.৬১	৬৭.৬২	২৫.৬১	৬৭.৬৬	৬৭.৬৬	৬৭.৬৬	৬৭.৬৬

[Signature]

[Signature]

- ০৭ -

গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

পরিমাণ : এর এম সি এস, মূল্য : কোটি টাকায়

বিভাগ	ভিত্তাস		জালালাবাদ		বাখরাবাদ		কর্ণফুলি		পশ্চিমাঞ্চল		সুন্দরবন		জিটিসিএল		মোট গ্যাস বিক্রয়	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১। চলতি মাস : মে ২০২৬																
বাজেট	০.০০	০.০০													১১৯.৭২	৪২.৫৭
প্রকৃত	০.০০	০.০০	৬৯.১৬	২১.৫২	৪৬.৬০	১৩.৬১	০.০০	০.০০	১৩.০৫	৪.৬৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১২৩.২৬	৪৩.৯১
২। বিগত মাস : এপ্রিল ২০২৬																
বাজেট	০.০০	০.০০														
প্রকৃত	০.০০	০.০০	০৩.৫৪	১১.৬১	৩৩.৩৩	৬.১৬	০.০০	০.০০	২৭.৪৬	৯.৬৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০৬.২৯	৩৭.৭৯
৩। ক্রমপুঞ্জিত : চলতি বছর ২০২৫-২০২৬																
বাজেট	০.০০	০.০০														
প্রকৃত	০.০০	০.০০	৩৭.০৬	১১.৬১	৩৩.৩৩	৬.১৬	০.০০	০.০০	২৭.৪৬	৯.৬৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৯.৭২	৪২.৫৭
৪। মোট বিগত বছর (২০২৪-২০২৫)																
বাজেট	০.০০	০.০০	১০.১৬	৩.১৬	৪৪.৬৬	১২.১৬	০.০০	০.০০	২৭.৪৬	৯.৬৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৯.৭২	৪২.৫৭
প্রকৃত	০.০০	০.০০	৩৭.০৬	১১.৬১	৩৩.৩৩	৬.১৬	০.০০	০.০০	২৭.৪৬	৯.৬৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৯.৭২	৪২.৫৭
৫। ক্রমপুঞ্জিত : আন্তর্জাতিক হতে মে ২০২৬ পর্যন্ত																
বাজেট	০.০০	০.০০	৬০.০৬	১১.৬১	৪৭.১৬	১২.১৬	০.০০	০.০০	০৬.৬২	১.৬২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৯.৭২	৪২.৫৭
প্রকৃত	০.০০	০.০০	৬০.০৬	১১.৬১	৪৭.১৬	১২.১৬	০.০০	০.০০	০৬.৬২	১.৬২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৯.৭২	৪২.৫৭
৬। মোট																
বাজেট	০.০০	০.০০	১০.১৬	৩.১৬	৪৪.৬৬	১২.১৬	০.০০	০.০০	২৭.৪৬	৯.৬৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৯.৭২	৪২.৫৭
প্রকৃত	০.০০	০.০০	৩৭.০৬	১১.৬১	৩৩.৩৩	৬.১৬	০.০০	০.০০	২৭.৪৬	৯.৬৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৯.৭২	৪২.৫৭

[Signature]

[Signature]

গ্রাহক ওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণী

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	কোম্পানী ও গ্রাহক খাত	বিলত মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া	চলতি মাস মে ২০২৬		চলতি মাসের শেষ তারিখে বকেয়া পাওনা	চলতি বকসর (২০২৫-২০২৬) ক্রমপঞ্জীভূত মে ২০২৬			বকেয়া কত মাসের গড় বিক্রয়	বকেয়া পাওনা কাল	বকেয়া আদায় কাল
			বিক্রয়	আদায়		বিক্রয়	আদায়	বকেয়া			
১	তিতাস	০০০	০.০০	০.০০	০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০২৫-২০২৬	২০২৫-২০২৬
২	জালালাবাদ	১৩২.৬৮	২১.০৫	২০.০৮	১৩৩.৩৮	২১৮.৭৫	১৬৭.৮৭	৪৯.১১	৬.০০	৩০৩.১৮	১৬৯.৮৮
৩	বাখরাবাদ	১২০.২২	১২.৮৫	১১.৩২	১২১.২৫	১২০.২৬	১২৬.৬০	৭.৩৩	১০.০০	২৮৮.৯৫	১২৬.৬০
৪	কর্ণফুলি	০০০	০.০০	০.০০	০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০০০	০০০
৫	পশ্চিমাঞ্চল	২৩.৬৮	৫.৯৬	৬.৬৮	২৩.৬৮	৬৮.৮৭	৫০.৯৭	১৭.৯০	২.০০	১১২.৩০	৯০.৯৭
৬	সুন্দরবন	২৩.৬৮	০.০০	০.০০	২৩.৬৮	২৭.৬৮	২৭.৬৮	০.০০	০.০০	০০০	০০০
৭	জিটিসিএল	৭৬.৯৬	২.৮৫	০.০০	৭৬.৯৬	৭৬.৯৬	৭৬.৯৬	০.০০	১৫.০০	৬২.৬৮	০০.৭৮
৮	আরপিজিএল	৭০.০০	০.০০	০.০০	৭০.০০	৭০.০০	৭০.০০	০.০০	২.০০	৭০.০০	৭০.০০
৯	বিপিসি	৬০.০০	০.০০	০.০০	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০	০.০০	০.০০	৬০.০০	৬০.০০
১০	মেঘনা	৩৬০.২৯	৬০.২৬	০.০০	৩৬০.২৯	৩৬০.২৬	৩৬০.২৬	০.০০	৭.০০	৩৬০.২৯	৩৬০.২৯
১১	পদ্মা	৩১৬.১৫	১০.৯৬	০.০০	৩১৬.১৫	৩১৬.১৫	৩১৬.১৫	০.০০	৩.০০	৩১৬.১৫	৩১৬.১৫
১২	যমুনা	২৩৯.১৩	১৬.৮৫	০.০০	২৩৯.১৩	২৩৯.১৩	২৩৯.১৩	০.০০	৬.০০	২৩৯.১৩	২৩৯.১৩
	উপমোটি (ভেল কোং)	৯১৬.৫৬	১৬.৮৫	০.০০	৯১৬.৫৬	৯১৬.৫৬	৯১৬.৫৬	০.০০	১৬.০০	৯১৬.৫৬	৯১৬.৫৬
১৩	অন্যান্য (সুপার)	০.০০	৬.৮০	০.০০	০.০০	৬.৮০	৬.৮০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৪	বিজিএফসিএল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫	এলপি গ্যাস লিঃ	৭.৭৭	১.৮১	০.০০	৭.৭৭	৭.৭৭	৭.৭৭	০.০০	২.০০	১৭.০০	১৭.০০
	মোট	১২৭০.১৬	২১৮.৭৬	২৫৩.৬৮	১২৩৫.১১	২৮৯.৭০	২২৬.৬৫	২২৫.১৬	৫৩.০০	৩৫০১.৬২	২২৬৬.৫১

Signature

- ০২ -

Signature

কোম্পানির প্রদেয় ভ্যাট এর বিবরণী

(কোটি টাকায়)

এজেন্টের নাম	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত দেয় অংক	চলতি মাস মে ২০২৬		চলতি মাসের শেষ তারিখে ক্রমপঞ্জীভূত দেয় অংক	উদ্ধৃতি কাল (এজিং)			চলতি বছরের ক্রমপঞ্জীভূত দেয় অংক	চলতি বছরের ক্রমপঞ্জীভূত পরিশোধিত অংক	বিগত বছরের ৩০শে জুন দেয় অংক
		দেয়	পরিশোধিত		মার্চ ২০২৬	এপ্রিল ২০২৬	মে ২০২৬			
হরিশপুর ফিল্ড	২.১২	১.৭৫	১.৬৭	২.০৩	১.৫২	১.৬৫	১.৭৫	২৪.৫৭	৩৪.০৪	২৫.৩৫
কৈলাশটীলা	২.৫১	৬.৬০	৩.৭০	৪.৩২	২.৬০	৬.৬০	৬.৬০	৩.৪০	৭.২২	১.১৬
এমএসটিই	১০৯০১	৬৬.৭	১১.০১	৫৫.৭০	৪৫.৭	০৫.৭	৬৬.৭	১৭.০০	০৫.৫১	১৪.৩৯
রশিদপুর	৮০.৭৩	৬৫.৪১	৪৪.১১	৭৬.৬৬	০৪.৪১	১৪.১১	৬৫.৪১	১৭.৬৪	১৪.২৬	১০০.৮০
বিয়ানীবাজার	১.২৯	৬৫.৩	২২	৭০.৩	৩.৩	৬৫.৩	৬৫.৩	৩৩.৩৩	২৭.৫৩	২৫.৪৪
আরসিএফসি	২১২.৪২	৬১.৫০	৫৪.০	২১৬.৫২	৩.৫০	২৭.৪০	৬১.৫০	২৩.৭৪	৬.১৩	৮৬.১৩
৪০০০ বিপিডি	১১৪৯.৩৫	১৬.৬১	২২.৩২	৬০৪.৫১	২০.৪২	১৬.৬১	১৬.৬১	২১৪.৪২	২৫.৫২	১৬২.৬৬
মোট	৯৩.৯৫	৭৪.২৭	০০.৯৪	৪৪.৬৯	১১.৩৫	৬২.৫৭	৭৪.২৭	৫৭৫.১৭	৫৭৫.৫৬	৫৪৪.৬০

Signature

Signature

সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা বিবরণী

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণী	বিগত মাস এপ্রিল ২০২৬	চলতি মাস মে ২০২৬	বিগত বৎসরের মোট ২০২৪-২০২৫	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত	প্রারম্ভ হতে ক্রমপুঞ্জিত
ক) প্রকৃত প্রদান ভিত্তিক :						
১	ভ্যাট	৫২.১৭	৪৯.০০	৫৬০.১৫	৫৯৫.৯৬	৭১.৬৮১১
২	আয়কর	৬.১২	৬.৬৭	৩৮.৬৯	৫৫.১২	৫৯.৯৮১
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০.০০	০.০০	২২.০০	২৭.০০	৭৯.৯৮২
৪	কাস্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৬.০১
৫	ডি এস এল	০.০০	০.০০	৯.৪৩	৯.১৩	১৭.১৩৬
৬	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৬.০১
মোট প্রদান		৫৮.২৯	৫৫.৬৬	৬৩০.২৭	৬৮৬.২৭	৭১.৬৮১১

খ) ব্যাকরুয়াল (প্রতিনাল ভিত্তিক)

১	ভ্যাট	৫১.২৬	৫২.৪৮	৫৯৪.৬০	৫৭৪.১৩	৬৬.৬৮১
২	আয়কর	৯.৯৬	৭.১৬	২৬৯.৪১	১৫৫.১৬	৭১.৬৮১
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	৩.৬৭	৩.৬৭	৭৫.০০	৮০.০৮	১৬.০১
৪	কাস্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৬.০১
৫	ডি এস এল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৬.০১
৬	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৬.০১
মোট		৬৪.৮৯	৬৬.৩৭	৯৩৯.০১	৭৬৯.৩৭	১৬.৬৮১

কোম্পানির নগদ তহবিল বিবরণী

(কোটি টকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	ক্যাশ ব্যালান্স	ব্যাংক ব্যালান্স				মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালান্স
			চলতি হিসাব	স্বল্প মেয়াদী হিসাব	দীর্ঘ মেয়াদী হিসাব	মোট ব্যাংক ব্যালান্স	
১	চলতি মাসের শেষ তারিখ ৩১-০৫-২০২৬	০.০০৫	২.০২০	১২৬.৬১০	১০৩৫.৫৪০	১১৬৮.১৭০	১১৬৮.১৭৫
২	বিগত মাসের শেষ তারিখ ৩০-০৪-২০২৬	০.০০৭	১.০৩০	৪০.২০০	১০৯৫.৫১০	১১৩৬.৭৪০	১১৩৬.৭৪৭
৩	বিগত বছরের শেষ তারিখ ৩০-০৬-২০২৫	০.০০৪	২.১৫০	৪০০.০১২	৯৪৪.৬৫৮	১৩৪৬.৮২০	১৩৪৬.৮২৪



-১৪-



বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের গ্যাস ও উপজাত তেল বিক্রয়

আয়-ব্যয় এবং বকেয়া পাওনার বিশ্লেষণ বিবরণী

ক্রমিক নং	মাস	গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ (এম এম সি এম)	উপজাত তেল বিক্রয়ের পরিমাণ (হাজার লিটার)	আয় (কোটি টাকায়)	ব্যয় (এসডি ড্যাটাসহ) (কোটি টাকায়)	বকেয়া পাওনা (কোটি টাকায়)
১	চলতি মাস মে ২০২৬	১২৩.২৬	২১,০৯০.১৩	২১৭.৩৭	১৯৯.৮৫	১২৩৫.১১
২	বিগত মাস এপ্রিল ২০২৬	১১৯.১৫	২০,৭৯৭.৫৫	২১৩.২৮	১৮৫.২৬	১২৭০.১৭
৩	কম/বেশী (বিগত মাস হতে চলতি মাস)					
ক)	পরিমাণ	৪.১১	২৯২.৫৮	৪.০৯	১৪.৫৯	-৩৫.০৬
খ)	পরিমাণ হ্রাস / বৃদ্ধির শতকরা হার (%)	৩.৪৫%	১.৪১%	১.৯২%	৭.৮৮%	-২.৭৬%
৪	বিগত বছরের মে ২০২৫	১২৯.৩২	২৪৫৮৯.৪৯	২৩৯.৬০	১৫১.৫৪	১০২৯.৭৩
৫	কম/বেশী (বিগত বছরের চলতি মাস হতে চলতি বছরের চলতি মাস)					
ক)	পরিমাণ	-৬.০৬	-৩৪৯৯.৩৭	-২২.২৩	৪৮.৩১	২০৫.৩৮
খ)	পরিমাণ হ্রাস / বৃদ্ধির শতকরা হার (%)	-৪.৬৯%	-১৪.২৩%	-৯.২৮%	৩১.৮৮%	১৯.৯৪%

Signature

Signature

মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

২০২৫-২০২৬ ইং অর্থ বৎসরের মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয়ের বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ: এমএমসিএম

মূল্য: মিলিয়ন টাকায়

মাস	তিতাস		জালানাবাদ		বাখরাবাদ		কর্পক্ষণী		পাচ্চিমাঞ্চল		সুন্দরবন		দ্বিটিসিএল		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১			৪		৬		৭		১০		১১		১২		১৩	
জুলাই ২৫	০.০০	০.০০	৬৪.১৬	২০৯.০৩	৩৮.১৬	১১৯.১১	০.০০	০.০০	৪১.১৬	৫৪.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩	১৬
আগস্ট ২৫	০.০০	০.০০	৬০.০৬	২১০.৯০	২১.৪৮	৭০.৬১	০.০০	০.০০	৪১.১৬	৫৪.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩	১৬
সেপ্টেম্বর ২৫	০.০০	০.০০	৬৭.৬৬	২০২.৫১	৩১.৪৮	৭০.৬১	০.০০	০.০০	৪১.১৬	৫৪.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩	১৬
অক্টোবর ২৫	০.০০	০.০০	৬৭.৬৬	২০২.৫১	৩১.৪৮	৭০.৬১	০.০০	০.০০	৪১.১৬	৫৪.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩	১৬
নভেম্বর ২৬	০.০০	০.০০	৬৭.৬৬	২০২.৫১	৩১.৪৮	৭০.৬১	০.০০	০.০০	৪১.১৬	৫৪.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩	১৬
ডিসেম্বর ২৫	০.০০	০.০০	৬৭.৬৬	২০২.৫১	৩১.৪৮	৭০.৬১	০.০০	০.০০	৪১.১৬	৫৪.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩	১৬
জানুয়ারি ২৬	০.০০	০.০০	৬৭.৬৬	২০২.৫১	৩১.৪৮	৭০.৬১	০.০০	০.০০	৪১.১৬	৫৪.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩	১৬
ফেব্রুয়ারি ২৬	০.০০	০.০০	৬৭.৬৬	২০২.৫১	৩১.৪৮	৭০.৬১	০.০০	০.০০	৪১.১৬	৫৪.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩	১৬
মার্চ ২৬	০.০০	০.০০	৬৭.৬৬	২০২.৫১	৩১.৪৮	৭০.৬১	০.০০	০.০০	৪১.১৬	৫৪.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩	১৬
এপ্রিল ২৬	০.০০	০.০০	৬৭.৬৬	২০২.৫১	৩১.৪৮	৭০.৬১	০.০০	০.০০	৪১.১৬	৫৪.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩	১৬
মে ২৬	০.০০	০.০০	৬৭.৬৬	২০২.৫১	৩১.৪৮	৭০.৬১	০.০০	০.০০	৪১.১৬	৫৪.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩	১৬
জুন ২৬	০.০০	০.০০	৬৭.৬৬	২০২.৫১	৩১.৪৮	৭০.৬১	০.০০	০.০০	৪১.১৬	৫৪.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩	১৬
সমষ্টি																
মোট	০.০০	০.০০	৬০১.০১	২১৬৯.৫০	৩৬৬.৬৬	১২০২.১১	০.০০	০.০০	৪১.১৬	৫৪.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩	১৬

[Signature]

[Signature]

বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ: এয এয সি এয,
মূল্য: মিনিয়ন টাকায়

[illegible]









15

— be —

Ways

২০২৫-২০২৬ এর
মে ২০২৬ মাস পর্যন্ত

কোম্পানির ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন চিত্র
প্রতিবেদনাধীনঃ মে ২০২৬

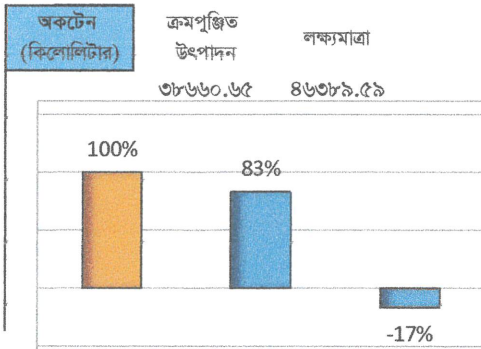
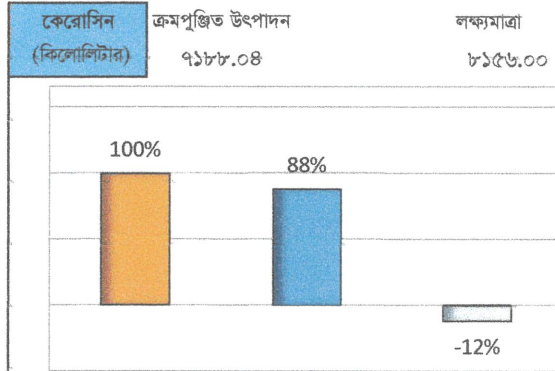
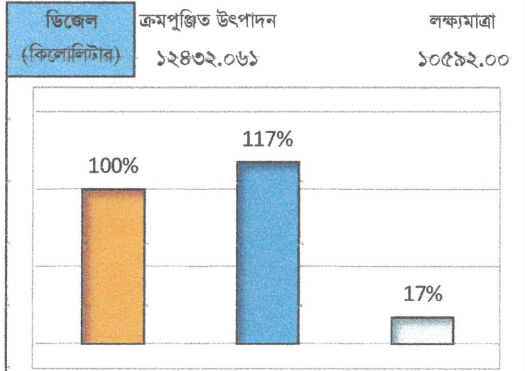
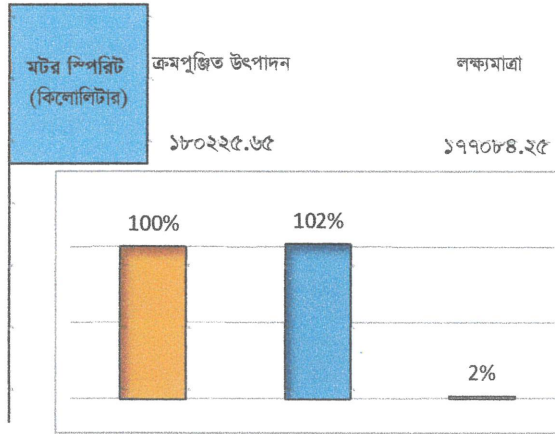
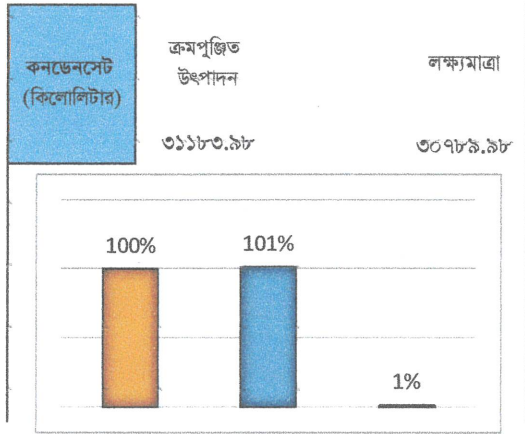
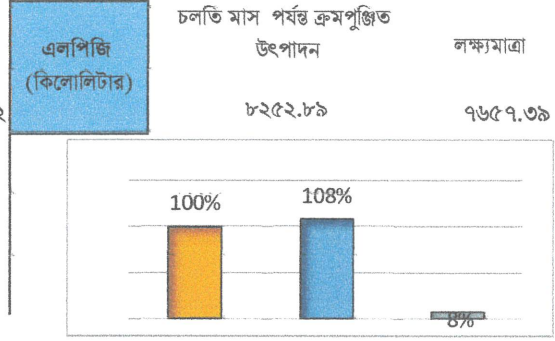
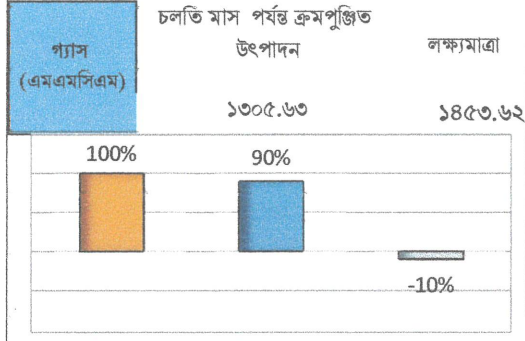


Handwritten signature

Handwritten signature

কোম্পানির ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিত বিক্রয় চিত্র

প্রতিবেদনাধীন মাসঃ মে ২০২৬

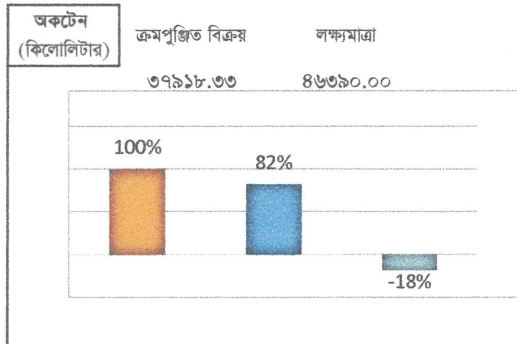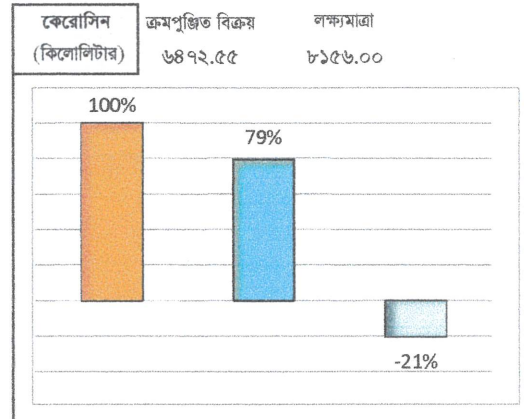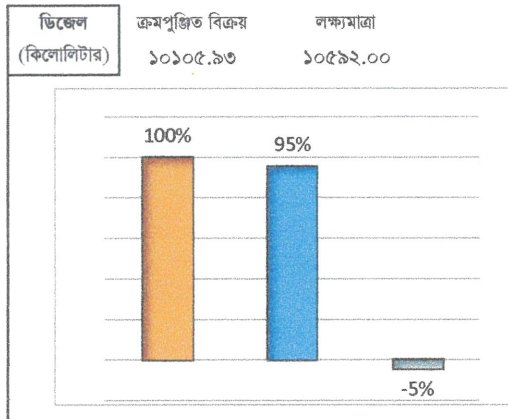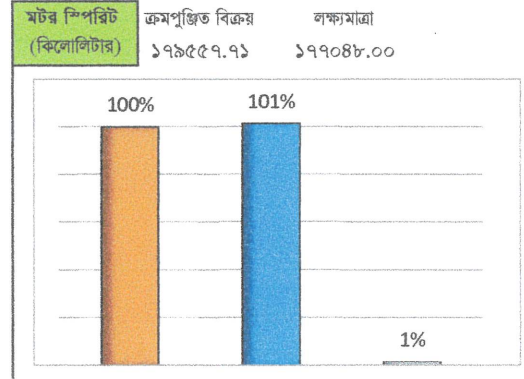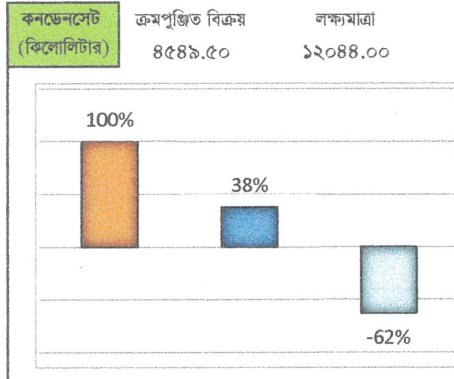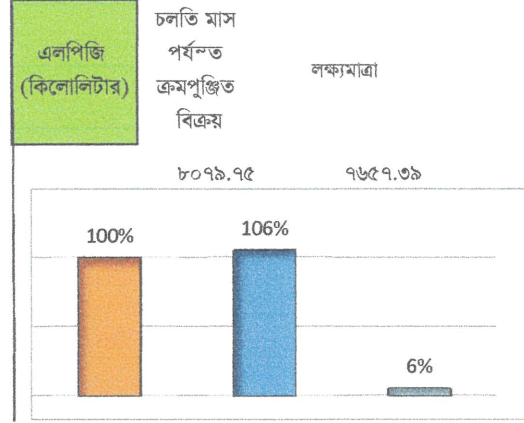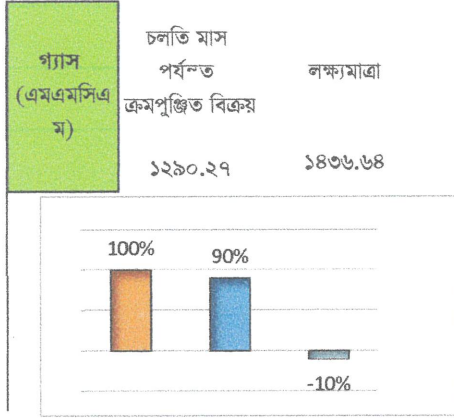

পরিচিতি

লক্ষ্যমাত্রা	
চলতি মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বিক্রয়	
ঘাটতি (-)/ বর্ধিত (+)	

স্বাক্ষর


স্বাক্ষর

কোম্পানির চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর আওতায় ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ৭টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। উক্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্পটি মেয়াদকাল ডিসেম্বর ২০২৫ মাসে শেষ হওয়াতে প্রকল্পের পিসিআর ১১-০৫-২০২৬ তারিখে পেট্রোবাংলা হতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৬টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি নিজস্ব অর্থায়নে, ১টি নিজস্ব ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) এবং ৩টি নিজস্ব ও জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসজিএফএল-এর চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মে ২০২৬ মাস পর্যন্ত হালনাগাদ সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি নিয়ে উপস্থাপন করা হলো:

(ক) সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন, ১ম সংশোধিত।


১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট স্ট্রাকচারে নর্দান ক্লোজারে ২৫৭৬ মিটার গভীরতায় একটি অনুসন্ধান কূপ (সিলেট-১০) এবং এ কূপের আওতায় অধিকহারে গ্যাস উত্তোলনের জন্য মূল ডিপিসিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩৩০০ (± ১০০) মিটার গভীরতায় আরো একটি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ (সিলেট-১০এক্স) খনন করা;																											
			সিলেট-১০ ও সিলেট-১০এক্স কূপ খনন করত: ১০৬ বিসিএফ গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি এবং প্রথম ৫ বছর দৈনিক প্রায় ৪০ (সিলেট-১০: ২০ ও সিলেট-১০এক্স: ২০) মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছর দৈনিক প্রায় ৩৫ (সিলেট-১০: ২০ ও সিলেট-১০এক্স: ১৫) মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক প্ররণ করা।																											
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধিত ডিপিসিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	<table><tr><td>স্থানীয় মুদ্রা</td><td>:</td><td colspan="5">১৩৯০১.০০</td></tr><tr><td>বৈদেশিক মুদ্রা</td><td>:</td><td colspan="5">৩৭৮০৯.০০</td></tr><tr><td>মোট</td><td>:</td><td colspan="5">৫১৭১০.০০</td></tr></table>							স্থানীয় মুদ্রা	:	১৩৯০১.০০					বৈদেশিক মুদ্রা	:	৩৭৮০৯.০০					মোট	:	৫১৭১০.০০				
স্থানীয় মুদ্রা	:	১৩৯০১.০০																												
বৈদেশিক মুদ্রা	:	৩৭৮০৯.০০																												
মোট	:	৫১৭১০.০০																												
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২১ সমাপ্তি: জুন ২০২৬																											
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিসিপি: ২৩-১২-২০২১ এবং আরডিপিপি: ২৭-০৫-২০২৪																											
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)																											
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	<table><tr><td colspan="2">জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন</td><td rowspan="2">আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)</td><td colspan="2">২০২৫-২৬ অর্থ বছরের মে ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি</td><td colspan="2">প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি</td></tr><tr><td>আর্থিক</td><td>বাস্তব</td><td>আর্থিক</td><td>বাস্তব</td><td>আর্থিক</td><td>বাস্তব</td></tr><tr><td>২৪৫৮৮.৮৮</td><td>৭১.০৭%</td><td>২৩৫৪৬.০০</td><td>১৯১১৫.১০</td><td>২৮.৫৫%</td><td>৪৩৭০৩.৯৮</td><td>৯৯.৬২%</td></tr></table>							জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের মে ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	২৪৫৮৮.৮৮	৭১.০৭%	২৩৫৪৬.০০	১৯১১৫.১০	২৮.৫৫%	৪৩৭০৩.৯৮	৯৯.৬২%	
জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের মে ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি																									
আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব																								
২৪৫৮৮.৮৮	৭১.০৭%	২৩৫৪৬.০০	১৯১১৫.১০	২৮.৫৫%	৪৩৭০৩.৯৮	৯৯.৬২%																								
৭	মে ২০২৬ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন শেষে ২৭-০৪-২০২৫ তারিখ হতে কমবেশী দৈনিক ১২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস গ্রীডে যুক্ত করা হয়। বর্তমানে উক্ত কূপ হতে অতিরিক্ত পানি উৎপাদন ও ফ্লোয়িং প্রেসার হাস পাওয়ায় ১২-০২-২০২৬ তারিখ হতে গ্যাস উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। সিলেট-১০এক্স নং কূপ টার্গ-কি ভিত্তিতে খননের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CNPC Chuangning Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), China এর সাথে ১৯-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। সিলেট-১০এক্স নং কূপের খনন কাজ সম্পন্ন করত: ১২-০৪-২০২৬ তারিখে দৈনিক ৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা হয়। মে ২০২৬ মাসে উক্ত কূপ হতে দৈনিক ০.৫৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হয়েছে। প্রকল্পের ২য় আরডিপিপি প্রশাসনিক অনুমোদনের লক্ষ্যে ০১-০৬-২০২৬ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে শিল্প ও শক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।																											

(খ) সিলেট-১১নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট ও রশিদপুর স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ২০০০ (±১০০) মিটার ও ৪২০০ (±১০০) মিটার (TVD) গভীরতায় একটি উন্নয়ন কূপ (সিলেট-১১) ও একটি অনুসন্ধান কূপ (রশিদপুর-১৩) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে সিলেট-১১ ও রশিদপুর- ১৩নং কূপ দুটি হতে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১৬ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা : ১৮২৬৭.০০ বৈদেশিক মুদ্রা : ৪১৬৮৩.০০ মোট : ৫৯৯৫০.০০						
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: মার্চ ২০২৪ সমাপ্তি: জুন ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১৮-০৪-২০২৪						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫- ২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের মে ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
			৪৫৮.০০	১৮.১৯%	২৩৪৪৮.০০	২৩৪৪৮.০০	৫১.৯৬%	২৩৯০৬.০০	৭০.১৫%
৭	মে ২০২৬ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	Sinopec International Petroleum Service Corporation, China-এর মাধ্যমে টার্ন-কি ভিত্তিতে সিলেট-১১ নং (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩ নং (অনুসন্ধান কূপ) কূপ খননের লক্ষ্যে ১৫-১০-২০২৪ তারিখে এসজিএফএল-এর সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ঠিকাদারের অনুকূলে ০৬-০৪-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। সিলেট-১১ নং কূপ হতে হরিপুর প্রসেস প্লান্ট পর্যন্ত ৬ ইঞ্চি ব্যাসের ৪(চার) কিলোমিটার গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ কাজ শেষে ৩০-০৪-২০২৬ তারিখ হতে কম-বেশি দৈনিক ২.০৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। রশিদপুর-১৩নং কূপের ভূমি উন্নয়ন ও পুত-নির্মাণ কাজ শেষে কূপ খনন কাজ ২৮-০৩-২০২৬ তারিখে শুরু করে মে ২০২৬ মাস পর্যন্ত ৩১৪৬ মিটার (এমডি) পর্যন্ত খনন সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রকল্পের অনুকূলে লিকুইডিটি সার্টিফিকেট গ্রহণের জন্য ২৪-০৫-২০২৬ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।						





(গ) কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২নং কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্প।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২নং কূপসমূহকে পুনরায় গ্যাস উৎপাদন আনয়ন: সংশ্লিষ্ট কূপের টার্গেটেড স্যান্ডসমূহে মজুদকৃত ৭১২ বিসিএফ গ্যাসের মধ্যে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে (কৈলাশটিলা-১: ৫, রশিদপুর-৩: ১০ ও বিয়ানীবাজার-২: ৮) এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে (কৈলাশটিলা-১: ৫, রশিদপুর-৩: ৭ ও বিয়ানীবাজার-২: ৬) অর্থাৎ মোট ৭১.৭৫ বিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করে দেশের জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা : ১৬১২৯.০০ বৈদেশিক মুদ্রা : ৬২৬৬.০০ মোট : ২২৩৯৫.০০						
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: জানুয়ারি ২০২৫ সমাপ্তি: জুন ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১১-১২-২০২৪						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫- ২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের মে ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
			৭৫.০০	৮.২০%	১৮১১৫.০০	১৬৫৯৯.৩২	৯১.৮০%	১৬৬৭৪.৩২	১০০%
৭	মে ২০২৬ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	প্রকল্পের ওয়ার্কওভার বাপেক্স-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এসজিএফএল এবং বাপেক্স-এর মধ্যে ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত চুক্তি মোতাবেক ওয়ার্কওভার কাজে প্রয়োজনীয় সকল মালামাল বাপেক্স কর্তৃক প্রদান করা হবে। রশিদপুর-৩নং কূপের ১৩৯৭-১৩৯১ মিটার গভীরতায় তৃতীয় ডিএসটি করা হলে গ্যাসের উপস্থিতি পাওয়া যায় এবং ১৫-০৯-২০২৫ তারিখ হতে দৈনিক ৮.৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা হয়েছে। মে ২০২৬ মাসে উক্ত কূপ হতে দৈনিক ৯.৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস গ্রীডে সরবরাহ করা হয়েছে। কৈলাশটিলা-১নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সম্পন্ন করত: ০৪-১১-২০২৫ তারিখে (২২৪২-২২৪৪; ২২৪৯.৭.৮-২২৫১; ২২৬৪-২২৬৬.৭) মিটার গভীরতায় পারফোরেশন করা হলে ১৬৫৫ পিএসআই চাপে ৫.৫ এমএমএসসিএফ হারে গ্যাসের ফ্লো পাওয়া যায়। মে ২০২৬ মাসে উক্ত কূপ হতে দৈনিক ৩.০১ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস গ্রীডে সরবরাহ করা হয়েছে। বিয়ানীবাজার-২নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সম্পন্ন করত: ২০-০২-২০২৬ তারিখে ৩৪৯৭-৩৪৯৯ মিটার গভীরতায় ১ম ডিএসটি করা হলে ২৯৫০ পিএসআই চাপে দৈনিক ৯.২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়। মে ২০২৬ মাসে উক্ত কূপ হতে দৈনিক ৯.০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হয়েছে।						

(ঘ) ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডুপিটিলা ও কৈলাশটিলা স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ৩৪৬০ (±১০০) মিটার ও ৩৬০০ (±১০০) মিটার (TVD) গভীরতায় দু'টি অনুসন্ধান কূপ (ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ দুটি হতে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে অর্থাৎ ১০ বছরে মোট ৫৬ বিসিএফ গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা : ১৯৯১২.০০ বৈদেশিক মুদ্রা : ৪৪৭৩৬.০০ মোট : ৬৪৬৪৮.০০						
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২৪ সমাপ্তি: সেপ্টেম্বর ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৭-০১-২০২৫						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের মে ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
			১০.০০	৫.৩৬%	৯৪৮৫.০০	৭০২.৯৪	৮.১১%	৭১২.৯৪	১৩.৪৭%
৭	মে ২০২৬ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	কৈলাশটিলা-৯নং কূপের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য যৌথ তদন্ত ১৪-০৫-২০২৬ তারিখে সম্পাদন করা হয়েছে এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট কর্তৃক ২১-০৫-২০২৬ তারিখে গণ বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে। ডুপিটিলা-১নং কূপের ৭.৮২৩ একর ভূমি অধিগ্রহণের সংশোধিত প্রস্তাব জাখসবি কর্তৃক ১৬-০৪-২০২৬ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তির পর সংশোধিত প্রস্তাব জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট-এ ১৬-০৪-২০২৬ তারিখে দাখিল করা হয়েছে। কৈলাশটিলা-৯ এবং ডুপিটিলা-১নং কূপ খননের লক্ষ্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC)-এর সাথে ২৭-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০-০৫-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১৩-০৭-২০২৫ তারিখে কৈলাশটিলা-৯নং কূপের ভূমি এবং ৬-১০-২০২৫ তারিখে ডুপিটিলা-১নং কূপের ভূমি হস্তান্তর করা হয়েছে। ১৭-০১-২০২৬ তারিখে ডুপিটিলা-১নং কূপের ভূমি উন্নয়ন কাজ শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে ভূমি উন্নয়ন ও রাস্তা নির্মাণ কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত Rich Spread Group Limited, British Virgin Islands এর সাথে ২১-০৮-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।						

(৬) রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প।







১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রশিদপুর স্ট্রাকচারে ২৯০০ (±১০০) মিটার গভীরতায় একটি অনুসন্ধান কূপ (রশিদপুর-১১) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে ২৯.৪৯ বিসিএফ গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি করা এবং প্রথম ৩ বছরে দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।							
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা : ৭৫১৮.০০ বৈদেশিক মুদ্রা : ১৯৬৬৯.০০ মোট : ২৭১৮৭.০০							
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২৪ সমাপ্তি: জুন ২০২৬							
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১৪-০১-২০২৫							
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি							
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ-বছরের মে ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
			৩১.০০	০.১৩%	২১৭৯৭.১১	২০৫৮৬.১১	৯৩.৯৬%	২০৬১৭.১১	৯৪.০৯%	
৭	মে ২০২৬ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	রশিদপুর-১১নং কূপ খননের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CNPC Chuangqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC)-এর সাথে ২৭-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০-০৫-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। খনন ঠিকাদার কর্তৃক ০৮-১১-২০২৫ তারিখে কূপটি স্পাড-ইন শুরু করা হয়েছে এবং ৩১১০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন অপারেশন ০৪-০১-২০২৬ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত কূপে কোন গ্যাস পাওয়া যায়নি। উক্ত কূপের ডিএসটি করা হলে কোন স্তরেই গ্যাসের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি। পরবর্তীতে Joint Technical Committee (JTC)-এর সুপারিশ অনুযায়ী কূপের খনন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।							

(চ) সিলেট-১২ নং কূপ খনন (তেল কূপ)।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	তেল উৎপাদনের লক্ষ্যে সিলেট স্ট্রাকচারের নর্দান ক্রোজারে ২৪৯১ (± ৫০) মিটার গভীরতায় ২৪ মাসে একটি তেল কূপ (সিলেট-১২) খনন করা; সিলেট-১২নং তেল কূপ খনন করত: ১০ বছর দৈনিক প্রায় ৮০০ ব্যারেল হারে তেল উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।														
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা		:	৫৭৪৩.০০		বৈদেশিক মুদ্রা		:	১৯৭৮২.০০		মোট		:	২৫৫২৫.০০	
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: জানুয়ারি ২০২৫ সমাপ্তি: ডিসেম্বর ২০২৬														
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২২-০২-২০২৫														
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি														
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের মে ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি									
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব								
			-	৬.০৭%		৬৭.০০	৩৬.৯৭	১১.১৯%	৩৬.৯৭	১৭.২৬%							
৭	মে ২০২৬ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	প্রকল্পের ৮.৮৭ একর ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে ১০-০৩-২০২৬ তারিখে ৭(১) ধারার অধীনে নোটিশসমূহ জারি করা হয়েছে। সিলেট ডিসি অফিস হতে ১৩-০৫-২০২৬ তারিখে ৮(৩) ধারার অধীনে অধিগ্রহণকৃত ভূমির প্রাক্কলিত অর্থ জমা প্রদানের নোটিশ জারী করা হয়েছে। সিলেট-১২নং কূপ খনন (তেল কূপ) প্রকল্পের আওতায় টার্ন-কি ভিত্তিতে কূপ খনন অপারেশন, মালামাল সরবরাহ, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে ১২-১০-২০২৫ তারিখে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ২২-০২-২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানি বোর্ডের ৬৭৫তম সভায় দরপত্রসমূহের মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদনের লক্ষ্যে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার নিমিত্ত পেট্রোবাংলার মাধ্যমে জাখসবি-তে প্রস্তাব প্রেরণের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার নিমিত্ত এসজিএফএল হতে ০৬-০৩-২০২৬ তারিখে পেট্রোবাংলায়, ১০-০৩-২০২৬ তারিখে পেট্রোবাংলা হতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অনুমোদনক্রমে ০৯-০৪-২০২৬ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ক্রয়প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। সিসিজিপি'র সুপারিশক্রমে সিলেট-১২ নং কূপ খনন ঠিকাদার নিয়োগের চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদন সংক্রান্ত সরকারি আদেশ ১২-০৫-২০২৬ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে জারি হয়েছে। যায়। উক্ত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১৭-০৫-২০২৬ তারিখে চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NoA) জারি করা হয়েছে।														

— ২৫ —

কোম্পানির চলমান প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি মে ২০২৬ পর্যন্ত

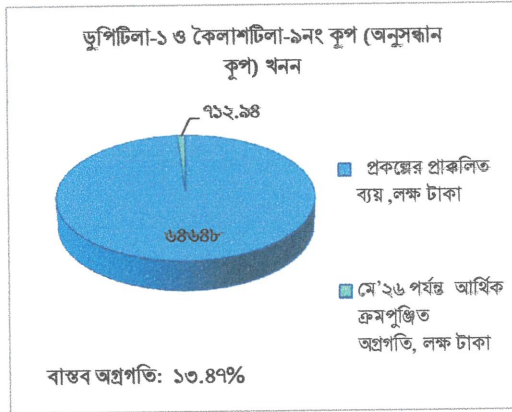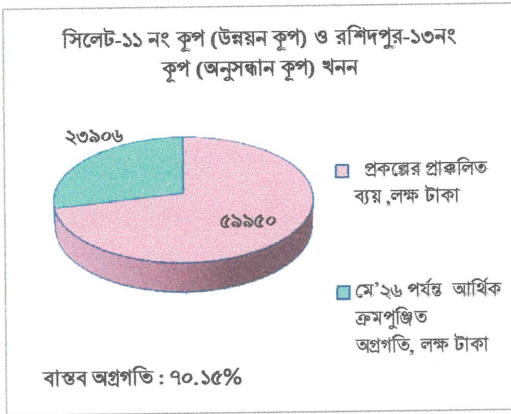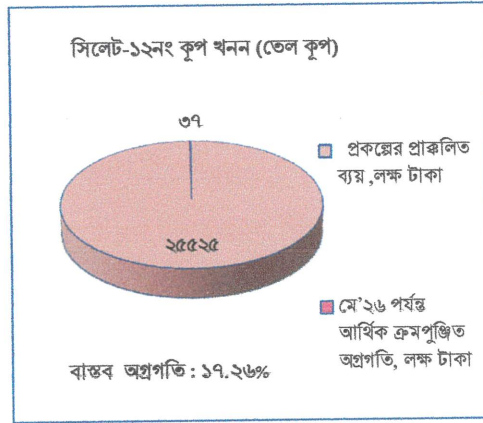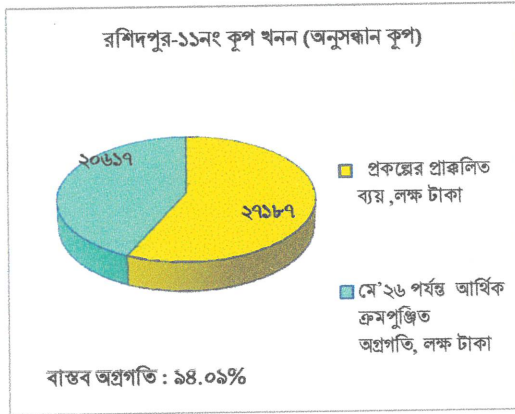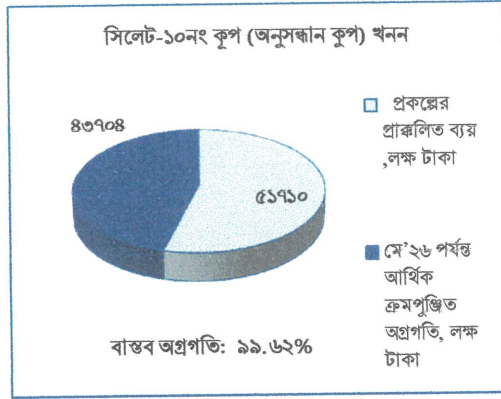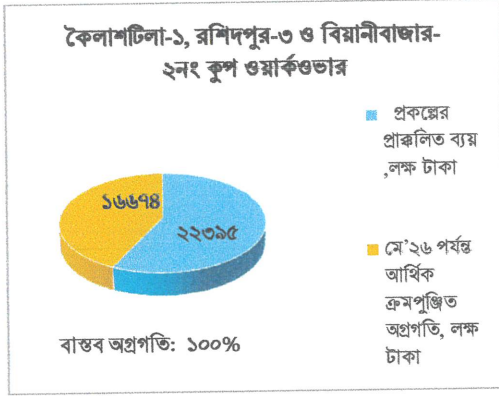

২০২৬

২০২৬

উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট

মে ২০২৬

উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট :

- ক) উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড : নাই।
- খ) আগামী দুই মাসে সম্পাদিতব্য গুরুত্বপূর্ণ :
কাজের তালিকা।
১) সিলেট- ১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে।
২) রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে।
৩) কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২নং কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।
- গ) আগামী দুই মাসে বড় রকমের কোন : নাই।
সমস্যা/সংকটের আশঙ্কা করা হলে তার
বিবরণ



জনবলের পরিসংখ্যান

মাসের নাম : মে ২০২৬

জনবলের পরিসংখ্যান :

১। কর্মকর্তা

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫	কর্মরত পদের সংখ্যা
১।	৭৮০০০ (নির্ধারিত)	-
২।	৬৬০০০-৬৮৮৮০-৭১০৫০-৭৩৭২০-৭৬৪৯০	০১
৩।	৫৬৫০০-৫৮৭৬০-৬১১২০-৬৩৫৭০-৬৬১২০-৬৮৭৭০-৭১৫৩০-৭৪৪০০	০৯
৪।	৫০০০০-৫২০০০-৫৪০৮০-৫৬২৫০-৫৮৫০০-৬০৮৪০-৬৩২৮০-৬৫৮২০-৬৮৪৬০-৭১২০০	৬৩
৫।	৪৩০০০-৪৪৯৪০-৪৬৯৭০-৪৯০৯০-৫১৩০০-৫৩৬১০-৫৬০৩০-৫৮৫৬০-৬১২০০-৬৩৯৬০-৬৬৮৪০-৬৯৮৫০	৭৫
৬।	৩৫৫০০-৩৭২৮০-৩৯১৫০-৪১১১০-৪৩১৭০-৪৫৩৩০-৪৭৬০০-৪৯৯৮০-৫২৪৮০-৫৫১১০-৫৭৮৭০-৬০৭৭০-৬৩৮১০-৬৭০১০	৩৬
৭।	২৯০০০-৩০৪৫০-৩১৯৮০-৩৩৫৮০-৩৫২৬০-৩৭০৩০-৩৮৮৯০-৪০৮৪০-৪২৮৯০-৪৫০৪০-৪৭৩০০-৪৯৬৭০-৫২১৬০-৫৪৭৭০-৫৭৫১০-৬০৩৯০-৬৩৪১০	-
৮।	২৩০০০-২৪১৫০-২৫৫৬০-২৬৬৩০-২৭৯৭০-২৯৩৭০-৩০৮৪০-৩২৩৯০-৩৪০১০-৩৫৭২০-৩৭৫১০-৩৯৩৯০-৪১৩৬০-৪৩৪৩০-৪৫৬১০-৪৭৯০০-৫০৩০০-৫২৮২০-৫৫৪৭০	০১
৯।	২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০	১১১
১০।	১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০	৩৩
মোট কর্মকর্তা :		৩২৯

২। কর্মচারী

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫	কর্মরত পদের সংখ্যা
১।	২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০	-
২।	১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০	-
৩।	১২৫০০-১৩১৩০-১৩৭৯০-১৪৪৮০-১৫২১০-১৫৯৮০-১৬৭৮০-১৭৬২০-১৮৫১০-১৯৪৪০-২০৪২০-২১৪৫০-২২৫৩০-২৩৬৬০-২৪৮৫০-২৬১০০-২৭৪১০-২৮৭৯০-৩০২৩০	০৯
৪।	১১৩০০-১১৮৭০-১২৪৭০-১৩১০০-১৩৭৬০-১৪৪৫০-১৫১৮০-১৫৯৪০-১৬৭৪০-১৭৫৮০-১৮৪৬০-১৯৩৯০-২০৩৬০-২১৩৮০-২২৪৫০-২৩৫৮০-২৪৭৬০-২৬০০০-২৭৩০০	২১
৫।	১১০০০-১১৫৫০-১২১৩০-১২৭৪০-১৩৩৮০-১৪০৫০-১৪৭৬০-১৫৫০০-১৬২৮০-১৭১০০-১৭৯৬০-১৮৮৬০-১৯৮১০-২০৮১০-২১৮৬০-২২৯৬০-২৪১১০-২৫৩২০-২৬৫৯০	৬২
৬।	১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০-২১৩১০-২২৩৮০-২৩৫০০-২৪৬৮০	২৬
৭।	৯৭০০-১০১৯০-১০৭০০-১১২৪০-১১৮১০-১২৪১০-১৩০৪০-১৩৭০০-১৪৩৯০-১৫১১০-১৫৮৭০-১৬৬৭০-১৭৫১০-১৮৩৯০-১৯৩১০-২০২৮০-২১৩০০-২২৩৭০-২৩৪৯০	০৩
৮।	৯৩০০-৯৭৭০-১০২৬০-১০৭৮০-১১৩২০-১১৮৯০-১২৪৯০-১৩১২০-১৩৭৮০-১৪৪৭০-১৫২০০-১৫৯৬০-১৬৭৬০-১৭৬০০-১৮৪৮০-১৯৪১০-২০৩৯০-২১৪১০-২২৪৯০	৪০
৯।	৯০০০-৯৪৫০-৯৯৩০-১০৪৩০-১০৯৬০-১১৫১০-১২০৯০-১২৭০০-১৩৩৪০-১৪০১০-১৪৭২০-১৫৪৬০-১৬২৪০-১৭০৬০-১৭৯২০-১৮৮২০-১৯৭৭০-২০৭৬০-২১৮০০	০১
১০।	৮৮০০-৯২৪০-৯৭১০-১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০	-
১১।	৮৫০০-৮৯৩০-৯৩৮০-৯৮৫০-১০৩৫০-১০৮৭০-১১৪২০-১২০০০-১২৬০০-১৩২৩০-১৩৯০০-১৪৬০০-১৫৩৩০-১৬১০০-১৬৯১০-১৭৭৬০-১৮৬৫০-১৯৫৯০-২০৫৭০	-
১২।	৮২৫০-৮৬৭০-৯১১০-৯৫৭০-১০০৫০-১০৫৬০-১১০৯০-১১৬৫০-১২২৪০-১২৮৬০-১৩৫১০-১৪১৯০-১৪৯০০-১৫৬৫০-১৬৪৪০-১৭২৭০-১৮১৪০-১৯০৫০-২০০১০	০২
মোট কর্মচারী :		১৬৪
মোট কর্মকর্তা এবং কর্মচারী (৩২৯+১৬৪) :		৪৯৩ জন

০১ জন কর্মচারীর অবসরজনিত কারণে গত মাসের প্রতিবেদনের সাথে প্রতিবেদনাবীন মাসের জনবলের সংখ্যার তারতম্য হয়েছে।

- ২৮ -
