

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মহাপরিচালকের কার্যালয়  
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর  
যুব ভবন  
১০৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।  
www.dyd.gov.bd

এপ্রিল ২০২৬ মাসের প্রকল্প পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর  
তারিখ : ১৬.০৪.২০২৬ খ্রি.  
সময় : বেলা ০২:৩০ ঘটিকা  
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

২.০ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

ক্র: নং	নাম ও পদবী	দপ্তর/ প্রকল্পের নাম	স্বাক্ষর
০১.	জনাব কাজী মোখলেছুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালক	Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) প্রকল্প	স্বাক্ষরিত
০২.	জনাব এম এ আখের পরিচালক (প্রশাসন) ও প্রকল্প পরিচালক	টেকাব (২য় পর্ব) ও ৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ (২য় পর্ব) প্রকল্প	”
০৩.	জনাব মোঃ মানিকহার রহমান পরিচালক (অর্থ) ও প্রকল্প পরিচালক	দেশের ৬৪টি জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প	”
০৪.	জনাব একেএম মফিজুল ইসলাম পরিচালক (সিড ফাইন্যান্সিং) ও প্রকল্প পরিচালক	ইমপ্যাক্ট ৩য় পর্যায় প্রকল্প যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	”
০৫.	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান উপপরিচালক (প্রশাসন-১) ও প্রকল্প পরিচালক	এ আই প্রকল্প যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	”
০৬.	জনাব মোঃ সেলিম খান অধ্যক্ষ ও প্রকল্প পরিচালক	কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-এর প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	”
০৭.	জনাব মোঃ সেলিমুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি	”
০৮.	জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম সহকারী প্রকল্প পরিচালক	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি	”
০৯.	জনাব মোঃ হাছিনুর রহমান তালুকদার সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	”
১০.	জনাব নাজমুল সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	”
১১.	জনাব মোঃ শওকত আলী সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	”

৩.০ উপস্থাপনা:

সভাপতি মহোদয় সকলকে স্বাগত জানিয়ে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের এপ্রিল ২০২৬ মাসের প্রকল্প পর্যালোচনা সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার কার্যপত্র উপস্থাপনের আহ্বান জানালে সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১) সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরিত গত ১১ মার্চ ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প পর্যালোচনা সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সকলের সম্মতিতে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩.১ সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১) সভায় উপস্থাপন করেন যে, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের আরএডিপিতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মোট ১০টি উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট আরএডিপি বরাদ্দ ৫৭৮১১.৯৮ লক্ষ টাকা। আলোচ্য অর্থবছরের মার্চ ২০২৬ মাস পর্যন্ত প্রকল্পগুলোর অনুকূলে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যবহৃত অর্থের পরিমাণ ১৫৮৬৫.৪৭ লক্ষ টাকা, যা মোট বরাদ্দের ২৭.৪৪%।

৩.২ সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১) সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সভায় প্রকল্প ভিত্তিক অগ্রগতির বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেন। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ১০টি প্রকল্পের মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত সময়ে নিম্নরূপ অগ্রগতি উপস্থাপন করেনঃ

ক) ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

নং	মোট প্রকল্প	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয় (শতকরা হার)
০১.	১০টি	৫৭৮১১.৯৮	১৫৮৬৫.৪৭ ২৭.৪৪%

চলমান প্রকল্প

নং	প্রকল্পের নাম	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	
		বরাদ্দ	ব্যয় (%)
০১	টেকনোলজি এম্পাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হইলস ফর দ্য আন্ডার প্রিভিলেইজড বুরাল পিপল অব বাংলাদেশ (২য় পর্যায়)	৯৯৮.০০	৬৬৩.৯০ ৬৬.৫২%
০২	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্যায়) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৫০০০.০০	১৮৮৬.৭৩ ৩৭.৭৩%
০৩	LYTC & SNYP Life Skills Project	৩১.০০	৯.৭০ ৩১.২৯
০৪	Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN))	২৯৮৫৬.০০	৭৯২.৮২ ২.৬৬%
০৫	Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar, Bangladesh (ISEC)	৩৮৬৮.০০	২৯৪৬.৪৬ ৭৬.১৮%
০৬	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি	২৪১.৫৩	২৩.০৮ ৯.৫৬%
০৭	কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প	১২৩১.৯৫	৮০২.৩৩ ৬৫.১৩ %
০৮	৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)"	১৫৮৪.০০	৮৬৬.৮৫ ৫৪.৭৩%
০৯	দেশের ৪৮টি জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১৩৬৭৬.৫০	৭৮৬৯.২৮ ৫৭.৫৪%
১০	তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প	১৩২৫.০০	৪.৩২ ০.৩৩%
	সর্বমোট=	৫৭৮১১.৯৮	১৫৮৬৫.৪৭ ২৭.৪৪%

অতঃপর উপস্থিত প্রকল্প পরিচালকবৃন্দকে সভাপতি মহোদয়ের অনুরোধক্রমে স্ব-স্ব প্রকল্প ভিত্তিক আলোচনার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

৪.০ আলোচনা:

৪.১ “টেকনোলজি এম্পাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হইলস ফর দ্য আন্ডার প্রিভিলেইজড ও বুরাল পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব-২য় পর্যায়)” প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, প্রকল্পের আইসিটি ট্রেনিং ভ্যান ক্রয়ের নিমিত্ত অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে গত ৩০ মার্চ ২০২৬খ্রি. তারিখ ১টি আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যান (মিনিবাস) ক্রয়ে সম্মতি পাওয়া যায়। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ১০০% অর্জনের বিষয়ে আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) আইসিটি ট্রেনিং ভ্যান ক্রয়ের নিমিত্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

(খ) ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের গুনগত মান নিশ্চিত করতে হবে।

৪.২. “দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে রাজস্ব খাতের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ অনুমোদনের ন্যায় প্রকল্পের ঋণ অনুমোদন, বিতরণ এবং ঋণ আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ৫৩০২টি মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত ৩২৩১টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২৬খ্রি. এর মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জনের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত আছে।

বিবরণ	২০২৫-২৬ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	মার্চ/২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	মার্চ ২০২৬ মাসের অগ্রগতি
বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন	৫৩০২টি	৩২৩১টি	৭১০৯টি	৫২০টি
প্রশিক্ষণ বিষয়ক	প্রশিক্ষণের বিষয়	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	মন্তব্য
	বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ	৬০০০ জন	৫৮৫০ জন	৫৮৫০ জন খামারীকে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
	বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট রক্ষণাবেক্ষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৭৫০০ জন	-	মে/২৬ এর মধ্যে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হবে। প্রতি ব্যাচে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৩০ জন। ২৫০ ব্যাচে ৭৫০০জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- (ক) নির্ধারিত সময়ে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।
- (খ) যথাসময়ে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করতে হবে।

৪.৩. “Life Skills Education in Youth Training Center & Strengthening of National youth platform (LYTC & SNYP) Project”: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বরাদ্দ প্রাপ্তির ব্যাপারে UNFPA এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যক্রম শুরু করা হবে। সরকারী বিধি মোতাবেক গাড়ি ব্যবহার করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- ১. বরাদ্দ প্রাপ্তির ব্যাপারে ইউএনএফপি এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে;
- ২. সরকারী বিধি মোতাবেক গাড়ি ব্যবহার করতে হবে।

৪.৪ “Economic Acceleration and Resilience for the NEET (EARN)” শীর্ষক প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, (ক) প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি স্বাভাবিক রাখতে এবং শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে অর্থবছরের শুরু হতে কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে ব্যয় করা হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের আরএডিপিতে ২৯৮৫৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে, যার মধ্যে জিওবি খাতে ২৫৬.০০ লক্ষ টাকা এবং আরপিএল খাতে ২৯৬০০.০০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭৯২.৮২ লক্ষ টাকা। (খ) প্রকল্পের আওতায় ১০টি প্যাকেজের সার্ভিস প্রোভাইডার (এসপি) নিয়োগে প্রাপ্ত RFP-সমূহের Combined Evaluation সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচিত এনজিও/ফার্মগুলোর সঙ্গে Negotiation শেষে Draft Contract এর উপর মতামতের জন্য বিশ্বব্যাংকে প্রেরণ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের ক্লিয়ারেন্স পাওয়া গেলে অনুমোদনের জন্য সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটিতে (CCGP) প্রেরণ করা হবে। সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগ হলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হবে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- (ক) বিশ্বব্যাংকে প্রেরিত নির্বাচিত এনজিও/ফার্মগুলোর সঙ্গে Negotiation এর Draft Contract এর উপর মতামতের ক্লিয়ারেন্স আনয়নের ব্যাপারে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
- (খ) আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় করতে হবে।

৪.৫ “Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar, Bangladesh (ISEC)” Project: পরিচালক সভায় জানান যে, ISEC প্রকল্প ১ বছরের জন্য বর্ধিত করা হয়েছে। আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের মার্চ/২০২৬ পর্যন্ত ২৯৪৬.৪৬ টাকা ব্যয় করা হয়েছে, ব্যয়ের শতকরা হার ৭৬.১৮%। জুন/২০২৬ পর্যন্ত ১০০% বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিশ্চিত করা হবে। আগামী মে/২০২৬ থেকে যুব উন্নয়ন কল্লবাজার STP এর মাধ্যমে মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ও প্রকল্প পরিচালক, আইজেক মহোদয়ের সদয় অনুমোদনক্রমে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। ইতোমধ্যে ILO আইজেক কল্লবাজার থেকে TOR, Technical and Financial Proposal পাওয়া গেছে এবং শীঘ্রই কার্যক্রম শুরু হবে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) ILO আইজেক কক্সবাজার থেকে TOR, Technical and Financial Proposal এর কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শুরু করতে হবে।

(খ) আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় করতে হবে।

৪.৬ “ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি” প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রেখে শতভাগ অগ্রগতি অর্জনের কাজ চলমান রয়েছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রকল্প ফিজিবিলিটি স্ট্যাডির কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। পরিকল্পনা মাফিক নির্ধারিত সময়ে সমীক্ষা সম্পন্ন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন যথাসময়ে দাখিল করা হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তব অগ্রগতির তথ্য ও চিত্র সভায় উপস্থাপন করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১. প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রেখে শতভাগ অগ্রগতি অর্জন করতে হবে।

২. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত পরিকল্পনা কমিশনের আরএডিপির সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত যে সকল প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে সে সকল প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি দ্রুতসময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

৩. পরিকল্পনা মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে সমীক্ষা সম্পন্ন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন যথাসময়ে দাখিল করতে হবে।

৪. প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তব অগ্রগতির তথ্য, চিত্র সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

৪.৭. “কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-এর প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত)” প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ভৌত অবকাঠামো সংস্কারের ক্ষেত্রে পূর্বের অবকাঠামো চিত্র এবং মেরামতকালের চিত্র ও উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পরের চিত্রের প্রমাণক সংরক্ষণ করা হচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের বাস্তব অগ্রগতির তথ্য চিত্র, ভিডিওসহ গ্রাফিক্যালি উপস্থাপনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় নিশ্চিতকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) প্রকল্প বাস্তবায়নের বাস্তব অগ্রগতির তথ্য চিত্র, ভিডিওসহ গ্রাফিক্যালি পর্যালোচনা সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

(খ) আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় করতে হবে।

৪.৮ “৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)” প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, আলোচ্য প্রকল্পের প্রশিক্ষণের গুণগতমান বজায় রাখার স্বার্থে ইতোমধ্যে দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, টাংগাইল, বগুড়া, জামালপুর, শেরপুর, ময়নসিংহ, কক্সবাজার, নীফামারী, লালমনিরহাট, নওগাঁ, রাজশাহী, রংপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সিলেট, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা জেলার কম্পিউটার ল্যাবসহ অন্যান্য কারিগরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত মনিটরিং করা হয়েছে। পরবর্তীতে অবশিষ্ট জেলার কম্পিউটার ল্যাবসহ অন্যান্য কারিগরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মনিটরিং-এর নিমিত্তে পরিদর্শন করা হবে। প্রকল্প পরিচালক মহোদয় মাঠ পর্যায়ে টেলিফোনে উপপরিচালকগণের সাথে যোগাযোগ রাখছেন। প্রকল্পের আওতায় ৫টি ট্রেডের (কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এপ্লিকেশন, প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং, ইলেকট্রনিক্স এবং রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং) প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের (উপকারভোগী) লক্ষ্যমাত্রা ৭১৫৮০ জন। ইতোমধ্যে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রশিক্ষণের (উপকারভোগী) অগ্রগতি ৪৭২৩১ জন (৬৫.৯৮%)। প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের (উপকারভোগী) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১০০% অর্জন সম্ভব হবে। প্রকল্পের অনুকূলে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে আরএডিপি-তে বরাদ্দকৃত অর্থ ৩০জুন, ২০২৬ এর মধ্যে ১০০% ব্যয় করা সম্ভব হবে। গত ২৬.০২.২০২৬ খ্রি. তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের এডিপি অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ফরিদপুর ও কুমিল্লা ২টি প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন ইউনিট চালু, ৭৯টি কম্পিউটার ল্যাবে কম্পিউটার সেট, কম্পিউটার ল্যাবে ল্যাপটপ, এলইডি ডিসপ্লে এবং মাঠ পর্যায়ের চাহিদা মোতাবেক অন্যান্য কারিগরি বিষয়ক ৩ ট্রেডের প্রশিক্ষণ উপকরণ সরঞ্জামাদিসহ প্রশিক্ষকদের ToT কোর্স অব্যাহত রাখার সংস্থান রেখে গত ১২.০৩.২০২৬ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্প সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায় থেকে চাহিদা পাওয়া গেছে। চাহিদা মোতাবেক প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলায় কম্পিউটার ল্যাবের জন্য কম্পিউটার সেট, ল্যাপটপ, এলইডি ডিসপ্লে এবং অন্যান্য কারিগরি বিষয়ক ৩ ট্রেডের প্রশিক্ষণ ইউনিটে প্রশিক্ষণ উপকরণ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহসহ ফরিদপুর ও কুমিল্লা ২টি প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন ইউনিট চালু এবং প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ToT অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প সংশোধন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের (উপকারভোগী) লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন করতে হবে।

(খ) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ১২.০৩.২০২৬ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্প সংশোধনের উদ্যোগ দ্রুত বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে।

(গ) আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় করতে হবে।

৪.৯ “দেশের ৬৪ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি” শীর্ষক প্রকল্প: সভায় আলোচনাকালে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, দেশের ৬৪ জেলায় প্রথম থেকে ৪র্থ ব্যাচ পর্যন্ত ৩৪জন প্রশিক্ষক ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। চলতি ব্যাচে ০১জন প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ চলমান আছে। প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন নিশ্চিত করতে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও তদারকী বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় মৌখিক ও লিখিত নির্দেশনা দেয়া হয়ে থাকে। এছাড়া প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় হতে প্রশিক্ষণার্থীদের উপস্থিতি ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ভিডিও কলের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এআই প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অব্যবহৃত ১৩০০.০০ লক্ষ টাকা হতে ১২৩৮.১৭৬৫০ লক্ষ টাকা ‘দেশের ৬৪ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্পে উপযোজন করার বিষয় প্রক্রিয়াধীন আছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দের সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) প্রশিক্ষণার্থীদের উপস্থিতি ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

(খ) আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় করতে হবে।

৪.১০. “তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন” প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, “তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন” প্রকল্পের দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক প্রাপ্ত EoI সমূহ মূল্যায়নপূর্বক ০৪ (চার)টি প্যাকেজের আওতায় মোট ২৫ (পঁচিশ) টি প্রতিষ্ঠান/ফার্ম-কে পিপিআর-২০২৫ এর ১৩৭ বিধি অনুযায়ী ০২ মার্চ ২০২৬ খ্রি. তারিখে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্তির সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। Request For Proposal (RFP) দাখিলের শেষ সময় ছিল ০৫ এপ্রিল ২০২৬ খ্রি. তারিখ বেলা ০২.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত। উক্ত তারিখে RFP উন্মুক্তকরণ কমিটির মাধ্যমে ২২টি RFP পাওয়া যায়। ০৮ এপ্রিল ও ০৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ RFP মূল্যায়নের জন্য দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ১৩২৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত ৪.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) মূল্যায়ন কমিটির কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

(খ) আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় করতে হবে।

৪.১১ এছাড়া ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের ডিপিপি/টিএপিপি প্রণয়ন ও অনুমোদন ও অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

২০২৫-২৬ অর্থ বছরে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের ডিপিপি/টিএপিপি প্রণয়ন ও অনুমোদন ও অগ্রগতি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫.০ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিস্তারিত সঠিক প্রতিবেদন প্রতি মাসের প্রথম ২ কর্মদিবসের মধ্যে পরিকল্পনা উইংএ প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৬.০ আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

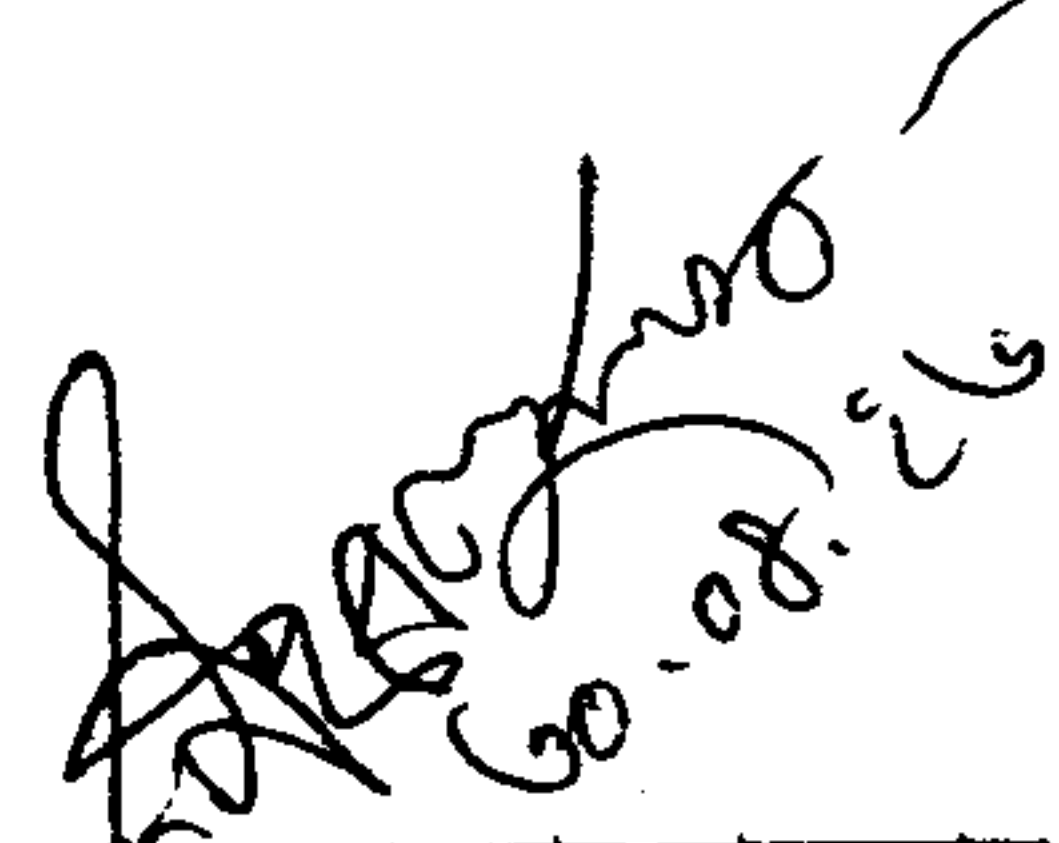
১০.০৪.২০২৬  
(ড. গাজী মোঃ সাইফুল্লাহমান)  
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)  
ফোনঃ ০২-২২৩৩৮৯৩৮৯  
dg@dyd.gov.bd

বিতরণ:

০১. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [দৃ: আ: যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়]।
০২. পরিচালক ..... (সকল), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৩. প্রকল্প পরিচালক, টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হইলস ফর আন্তারপ্রিভিলেজড বুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকার ২য় পর্ব) প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৪. প্রকল্প পরিচালক, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্ব) প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৫. প্রকল্প পরিচালক, Life Skills Education in Youth Training Center and Strengthening of National Youth Platform' প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৬. প্রকল্প পরিচালক, Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৭. প্রকল্প পরিচালক, Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar, Bangladesh (ISEC) Project, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৮. প্রকল্প পরিচালক, 'ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি' শীর্ষক প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৯. প্রকল্প পরিচালক, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০. প্রকল্প পরিচালক, '৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১. প্রকল্প পরিচালক, দেশের ৪৮টি জেলায় 'শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
১২. প্রকল্প পরিচালক, তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে এবং কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ

০১. প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
০২. মহাপরিচালক (গ্রেড-১), মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
০৩. পরিচালক (পরিকল্পনা), মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।

  
 (মোঃ হাছিনুর রহমান তালুকদার)  
 সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)  
 যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
